

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA

GAT SV. PETRA GRADSKA LUKA SPLIT

Mapa 4

IZVEDBENI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT

Investitor:	LUČKA UPRAVA SPLIT Gat sv. Duje 1, 21000 Split OIB: 06992092556
Građevina:	Rekonstrukcija i dogradnja Gata sv. Petra u Gradskoj luci Split
Lokacija:	k.č. dio 9544/2, k.o. Split
Zajednička oznaka projekta:	GSP
Oznaka mape:	12 / 23 – IZ
Redni broj mape:	4
Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT
Strukovna odrednica:	Arhitektonski projekt
Projektirani dio građevine:	ARHITEKTONSKI PROJEKT MODULARNIH OBJEKATA S PROJEKTOM TOPLINSKE ZAŠTITE I NADSTREŠNICE
Glavni projektant:	Dalibor Crnac, dipl. ing. građ. (G 4292)
Projektant arhitekture:	Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh. (A 106)
Izrada:	arhitektonskiBIROanteKUZMANIĆ d.o.o. za projektiranje, Split Trg Mihovila Pavlinovića 1 OIB: 42054061241
Odgovorna osoba:	Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.
Split, travanj 2024.	

POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA

investitor:	Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, 21000 Split
građevina:	Rekonstrukcija i dogradnja Gata sv. Petra u Gradskoj luci Split
ZOP:	GSP
razina razrade:	Glavni projekt
oznaka mape:	12 / 23 – IZ
redni broj mape:	4
strukovna odrednica:	Arhitektonski projekt
projektirani dio građevine:	Arhitektonski projekt modularnih objekata s projektom toplinske zaštite i nadstrešnice

Popis projektanata u izradi mape projekta:

Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh. (A 106)

Popis suradnika u izradi mape projekta:

Mate Jurić, dipl. ing. arh.

POPIS MAPA

investitor: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, 21000 Split
građevina: Rekonstrukcija i dogradnja Gata sv. Petra u Gradskoj luci Split
ZOP: GSP
razina razrade: Izvedbeni projekt

Popis mapa s projektantima koji su ih izradili:

- 1 Projekt konstrukcije, vodoopskrbne i protupožarne instalacije, odvodnje i prometa**
Građevinsko-geotehnički projekt
T.D. 847/08/2023
projektant: Dalibor Crnac, dipl. ing. građ. (G 4292)
"Pomgrad inženjering" d.o.o., Stinice 26B, Split
OIB: 31765830203
- 2 Projekt niskonaponskih instalacija, EKI i vanjske rasvjete**
Elektrotehnički projekt
E-1616
projektant: Ante Kraljević, dipl. ing. el. (E 1744)
"Elektro projekti i sustavi" d.o.o., Istarska 3, Split
OIB: 97995893776
- 3 Projekt TS 20(10)/0,4kV „Trajektna luka 3“**
Elektrotehnički projekt
TS-1616
projektant: Ante Kraljević, dipl. ing. el. (E 1744)
"Elektro projekti i sustavi" d.o.o., Istarska 3, Split
OIB: 97995893776
- 4 Arhitektonski projekt modularnih objekata s projektom toplinske zaštite i nadstrešnice**
Arhitektonski projekt
12/23-IZ
projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh. (A 106)
"Arhitektonski biro Ante Kuzmanić" d.o.o., Trg Mihovila Pavlinovića 1, Split
OIB: 42054061241
- 5 Projekt čelične konstrukcije nadstrešnice**
Građevinski projekt
VAK-04/23
projektant: Stjepan Medić, dipl. ing. građ. (G 2275)
"Vaniček arhitekti" d.o.o., Lipa 2, Strmec Samoborski
OIB: 06839878943

Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT

SADRŽAJ MAPE

SADRŽAJ:

A. TEHNIČKI DIO

A.01	Tehnički opis s iskazom površina.....	6
A.02	Popis slojeva konstrukcija.....	13
A.03	Troškovnik arhitektonskog dijela.....	17

B. GRAFIČKI PRIKAZI

B.1 Nacrti

B.1.01	Situacija	M 1:500	list 01
B.1.02	Tlocrt prizemlja putničkog sklopa	M 1:100	list 02
B.1.03	Tlocrt krovnih ploha putničkog sklopa	M 1:100	list 03
B.1.04	Tlocrt krovnih ploha nadstrešnice	M 1:100	list 04
B.1.05	Pročelja i presjek putničkog sklopa	M 1:100	list 05
B.1.06	Nacrti kućice za osoblje	M 1:100	list 06
B.1.07	Nacrti trafostanice	M 1:100	list 07

B.2 Detalji

B.2.01	Detalj D1	M 1:10	list D1
B.2.02	Detalj D2	M 1:10	list D2
B.2.03	Detalj D3	M 1:10	list D3
B.2.04	Detalj D4	M 1:10	list D4
B.2.05	Detalj D5	M 1:10	list D5
B.2.06	Detalj D6	M 1:10	list D6
B.2.07	Detalj D7	M 1:10	list D7
B.2.08	Detalj D8	M 1:10	list D8

B.3	Sheme bravarskih stavki	M 1:50
-----	-------------------------	--------

B.4	Sheme aluminijskih stavki	M 1:50
-----	---------------------------	--------

B.5	Sheme stolarskih stavki	M 1:50
-----	-------------------------	--------

B.6	Sheme stavki objekata	M 1:50
-----	-----------------------	--------

A.

TEHNIČKI DIO

A.01 TEHNIČKI OPIS S ISKAZOM POVRŠINA

1. UVOD
2. PROSTORNO, FUNKCIONALNO I OBLIKOVNO RJEŠENJE
3. KONSTRUKTIVNI DIJELOVI GRAĐEVINE
4. MATERIJALI I ZAVRŠNE OBRADJE
5. INSTALACIJE
6. ISKAZ POVRŠINA

1. UVOD

Ovim izvedbenim projektom prikazan je arhitektonski dio zahvata Rekonstrukcije i dogradnje Gata sv. Petra u Gradskoj luci Split na k.č. 9544/2, k.o. Split površine 59.842 m² i dijelu mora uz tu česticu. Odnosi se na nadzemne građevine na izdignutim nogostupima (prometnim „otocima“), a to su: sklop građevina za putnike s nadstrešnicom, dvije kućice za osoblje i trafostanica.

Sklop građevina za putnike je zbog najvećih prostornih zahtjeva smješten na prostor najveće površine od svih prostora koji na budućem gatu nisu zauzeti prometom vozila, bilo parkiralištem vozila za ukrcaj u brod, bilo prometnicama i manevarskim površinama. To je prostor na izdignutom nogostupu trokutnog oblika (s uglovnim radijusima) nastao između glavne uzdužne dvosmjerne prometnice na gatu s južne strane i novog parkirališta za ukrcaj veza 11 na proširenju gata duž novog veza 10 sa sjeverne strane.

Kućice za osoblje su smještene na mjestu s dobrim pregledom stanja: jedna na novom izdignutom nogostupu na mjestu postojeće kućice u samom središtu korijena gata, odnosno na početku uzdužne prometnice uz njene brklje, a druga na zapadnom kraju novog izdignutog nogostupa između uzdužne prometnice sa sjeverne strane i parkirališta za ukrcaj veza 14 s južne strane.

Trafostanica je smještena na potonjem novom izdignutom nogostupu između kućice za osoblje sa zapadne strane i zelenog pojasa s istočne strane.

Kao opis i grafički prikaz u svrhu ishođenja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja za cijeli zahvat Rekonstrukcije i dogradnje Gata sv. Petra u Gradskoj luci Split, Pomgrad inženjering d.o.o. je u ožujku 2023. izradio Elaborat za ishođenje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, T.D. 838E/03/2023, čiji je projektant građevinskog dijela Dalibor Crnac, dipl. ing. građ., projektant arhitektonskog dijela Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh. iz Arhitektonskog biroa Ante Kuzmanić d.o.o., a projektant elektrotehničkog dijela Ante Kraljević, dipl. ing. el. iz Elektro projekti i sustavi d.o.o. Do 26. svibnja 2023. javnopravna tijela su izdala posebne uvjete i uvjete priključenja.

ELABORATI U SVRHU IZRADE GLAVNOG PROJEKTA

Elaborat zaštite od požara

broj elaborata 82618-23 EZOP-1

izradilo: Denis Radić-Lima, dipl. ing. str.

"Alfa atest" d.o.o., Split

Elaborat zaštite na radu

broj elaborata 82618-23 EZNR-1

izradio: Denis Radić-Lima, dipl. ing. str.

"Alfa atest" d.o.o., Split

Geotehnički elaborat

broj elaborata PR 23-001-01/R1

izradio: Tomislav Tulić, ing. građ.

"Rijekaprojekt - geotehničko istraživanje" d.o.o., Rijeka

Geodetski elaborat

T.D. 14/2023

izradio: Ivan Barbalić, dipl. ing. geod.

"Terestrika" d.o.o., Split

Krajobrazni elaborat

TD 523-23

izradio: Damir Mijalković, dipl. ing. agr.

"Antonio - hortikultura i krajobraz" d.o.o., Split

Maritimna studija

T.D. 5-T/22

izradio: Boško Kozina, dipl. ing. građ.

"Kozina projekti" d.o.o., Split

2. PROSTORNO, FUNKCIONALNO I OBLIKOVNO RJEŠENJE

Sklop građevina za putnike sastoji se od dva dugačka kvadra zatvorenih prostora širine 2,5 m položena između glavnog pješačkog puta duž jugoistočne stranice trokutnog nogostupa i ostatka nogostupa te od nadstrešnice razvedenog oblika koja natkriva veći dio otvorenog prostora na ostatku nogostupa sa sjeverne strane, a djelomično i krovove zatvorenih kvadara.

Sklop je namijenjen prvenstveno potrebama brodskih putnika pa zatvoreni prostori sadržavaju (od zapada prema istoku) caffe-bar, bankomat i spremište za čuvanje prtljage u zapadnom kvadru, a prodajna mjesta za kupnju brodskih karata, spremište i sanitarni čvor u istočnom kvadru. Između kvadara je prolaz širine oko 6 m.

Caffe-bar se sastoji od pulta i retro-pulta, garderobe i zahoda. Ulaz osoblja je s južne strane, a šank s prolazom za konobara proteže se duž sjevernog pročelja s vanjske strane. Bankomatu korisnik prilazi s južnog pješačkog puta, a održavatelj kroz vrata na sjevernoj strani. Spremište za čuvanje prtljage istu prima, odnosno predaje s južne strane preko pulta s prolazom za čuvara i veću, odnosno težu prtljagu. Sedam prodajnih mjesta za kupnju karata i jedno mjesto za davanje informacija su u obliku šaltera s povišenim stolom i stolicom okrenutih prema sjeveru s pultom duž cijelog sjevernog pročelja šaltera s vanjske strane. Ulazi prodavača su straga s južnog pješačkog puta te se mogu dodavati radi drukčijeg grupiranja ovisno o zakupcima. U spremište smješteno između prodajnih mjesta se također ulazi s juga. Sanitarni čvor se sastoji od ženskog zahoda (dva nužnika i dva umivaonika), muškog zahoda (dva nužnika, pisoar i umivaonik), svakog sa svojim ulaznim vratima s glavnog pješačkog puta s južne strane te zahoda za osobe u kolicima s ulaznim vratima na istočnom vanjskom zabatu kvadra, do kojih se dolazi preko visoko ograđene rampe s podestom. Pred svakim ulaznim vratima je po jedna konzolna stuba, a uz južna ulazna vrata su konzolni štitnici za zaštitu pješaka od udara u zaokretna vratna krila, koja se otvaraju prema van.

Najprostraniji dio natkrivenog trokutnog nogostupa sa sjeverne strane je ispred šanka pa je na tom dijelu s pogledom na staru gradsku jezgru terasa caffe-bara s pomičnim stolovima i stolicama. Preostali dio nogostupa iskorišten je najvećim dijelom za redanje putnika koji čekaju na kupnju karata, koje se usmjerava pomičnim stupićima s rastezljivim trakama, a manjim dijelom (na području oko prolaza) i za sjedenje putnika na klupama. Ekrani s rasporedom plovidbe su smješteni na slijepa sjeverna pročelja spremišta za čuvanje prtljage i sanitarnog čvora. Upravo radi neometanog redanja putnika te smještaja i pregleda ekrana ulazi u

sanitarni čvor te pristup bankomatu i čuvanju prtljage nalaze se s južne strane. Znakovlje za snalaženje putnika po sklopu smješteno je pri vrhu ograde rampe i konzolnih štitnika te na slijepom zapadnom vanjskom zabatu, tako da ga putnici uoče već kod prilaženja sklopu, bilo iz luke, bilo iz broda.

Kućice za osoblje sadrže mjesto za djelatnika lučke uprave (privezivača i sl.) s povišenim stolom i stolicom okrenutim prema zapadu (gatu) s panoramskim pogledom kroz staklenu stijenu po cijelom opsegu s prozorima na bočnim stranama (prema prometnim površinama uz nogostup), a ulaznim vratima na stražnjoj (istočnoj) strani.

Trafostanica se sastoji od četiri podjednake prostorije s ulaznim vratima sa sjeverne strane i otvorima za provjetranje s južne strane.

U nijednom zatvorenom prostoru osim zahoda za osobe u kolicima nije predviđen boravak i rad osoba s ograničenom pokretljivošću u kolicima. Elementi pristupačnosti su rampa s podestom za ulaz u zahod za osobe u kolicima nagiba 1:12 (8,3 %) za visinsku razliku od 26 cm i tri ukošenja rubnjaka nogostupa nagiba 10% na njegovim uglovima, gdje se pješački putevi penju na nogostup.

Stereotomsko oblikovanje kvadara zatvorenih prostora sklopa građevina za putnike, odnosno kompozicija njihovih pročelja je svojevrsna reinterpretacija povijesnog stila splitske moderne kroz uporabu suvremenih materijala. Zidno platno više ili manje apstraktnog karaktera, s obzirom na čestu pojavu parapeta radi pulteva, može eventualno imati bazu istaknutu reškama raspoređenim kao u zidarskom vezu s nepodudarnim ležajnicama i sudarnicama (tzv. splitskom vezu). Friz kao trakasta ploha između vrha prozora i strehe je, osim zabata zidnog platna, ograde rampe i konzolnih štitnika, jedina ploha na kojoj se dozvoljava smještaj znakovlja. Streha i atika po cijelom obodu obaju kvadara nisu samo reinterpretirani oblikovni elementi moderne, već imaju jasno određenu funkciju. Streha širine pola metra pruža zaklon putnicima i osoblju od Sunčevih zraka i oborina dok ulaze u prostorije, obavljaju radnje na pultevima ili čekaju red. Atika u obliku neprozirne ograde od vodoravnih dužica zaklanja termotehničke uređaje ugrađene na krov kvadara od pogleda pješaka. Ograda rampe s podestom i konzolni štitnici oblikovani su istovjetno atici, ali s okomitim dužicama. Pod prostorija je na oko 26 cm višoj razini od okolnog nogostupa. Visina zatvorenih gabarita kvadara je 2,9 m, a zajedno s atikom 3,6 m. Širina im je 2,5 m. Duljina zapadnog je 14,3 m, a istočnog 20,3 m.

Tektonsko oblikovanje nadstrešnice čine tlocrtno razvedeni oblik proizašao iz matrice šesterokutnih modula promjera upisane kružnice 6 m, stupovi okruglog presjeka s djelomično trapeznim konzolama i obodnim nosačima modula od profila otvorenog presjeka te tankostijeni ravni pokrov na potkonstrukciji. Visina gornjeg ruba je 4,25 m, a prostor ispod nadstrešnice najmanje 3,75 m. Ukupna duljina nadstrešnice (u smjeru istok-zapad) je 33 m, a širina (u smjeru sjever-jug) je 18 m.

Kućice za osoblje oblikovane su uglavnom kao i sklop građevina za putnike, s tim da je puno zidno platno svedeno na visinu parapetne baze (bez isticanja reškama), a panoramsko ostakljenje protegnuto sve do pod strehu (bez friza). Pod prostorije je na oko 20 cm višoj razini od okolnog nogostupa. Gabarit je tlocrtno kvadrat stranice duljine 2 m. Visina zatvorenog gabarita je 2,7 m, a zajedno s atikom 3,3 m.

Trafostanica je jednostavan stereotomski kvadar. Zidno platno više ili manje apstraktnog karaktera završava strehom u razini krovne ploče, iste širine, debljine i svrhe kao na putničkom sklopu, a iznad strehe je atika u obliku punog nadozida koji obrubljuje izolacijske slojeve krova. Time je dobivena asketska varijanta prije opisane kompozicije pročelja u skladu s utilitarnošću infrastrukturnog sadržaja. Pod je na oko 20 cm višoj razini od nogostupa, a radi prihvata cijelog sadržaja transformatorskog ulja u slučaju curenja postoji i dodatni vodonepropusni prostor između podne ploče i vrha temeljne ploče, koji je na razini oko 80 cm nižoj od nogostupa. Visina gabarita je 3 m do vrha strehe, a 3,6 m zajedno s atikom. Širina mu je 3,3 m, a duljina 10,8 m.

3. KONSTRUKTIVNI DIJELOVI GRAĐEVINE

Osnovna konstrukcija sklopa građevina za putnike sastavljena je od sedam tvornički predgotovljenih modula (tzv. kontejnera) u obliku kvadra širine 2,5 m i visine 2,9 m, od čega ih je pet duljine 6 m, a dva duljine 2,1 m. Moduli su formirani od uglovnih čeličnih profila po svim bridovima i toplinskoizolacijskih panela koji zatvaraju oplošje. Postavljeni su na kameni nogostup ispod kojeg je monolitna armiranobetonska temeljna ploča, i to preko podložaka sa sidrima i ležajnim mortom tako da ostane zazor od najmanje 5 cm između nogostupa i modula. Sastavljanje dvaju manjih modula duljine 2,1 m dovršava se na licu mjesta radi podešavanja oko prodora stupova nadstrešnice. Strehe, atike, rampa s podestom i njena ograda te konzolni štitnici imaju metalnu potkonstrukciju. Konstrukcija kućica za osoblje je istovrsna, samo prilagođenih dimenzija.

Konstrukcija predgotovljenog modula je čelični prostorni okvir po bridovima kvadra sastavljen od međusobno upetih 8 greda i 4 stupa od specijalno oblikovanih profila izrađenih od čeličnih limova kvalitete S275 prema normi EN 10025 spojenih zavarivanjem sa 8 nauglica prema ISO 1161 radi tvorbe stabilne konstrukcije. Modul je bez otvora za viličar i njime se rukuje pomoću kрана. Dizajn, proizvodnja i kontrola proizvodnje modula izvodi se prema normi EN1090-1 i EN1090-2. Dozvoljeno opterećenje krova je 125 kg/m², poda 500 kg/m², a stijena 140 kg/m². Moduli se međusobno povezuju u jednu cjelinu vijcima te ugradnjom brtve za vodu između greda koje se povezuju vijcima. Spojeve kontejnera potrebno je izvesti kao vodonepropusne.

Šesterokutni moduli nadstrešnice formirani su od profila UPN180 po obodu. Moduli stoje na stupovima u središtu šesterokuta od okruglih cijevi promjera 32,4 cm upetim u konstrukciju gata pod nogostupom. Obod modula je sa stupom spojen preko šest konzola od stupa u središtu do vrhova šesterokuta. Konzole su u polovini svoje duljine uz obod od profila IPN180, a u polovini uz stup od profila rastuće visine od 18 do 40 cm napravljenog dijagonalnim prerezivanjem profila IPN240 po hrptu pa zavarivanjem hrpta u trapez. Čvorovi između profila su vareni, a dio spojeva između dviju polovica konzola i dviju polovica vanjskih obodnih profila je radi transporta riješen vijcima preko čeonih ploča. Ravni pokrov u minimalno potrebnom nagibu nosi potkonstrukcija od metalnih profila na gornjim pojasima obodnih profila i konzola koje formiraju nagib.

Cijela nosiva konstrukcija trafostanice je monolitna armiranobetonska s temeljnom pločom na podložnom betonu. Armirani beton je u vodonepropusnoj izvedbi barem do razine poda prostorija.

4. MATERIJALI I ZAVRŠNE OBRADJE

Zidno platno kvadara građevina za putnike obloženo je velikoformatnim pločama od porculanske keramike visokootporne na atmosferilija, posolicu, kemijske utjecaje, ogrebotine, udarce i Sunčeve zrake, nevidljivo pričvršćenima silikonskim ljepilom na potkonstrukciju i uglovne profile osnovne konstrukcije, s izborom obrada ploha poput kamena (na bučardu, martelinu i sl.) i mogućnošću izvedbe "monolitnih" uglova, u bijeloj ili sivoj nijansi. Baza zidnog platna u visini parapeta eventualno može biti istaknuta urezivanjem reški raspoređenih kao u zidarskom vezu s nepodudarnim ležajnicama i sudarnicama (tzv. splitskom vezu). Friz je obložen opisanim velikoformatnim pločama od porculanske keramike glatke obrade plohe u istoj nijansi kao zidno platno. Streha na nevidljivoj konzolnoj metalnoj potkonstrukciji obložena je nehrđajućim limom ili opisanim velikoformatnim pločama od porculanske keramike glatke obrade plohe u svijetlosivoj nijansi. Atika, ograda rampe s podestom i konzolni štitnici su izvedeni kao ograda od visokootpornih drvenih dasaka vidljive tekture, koja evocira drvenu brodsku palubu, na potkonstrukciji s unutarnje strane od nehrđajućih čeličnih profila. Vanjska vrata od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom uklopljena su u oblogu zidnog platna s minimalnom reškom. Prozori su ostakljeni izostaklom u natur-eloksiranoj aluminijskoj bravariji s prekinutim toplinskim mostom. Podizno-zaokretni kapci prozora i pulteva su od aluminijske stolarije obložene nehrđajućim limom ili opisanim velikoformatnim pločama od porculanske keramike u boji i obradi po izboru projektanta.

Predgotovljeni moduli (tzv. kontejneri) su standardizirani proizvodi čije su stijene toplinski izolirane mineralnom vunom, odnosno vatrootpornim toplinskoizolacijskim panelima s ispunom od mineralne vune. Krov, zidovi i pod, kao i svi spojevi kontejnerskih elemenata su potpuno vodonepropusni. Profili čelične konstrukcije kontejnera su antikorozivno zaštićeni temeljnim premazom i završnim lakom boje prema odabiru projektanta. Proizvođač je dužan posjedovati sve potrebne certifikate i ateste bitne za proizvodnju modula te zadovoljiti i ostale propise o zaštiti od požara, racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama te ostale propise definirane u Zakonu o gradnji. Krov minimalnog „dvostrušnog“ nagiba 2% izvodi se kao pertlani od ravnog bojenog pocinčanog lima spojenog dvostrukim preklapom debljine 0,55 mm kvalitete DX51 Z200 prema normi EN 10147 s jednim uzdužnim spojem po osi kontejnera. Odvodnja oborinske vode riješena je tipski preko obodnog oluka do vertikale od PVC cijevi smještene u uglovnom stupu modula. Sastav krovne konstrukcije je (izvana prema unutra): ravni pocinčani obojeni lim; mineralna vuna 10 cm; parna brana od PE folije 0,15 mm; toplinskoizolacijski panel EI30 6 cm. Vanjske stijene su od toplinskoizolacijskih panela vatrootpornosti EI90 s ispunom od mineralne vune debljine 10 cm, obostrano obloženih pocinčanim obojenim limom debljine 0,5 mm. Sastav podne konstrukcije je (izvana prema unutra): profilirani čelični lim 0,60 mm prema normi EN 10147; mineralna vuna 10 cm; drvene letve / zračni sloj 3 cm; parna brana od PE folije 0,15 mm; cementna iverica 22 mm; SPC vinilna obloga 5 mm. Pregradne stijene u modulima su od panela s ispunom od mineralne vune (prvenstveno radi zvučne izolacije) debljine 5 cm, odnosno zahodske pregrade od HPL-a. Unutarnja vrata u modulima su aluminijska.

Na kućicama za osoblje panoramsko ostakljenje je „strukturno“ pričvršćeno na uglovne profile nosive konstrukcije.

Konstrukcija nadstrešnice je od pocinčanog čelika s dodatnim antikorozivnim premazom završno bijele boje. Ravni pokrov u minimalno potrebnom nagibu je od neprozirnog emajliranog sigurnosnog stakla laminiranog svjetlonepropusnom PVB folijom, sve u boji po izboru projektanta. „Strukturno“ je pričvršćen s donje strane na potkonstrukciju od natur-eloksiranih aluminijskih profila.

Zidno platno trafostanice i njena atika obrađeni su završnom žbukom kontaktnog sustava toplinski izoliranog pročelja. Streha je od vidljivog betona. Krov je toplinski izoliran kamenom vunom i hidroizoliran TPO membranom sve do njene tipske okapnice na vrhu atike. Membrana je unutar atike pokrivena predgotovljenim betonskim pločama radi bolje zaštite od sunčevih zraka i gorućih čestica. Betonom za pad je dobiven minimalno potrebni nagib s dijagonalnom uvalom prema vodolovnom grlu. Vrata i rebrenice otvora za provjetranje su tipska metalna u boji po izboru projektanta. Unutarnje plohe su natur-beton u glatkoj oplati, a podna ploha je zaglađeni natur-beton.

Hodna ploha nogostupa je od kamenih ploča u bijelim i svijetlosivim nijansama, protuklizno obrađenih (na bučardu, martelinu i sl.), postavljenih na cementnom mortu. Klupe imaju bazu predgotovljenu od zaglađenog sitnozrnog armiranog betona klase 45/50 s dodatkom kvarca i mikrovlakana (tzv. tehnbeton) u bijeloj boji, sjedište i naslon od visokootpornih drvenih letvi i platica vidljive teksture, a potkonstrukciju sjedišta i naslona s unutarnje strane od nehrđajućih čeličnih profila. Baza klupe je u sredini napunjena zemljom, čime ujedno služi i kao „jerula“ za manje grmlje ili penjačicu.

5. INSTALACIJE

Vodovodna instalacija caffe-bara i sanitarnog čvora priključena je preko vodomjernog okna na novu vodovodnu trasu gata te je razvedena kroz građevinu.

Odvodnja otpadnih voda iz caffe-bara i sanitarnog čvora u vodonepropusnoj izvedbi spušta otpadne vode okomito do nove otpadne kanalizacije gata. Otpadne vode se prethodno dovode najmanje na razinu kvalitete komunalnih otpadnih voda. Za slučaj da se u caffe-baru priprema hrana, isti je opremljen odvajanjem masnoća.

Oborinska odvodnja s građevina za putnike i kućica za osoblje je riješena tako da se voda slijeva niz minimalne nagibe „dvostrešnog“ ravnog krova i strehe prema obodnom oluku, a iz njega kroz vertikale u uglovnim profilima. Oborinska odvodnja s nadstrešnice je niz pokrov u vertikalne oluke unutar stupova. Oborinska odvodnja s trafostanice je prema prodoru kroz atiku ispred koje je vodolovno grlo prema vertikalnom oluku skrivenom u slojevima pročelja. Sva oborinska odvodnja je u vodonepropusnoj izvedbi te se uvodi u novu oborinsku kanalizaciju gata.

Električne instalacije jake struje su priključene na gradsku mrežu preko obračunskih mjernih mjesta u mjernim ormarima nove elektroenergetske instalacije gata. Sve građevine su uzemljene gromobranom. Osim unutarnje rasvjete prostorija prema standardima za svaku namjenu predviđena je dodatna vanjska rasvjeta nogostupa oko sklopa građevina za putnike od LED trake sa zaštitom IP67 ugrađene u podgled strehe i pulteva uz spoj sa zidom (usmjerene prema tlu) te unutar obodnog profila svih modula nadstrešnice (usmjerene prema podgledu nadstrešnice), kao i od malih LED reflektora iste zaštite između čvorova stupova i konzola svih modula (usmjerenih prema podgledu nadstrešnice). Caffe-bar je opremljen razglasom za pozadinsku glazbu s propisnim ograničenjem glasnoće i zaštitom IP67. Telekomunikacijski vodovi se priključuju na elektrokomunikacijsku mrežnu infrastrukturu preko nove DTK gata. Caffe-bar je opremljen bežičnom internetskom vezom, kako za potrebe blagajne, tako i za putnike u krugu od oko 20 m. Postrojenje trafostanice je predmet zasebne mape elektrotehničkog projekta.

Hlađenje i grijanje riješeni su multi-split sustavima klima-uređaja s unutarnjim jedinicama na unutarnjim stijenkama prostorija, a vanjskim jedinicama na krovovima građevina. Unutarnje jedinice su zidne snage po 2 kW, a u kućicama osoblja parapetne snage po 2,5 kW. Vanjske jedinice modula caffe-bara i spremišta za čuvanje prtljage su spojene na po jednu unutarnju pa su snage po 2 kW. Vanjske jedinice dvaju modula prodaje karata su spojene na po dvije unutarnje pa su snage po 4 kW. Vanjska jedinica modula zahoda je spojena na tri unutarnje pa je snage 6 kW. Vanjske jedinice kućica osoblja su spojene na po jednu unutarnju pa su snage po 2,5 kW. Priprema potrošne tople vode je u niskotlačnim spremnicima odvojeno za caffe-bar i umivaonike sanitarnog čvora. Provjetravanje je prirodno preko prozora, otvora za provjetravanje u vratima i otvora s rebrenicama, a u zahodima ventilatorima s izlaznom rešetkom skrivenom iznad strehe ili iza atike od pogleda prolaznika.

Projektant:

Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.

Split, travanj 2024.

6. ISKAZ POVRŠINA

GRAĐEVINSKA (BRUTO) POVRŠINA	stvarna površina [m ²]	koeficijent	obračunska površina [m ²]
putnički sklop - zapadni kvadar	35,36	1,00	35,36
putnički sklop - istočni kvadar	50,42	1,00	50,42
kućica za osoblje - zapadna	4,16	1,00	4,16
kućica za osoblje - istočna	4,16	1,00	4,16
trafostanica	34,94	1,00	34,94
UKUPNO			129,04
PROSTORNI PARAMETRI			
građevna čestica [m ²]			59.842,00
kig = 129,04 / 59.842,00			0,002
kis = 129,04 / 59.842,00			0,002

Projektant:

Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.

Split, travanj 2024.

A.02 POPIS SLOJEVA KONSTRUKCIJA

- PODNE KONSTRUKCIJE (opis slojeva od gore prema dolje)

P1 Pod iznad tla - predgotovljeni moduli / vinil		
- SPC vinilna obloga		0,50 cm
- cementna iverica		2,20 cm
- parna brana - PE folija		0,02 cm
- drvene letve / zračni sloj		3,00 cm
- toplinska izolacija - mineralna vuna		10,00 cm
- obloga pocinčanim obojenim limom		0,06 cm
ukupno:		16,00 cm
$(U_{max} = 0,50 \text{ W/m}^2\text{K})$		$U = 0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$
- zračni sloj		8,00 cm
- AB ploča, zaglađena		20,00 cm
- podložni „mršavi“ beton		8,00 cm
- tamponski sloj, strojno zbijen		30,00 cm
- nasip postojećeg dijela gata s vezivom od „santorina“		
P2 Pod iznad tla - kućice osoblja / vinil		
- SPC vinilna obloga		0,50 cm
- cementna iverica		2,20 cm
- parna brana - PE folija		0,02 cm
- drvene letve / zračni sloj		3,00 cm
- toplinska izolacija - mineralna vuna		9,00 cm
- obloga pocinčanim obojenim limom		0,06 cm
ukupno:		15,00 cm
$(U_{max} = 0,50 \text{ W/m}^2\text{K})$		$U = 0,44 \text{ W/m}^2\text{K}$
- zračni sloj		5,00 cm
- AB ploča, zaglađena		20,00 cm
- podložni „mršavi“ beton		8,00 cm
- tamponski sloj, strojno zbijen		30,00 cm
- nasip postojećeg dijela gata s vezivom od „santorina“		
P3 Pod iznad tla - trafostanica / beton		
- AB temeljna ploča, zaglađena		30,00 cm
- hidroizolacija armirana temeljna membrana od termoplastičnog poliolefina (TPO)		0,16 cm
- polipropilenski geotekstil 500 g/m ²		0,30 cm
ukupno:		30,50 cm
- podložni „mršavi“ beton		8,00 cm
- tamponski sloj, strojno zbijen		30,00 cm
- nasip postojećeg dijela gata s vezivom od „santorina“		
Pv1 Vanjski pod - nogostup nad postojećim dijelom gata / kamen		
- kamene ploče		6,00 cm
- cementni mort		4,00 cm
- tamponski sloj, strojno zbijen		30,00 cm
- nasip postojećeg dijela gata s vezivom od „santorina“		
Pv2 Vanjski pod - nogostup nad postojećim dijelom gata / kamen		
- kamene ploče		6,00 cm
- cementni mort		4,00 cm
- AB vijenac rekonstruiranog ruba postojećeg dijela gata		-

Pv3 Vanjski pod - nogostup nad proširenjem gata / kamen

- kamene ploče	6,00 cm
- cementni mort	4,00 cm
- AB konstrukcija proširenja gata	80,00 cm-

- MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE (opis slojeva od gore prema dolje)

M1 Međukatna konstrukcija - trafostanica / beton

- AB ploča, zaglađena	20,00 cm
-----------------------	----------

- ZIDNE KONSTRUKCIJE (opis slojeva iznutra prema vani)

Z1 Vanjski zid / toplinskoizolacijski panel - predgotovljeni moduli

Toplinskoizolacijski panel vatrootpornosti EI90, d = 10 cm:

- obloga pocinčanim obojenim limom	0,05 cm
- toplinska izolacija - mineralna vuna	9,90 cm
- obloga pocinčanim obojenim limom	0,05 cm
($U_{max} = 0,45 \text{ W/m}^2\text{K}$) $U = 0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$	
- potkonstrukcija vanjske obloge / zračni sloj	4,00 cm
- vanjska obloga velikoformatnim pločama od visokootporne porculanske keramike	2,00 cm

Z2 Vanjski zid / AB zid - trafostanica

- AB zid	20 cm
<i>Certificirani povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju – „ETICS“:</i>	
- toplinska izolacija - ploče kamene vune za kontaktne fasade ljepljene na zid polimercementnim ljepilom (točkasto i po rubovima ploče, pokrivenost ploča ljepilom min. 40 %) te mehanički učvršćene tipskim spojnica (6-8 kom/m ²) (na području sokla do visine cca 30 cm iznad okolnog terena: polimercementni hidroizolacijski premaz + termoizolacijski sloj od ploča ekstrudiranog polistirena (XPS), $\lambda_{max} = 0,035 \text{ W/mK}$, zahrapavljene vanjske površine, ploče ljepljene građevinskim ljepilom i dodatno mehanički pričvršćene plastičnim tiplama s čeličnim vijkom (2 – 4 kom/m ²))	7,00 cm
- prvi sloj građ. ljepila (polimer-cementno ljepilo)	0,30 cm
- tekstilno staklena mrežica	-
- drugi sloj građ. ljepila (polimer-cementno ljepilo)	0,20 cm
- impregnacija	-
- silikatni završni sloj	0,30 cm

Z2p Vanjski zid prema tlu / AB zid - trafostanica

- AB zid	20 cm
- polimercementni hidroizolacijski premaz	0,20 cm
<i>Certificirani povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju – „ETICS“:</i>	
- toplinska izolacija - ploča ekstrudiranog polistirena (XPS), $\lambda_{max} = 0,035 \text{ W/mK}$, zahrapavljene vanjske površine, ploče ljepljene građevinskim ljepilom i dodatno mehanički pričvršćene plastičnim tiplama s čeličnim vijkom (2 – 4 kom/m ²)	7,00 cm
- hidroizolacija - armirana temeljna membrana od termoplastičnog poliolefina (TPO)	0,16 cm
- polipropilenski geotekstil 500 g/m ²	0,30 cm
- čepićasta polietilenska membrana	0,30 cm
- tamponski nasip, strojno zbijen	-

- KROVNE KONSTRUKCIJE (opis slojeva od gore prema dolje)

K1 Ravni krov - predgotovljeni moduli		
- pokrov pocinčanim obojenim limom		0,05 cm
- toplinska izolacija - mineralna vuna		10,00 cm
- parna brana - PE folija		0,02 cm
<i>Toplinskoizolacijski panel vatrootpornosti EI30, d = 6 cm:</i>		
- obloga pocinčanim obojenim limom		0,05 cm
- toplinska izolacija - mineralna vuna		5,90 cm
- obloga pocinčanim obojenim limom		0,05 cm
<i>(U_{max} = 0,30 W/m²K)</i>		U = 0,25 W/m²K
K2 Ravni krov - nadstrešnica		
- neprozirno emajlirano sigurnosno staklo laminirano svjetlonepropusnom PVB folijom		2,00 cm
K3 Ravni krov - trafostanica		
- predgotovljene betonske ploče		5,00 cm
- čepićasta polietilenska membrana		2,00 cm
- geotekstil 300 g/m²		0,30 cm
- hidroizolacija - armirana UV stabilna krovna membrana od termoplastičnog poliolefina (TPO)		0,14 cm
- toplinska izolacija - kamena vuna u dva sloja (160 kg/m³ i 130 kg/m³)		14,00 cm
- parna brana - bitumenska traka s alufolijom na hladnom bitumenskom prednamazu		0,5 cm
- beton za pad, zaglađen		5-20 cm
- AB ploča, zaglađena		15 cm

- PROZIRNE KONSTRUKCIJE I VRATA

Pr1 Prozirne konstrukcije - vanjske ostakljene		
- AL bravarija - profili s prekidom toplinskog mosta		
- dvostruko izolirajuće staklo s jednim staklom niske emisije (Low-E obloge), međuprostor ispunjen plinom (argon), koeficijent prolaska topline za staklo najviše: U_{max} = 1,2 W/m²K		U_{max} = 1,2 W/m²K
- koeficijent prolaza topline cijelog otvora uključivo okvir najviše (U _{max} = 1,8 W/m²K):		U = 1,5 W/m²K
- stupanj propuštanja ukupne sunčeve energije:		g ± = 0,40
- zaštita od sunčeva zračenja: streha		
- zvučna izolacija - II klasa, <i>R_{w min}</i> = 32 dB		
<i>(Napomena: ugradnja vrata i prozora prema RAL smjernicama u svrhu postizanja niske zrakopropusnosti!)</i>		
Za vrata i prozore na oplošju grijanog prostora:		
- zrakonepropusnost (HRN EN 12207-2017)	klasa	4
- vodonepropusnost (HRN EN 12208-2001)	klasa	E 750
Vr1 Ulazna vrata - vanjska puna		
- puno krilo, metalna konstrukcija - profili s prekidom toplinskog mosta		
- ispuna krila toplinskom izolacijom, svi spojevi krila i dovratnika ili praga brtvljeni, dovratnik i prag s prekidom toplinskog mosta u okviru		
- vanjska obloga velikoformatnim pločama od visokootporne porculanske keramike		
- koeficijent prolaza topline cijelog otvora uključivo okvir najviše (U _{max} = 2,4 W/m²K):		U = 2,0 W/m²K
- zvučna izolacija - I klasa, <i>R_{w min}</i> = 32 dB		

(Napomena: ugradnja vrata i prozora prema RAL smjernicama u svrhu postizanja niske zrakopropusnosti!)

Za vrata i prozore na oplošju grijanog prostora:

- | | | |
|---|-------|-------|
| - zrakonepropusnost (HRN EN 12207-2017) | klasa | 4 |
| - vodonepropusnost (HRN EN 12208-2001) | klasa | E 750 |

Vr2 Ulazna vrata - vanjska puna s provjetravanjem

- | | |
|---|---|
| - puno krilo, metalna konstrukcija - profili s prekidom toplinskog mosta | |
| - ispuna krila toplinskom izolacijom, svi spojevi krila i dovratnika ili praga brtvljeni, dovratnik i prag s prekidom toplinskog mosta u okviru | |
| - vanjska obloga velikoformatnim pločama od visokootporne porculanske keramike | |
| - koeficijent prolaza topline cijelog otvora uključivo okvir najviše ($U_{max} = 2,4 \text{ W/m}^2\text{K}$): | $U = 2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| - zvučna izolacija - I klasa, $R_{w \min} = 32 \text{ dB}$ | |

(Napomena: ugradnja vrata i prozora prema RAL smjernicama bez stvarne zrakonepropusnosti uslijed otvora za provjetravanje!)

Vr3 Vrata i otvori trafostanice - vanjska

- puno krilo / fiksne žaluzine, čelična bravarija

Sve zgrade, koje su predmet ovog izvedbenog projekta, samostojeće su zgrade s ploštinom korisne površine grijanog (odnosno hlađenog) dijela A_k manjom od 50 m^2 u smislu odredbi Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20). Iz Popisa slojeva konstrukcija vidljivo je da koeficijenti prolaska topline $U [\text{W}/(\text{m}^2\text{K})]$ građevnih dijelova koji čine ovojnice grijanih, odnosno hlađenih dijelova predmetnih zgrada nisu veći od vrijednosti utvrđenih u Tablici 1. iz Priloga B navedenog propisa, čime je ispunjena odredba članka 44. istog propisa te nije potreban poseban projekt u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu zgrade.

Projektant:

Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.

Split, travanj 2024.

A.03 TROŠKOVNIK ARHITEKTONSKOG DIJELA

Gradevina:		oznaka projekta:
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GATA SV.PETRA U GRADSKOJ LUCI SPLIT	arhitektonski BIRO ante KUZMANIĆ Split, Trg Mihovila Pavlinovića 1	TD: 12/23-IZ ZOP: GSP

**TROŠKOVNIK
ARHITEKTONSKOG DIJELA
REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE
GATA SV. PETRA U GRADSKOJ LUCI SPLIT
(putnički sklop, kućice osoblja i trafostanica)**

Lokacija: k.č. dio 9544/2, k.o. Split
Investitori: LUČKA UPRAVA SPLIT
Gat sv. Duje 1, 21000 Split
OIB: 06992092556

Split, travanj 2024.

Građevina:		arhitektonskiBIROanteKUZMANIĆ		oznaka projekta:	
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GATA SV.PETRA U GRADSKOJ LUCI SPLIT				TD: 12/23-IZ	
		Split, Trg Mihovila Pavlinovića 1		ZOP: GSP	
1. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI					
R.b.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos

1. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

1. Dobava i ugrađivanje nearmiranog betona klase C16/20, presjeka 0,05-0,10 m³/m²-m na tlu (podbeton) trafostanice.
Ispod podnih ploča i temeljnih traka ugrađuje se podbeton minimalne debljine 7,00 cm.
Obračun po m³ ugrađenog betona.

m³	5,10
----	------
2. Dobava i ugrađivanje nearmiranog betona klase C16/20, presjeka 0,05-0,10 m³/m²-m na tlu (podbeton) temeljnih ploča predgotovljenih modula.
Ispod podnih ploča ugrađuje se podbeton minimalne debljine 7,00 cm.
Obračun po m³ ugrađenog betona.

m³	11,40
----	-------
3. Dobava, ugradba i njega betona klase C 35/45, razreda izloženosti XS3, vodonepropusnost VDP2, u armiranobetonske temeljne ploče debljine 30,00 cm trafostanice.
Temeljne ploče moraju biti očišćene od svih ostataka betona, oplata i veznih sredstava oplata, bez neravnina, pripremljeni za daljnju obradu. U jediničnu cijenu uključena glatka oplata, i popunjavanje rupa "pašajica" cementnim mortom spravljenim s pijeskom i aditivom.
Obračun po m³ ugrađenog betona.

- Beton C35/45.	m³	11,60
- Rubna oplata.	m²	8,70
4. Dobava, ugradba i njega vodonepropusnog betona klase C 35/45, razreda izloženosti XS3, vodonepropusnost VDP2, u armiranobetonske zidove objekta trafostanice.
Beton je sitnozrni maksimalnog zrna 16 mm. U beton dodati mineralni dodatak za poboljšanje trajnosti betona u količini od minimalno 8% na masu cementa.
Površina zida mora biti očišćena od svih ostataka betona, oplata, veznih sredstava oplata, bez neravnina, pripremljeni za daljnju obradu. Na svakom eventualnom prekidu betoniranja, prije nastavka ugraditi water-stop traku.
Obračun po m³ ugrađenog betona.

- Beton C35/45.	m³	22,15
- Oplata zidova.	m²	222,60

Građevina:		oznaka projekta:	
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GATA SV.PETRA U GRADSKOJ LUCI		arhitektonski BIRO ante KUZMANIĆ	TD: 12/23-IZ
SPLIT		Split, Trg Mihovila Pavlinovića 1	ZOP: GSP

1.	BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI				
R.b.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos

5. Dobava, ugradba i njega betona klase C 35/45, razreda izloženosti XS3, vodonepropusnost VDP2, u armiranobetonske grede trafostanice.

Beton je sitnozrni maksimalnog zrna 16 mm. U beton dodati mineralni dodatak za poboljšanje trajnosti betona u količini od minimalno 8% na masu cementa.

Grede moraju biti očišćene od svih ostataka betona, oplata i veznih sredstava oplata, bez neravnina, pripremljeni za daljnju obradu. U jediničnu cijenu uključena glatka oplata, i popunjavanje rupa "pašajica" cementnim mortom spravljenim s pijeskom i aditivom.

Obračun po m³ ugrađenog betona.

- | | | |
|--------------------------------|----------------|------|
| - Beton C35/45. | m ³ | 0,40 |
| - Oplata greda s podupiranjem. | m ² | 5,00 |

6. Dobava, ugradba i njega betona klase C 35/45, razreda izloženosti XS3, vodonepropusnost VDP2, u armiranobetonsku konzolnu ploču strehe debljine 15,00 cm trafostanice.

Beton je sitnozrni maksimalnog zrna 16 mm. U beton dodati mineralni dodatak za poboljšanje trajnosti betona u količini od minimalno 8% na masu cementa.

U jediničnu cijenu uključena glatka oplata za vidljivi beton. Ploča mora biti očišćena od svih ostataka betona, bez neravnina, gornja površina horizontalna, obrađena "pod fratur", točnosti do +/- 2 mm.

Obračun po m³ ugrađenog betona.

- | | | |
|--|----------------|-------|
| - Beton C35/45. | m ³ | 2,58 |
| - Drvena oplata ploče glatka za vidljivi beton s podupiranjem. | m ² | 26,00 |

7. Dobava, ugradba i njega betona klase C 35/45, razreda izloženosti XS3, vodonepropusnost VDP2, u armiranobetonske ploče debljine 15,00 cm trafostanice.

Beton je sitnozrni maksimalnog zrna 16 mm. U beton dodati mineralni dodatak za poboljšanje trajnosti betona u količini od minimalno 8% na masu cementa.

U jediničnu cijenu uključena glatka oplata za vidljivi beton. Beton vuta mora biti očišćena od svih ostataka betona, bez neravnina.

Obračun po m³ ugrađenog betona.

- | | | |
|---------------------------------|----------------|-------|
| - Beton C35/45. | m ³ | 4,13 |
| - Drvena oplata s podupiranjem. | m ² | 37,00 |

Građevina:		oznaka projekta:	
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GATA SV.PETRA U GRADSKOJ LUCI		arhitektonski BIRO ante KUZMANIĆ	TD: 12/23-IZ
SPLIT		Split, Trg Mihovila Pavlinovića 1	ZOP: GSP

1. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI					
R.b.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos
8.	Dobava, ugradba i njega betona klase C 35/45, razreda izloženosti XS3, vodonepropusnost VDP2, u armiranobetonsku ploču debljine 20,00 cm trafostanice. Beton je sitnozrni maksimalnog zrna 16 mm. U beton dodati mineralni dodatak za poboljšanje trajnosti betona u količini od minimalno 8% na masu cementa. U jediničnu cijenu uključena glatka oplata za vidljivi beton. Ploča mora biti očišćena od svih ostataka betona, bez neravnina, gornja površina horizontalna, obrađena "pod fratur", točnosti do +/- 2 mm. Obračun po m³ ugrađenog betona.				
-	Beton C35/45.	m³	3,56		
-	Drvena oplata ploče s podupiranjem.	m²	39,00		
9.	Dobava, ugradba i njega betona klase C 35/45, razreda izloženosti XS3, vodonepropusnost VDP2, u armiranobetonske zidove atike objekta. Beton je sitnozrni maksimalnog zrna 16 mm. U beton dodati mineralni dodatak za poboljšanje trajnosti betona u količini od minimalno 8% na masu cementa. Površina zida mora biti očišćena od svih ostataka betona, oplata, veznih sredstava oplata, bez neravnina, pripremljeni za daljnju obradu. Na svakom eventualnom prekidu betoniranja, prije nastavka ugraditi water-stop traku. Obračun po m³ ugrađenog betona.				
-	Beton C35/45.	m³	2,90		
-	Oplata zidova.	m²	27,00		
10.	Dobava, oblikovanje prema armaturnom planu i ugradba betonskog čelika srednje složenosti. Obračun po kilogramu ugrađenog čelika.				
-	RA B500B savijanje i montaža.	kg	4.132,21		
-	MA B500B savijanje i montaža.	kg	2.519,38		
1.	BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI:	UKUPNO:			

Gradjevina:	arhitektonskiBIROanteKUZMANIĆ Split, Trg Mihovila Pavlinovića 1	oznaka projekta:
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GATA SV.PETRA U GRADSKOJ LUCI SPLIT		TD: 12/23-IZ
		ZOP: GSP

2.	ZIDARSKI RADOVI				
R.b.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos

2. ZIDARSKI RADOVI

1. Dobava, ugradba i njega lijevanog betona klase C 35/45 i izrada ležajeva kontejnera.

Lijevani beton je razreda tlačne čvrstoće C35/45 te razreda izloženosti XS3, vodonepropusnost VDP2. Beton je sitnozrni maksimalnog zrna 16 mm. U beton dodati mineralni dodatak za poboljšanje trajnosti betona u količini od minimalno 8% na masu cementa i potrebne aditive radi postizanja konzistencije koja omogućava lijevanje i samoniveliranje maksimalno do 1,00 mm/m.

U jediničnu cijenu uključena glatka oplata za vidljivi beton. Gornja strana ležaja mora ravna, zaglađena, točnosti do +/- 0,50 mm.

- | | | |
|---|-----|-------|
| - Obračun po komadu izvedenog jednostrukog ležaja 20/20/5 cm. | kom | 26,00 |
| - Obračun po komadu izvedenog dvostrukog ležaja 20/40/5 cm. | kom | 10,00 |

2. Nabava i ugradnja sidara za sidrenje kontejnera u temeljnu ploču od pocinčanog čelika s navojem M 16.

Sidra su izvedena od vruće cinčanog čelika. Ugrađuju se u izbušene rupe ø 22 mm dubine 40,00 cm i zaljevanjem cementnim injeksionim malterom sa dodatkom sredstva za bubrenje. Stavkom je obuhvaćeno bušenje rupa, nabava i ugradnja sidara s navojem, dužine 50,00 cm i spojni vijčani materijal za pričvršćenje kontejnera.

Stavkom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal.

Obračun po komadu izvedenog sidrenja..	kom	36,00
--	-----	-------

3. Izvedba betona za pad debljine 5,00 do 20,00 cm na krovu trafostanice.

Stavka uključuje:

- izradu betona za pad,
- njegu betona za pad,
- uklanjanje svih nečistoća nastalih predmetnim radovima, sve spremno za postavu završne obloge ravnog krova.

Obračun po m² izvedenog betona za pad debljine 5,00-20,00 cm..

m ²	27,55
----------------	-------

4. Dobava i postavljanje betonskih ploča 60/30/3,8 cm na krovu trafostanice

Betonske ploče se slažu kao zaštita TPO membrane na pripremljenu podlogu.

Obračun po m ² postavljenih ploča.	m ²	27,55
---	----------------	-------

2.	ZIDARSKI RADOVI:	UKUPNO:			
----	-------------------------	----------------	--	--	--

Građevina:		arhitektonskiBIROanteKUZMANIĆ		oznaka projekta:	
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GATA SV.PETRA U GRADSKOJ LUCI SPLIT				TD: 12/23-IZ	
		Split, Trg Mihovila Pavlinovića 1		ZOP: GSP	
3. HIDRO I TERMO IZOLACIJSKI RADOVI					
R.b.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos

3. HIDRO I TERMO IZOLACIJSKI RADOVI

- Hidroizolacija od armirane membrana od termoplastičnog poliolefina (TPO) za podzemne radove temelja trafostanice.
Termoplastična membrana za podzemne radove se ugrađuje prema preporukama proizvođača odabrane membrane.
Stavkom su obuhvaćeni svi radovi, varenje i pomoćni materijali.
Obračun po m² izolirane plohe.

m² 81,92
- Izvođenje hidroizolacije jednokomponentnim polimercementnim hidroizolacijskim premazom trafostanice.
Polimercementni hidroizolacijski premaz se nanosi u dva sloja sa utisnutom mrežicom u prvi sloj, u svemu prema preporukama proizvođača odabrane izolacije.
Obračun po m² obrađene površine.

m² 43,50
- Hidroizolacija od armirane membrana od termoplastičnog poliolefina (TPO) za krovove trafostanice.
Termoplastična membrana za krovove se ugrađuje prema preporukama proizvođača odabrane membrane.
Stavkom su obuhvaćeni svi radovi, varenje i pomoćni materijali.
Obračun po m² razvijene površine

m² 40,45
- Nabava materijala, doprema i ugradnja bitumenske trake s alu folijom kao parna brana krova trafostanice.
Trake se lijepe na očišćenu i otprašenu betonsku podlogu sa preklapima i služi kao parna brana na mjestima predviđenim projektom.
U cijenu uključen sav potreban rad, materijal, kao i doprema i raspoređivanje materijala.
Obračun po m² izolirane plohe.

m² 40,45
- Dobava i postava zaštitnog sloja čepaste membrane u slojeve krova i za zaštitu podzemne izolacije trafostanice.
Čepasta membrana se polaže uz zaštitu podzemne hidroizolacije objekta i slojeve krova.
Obračun po m².

m² 71,00
- Dobava i postava sloja netkanog tekstila u slojeve krova i za zaštitu podzemne izolacije trafostanice.
Obračun po m².

 - Netkani tekstil 300 g/m2 na krovu trafostanice. m² 27,55
 - Netkani tekstil 500 g/m2 podzemnog dijela trafostanice. m² 81,90

Građevina:		arhitektonskiBIROanteKUZMANIĆ		oznaka projekta:	
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GATA SV.PETRA U GRADSKOJ LUCI		Split, Trg Mihovila Pavlinovića 1		TD: 12/23-IZ	
SPLIT				ZOP: GSP	
3. HIDRO I TERMO IZOLACIJSKI RADOVI					
R.b.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos
7.	Nabava materijala, doprema i ugradnja termoizolacije ploča ekstrudiranog polistirena debljine 7,00 cm, podzemnog dijela trafostanice. Izoliranje podzemnog dijela trafostanice pločama ekstrudiranog polistirena debljine 7,00 cm koji služi i kao zaštita hidroizolacije. U cijenu uključen sav potreban rad, materijal, kao i doprema i raspoređivanje materijala. Obračun po m² izolirane plohe.	m²	22,40		
8.	Nabava materijala, doprema i ugradnja termoizolacije ravnog krova pločama mineralne vune u dva sloja, ukupne debljine 14,00 cm. Detaljno očistiti površinu podloge, i otprašiti je. Dobava i ugradba termoizolacije mineralne vune debljine 7,00 + 7,00 cm na mjestima predviđenim projektom. U cijenu uključen sav potreban rad, materijal, kao i doprema i raspoređivanje materijala. Obračun po m² zaštićene plohe.	m²	40,45		
3.	HIDRO I TERMO IZOLACIJSKI RADOVI:	UKUPNO:			

Građevina:		arhitektonskiBIROanteKUZMANIĆ		oznaka projekta:	
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GATA SV.PETRA U GRADSKOJ LUCI				TD: 12/23-IZ	
SPLIT				ZOP: GSP	
4.		MONTAŽERSKI RADOVI PREDGOTOVLJENIH MODULA			
R.b.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos

4. MONTAŽERSKI RADOVI PREDGOTOVLJENIH MODULA

- Nabava, doprema i montaža predgotovljenog modula caffe bara, dimenzija 2,44/6,05/2,60 m, POZ 1.1.

Predgotovljeni modul treba izvesti u svemu prema šemi projektanta i opremiti svim potrebnim instalacijama i opremom.

 - Jednokrnlina zaokretna ulazna vrata 90/215, POZ 1.1.
 - Jednokrnlina zaokretna ulazna vrata pulta 90/215, POZ 1.5.
 - Jednokrnlina zaokretna vrata zahoda 70/215, POZ 1.7.
 - Jednokrnlina klizna vrata garderobe 96/215, POZ 1.8.
 - Kapci zatvaranja pulta 416/146, POZ 3.1.
 - WC školjka s vodikotličem
 - Umivaonik
 - Garderobni ormari

Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan provjeriti na licu mjesta!

Obračun po komadu dostavljenog montiranog i priključenog modula sa svim atestima.

kom 1,00
- Nabava, doprema i montaža predgotovljenog modula spremišta prtljage, dimenzija 2,44/6,05/2,60 m, POZ 1.2.

Predgotovljeni modul treba izvesti u svemu prema šemi projektanta i opremiti svim potrebnim instalacijama i opremom.

 - Dvokrnlina klizna vrata pulta 298/56, POZ 1.6.
 - Kapci zatvaranja pulta 298/181, POZ 3.3.

Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan provjeriti na licu mjesta!

Obračun po komadu dostavljenog montiranog i priključenog modula sa svim atestima.

kom 1,00
- Nabava, doprema i montaža predgotovljenog modula prodaje karata zapadni, dimenzija 2,44/6,05/2,60 m, POZ 1.3.

Predgotovljeni modul treba izvesti u svemu prema šemi projektanta i opremiti svim potrebnim instalacijama i opremom.

 - Jednokrnlina zaokretna ulazna vrata 90/215, POZ 1.1. 2 kom.
 - Prozor prodaje karata 565/146, POZ 2.1.
 - Kapci zatvaranja pulta 565/146, POZ 3.2.
 - stol prodaje karata 135,5/60 2 kom.
 - stol prodaje karata 146/60 2 kom.
 - Garderobni ormari

Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan provjeriti na licu mjesta!

Obračun po komadu dostavljenog montiranog i priključenog modula sa svim atestima.

kom 1,00

Građevina:		oznaka projekta:
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GATA SV.PETRA U GRADSKOJ LUCI		TD: 12/23-IZ
SPLIT		ZOP: GSP
Split, Trg Mihovila Pavlinovića 1		

4.	MONTAŽERSKI RADOVI PREDGOTOVLJENIH MODULA				
R.b.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos

4. Nabava, doprema i montaža predgotovljenog modula prodaje karata istočni, dimenzija 2,44/6,05/2,60 m, POZ 1.4.
Predgotovljeni modul treba izvesti u svemu prema šemi projektanta i opremiti svim potrebnim instalacijama i opremom.
- Jednokrillna zaokretna ulazna vrata 90/215, POZ 1.1. 2 kom.
- Prozor prodaje karata 565/146, POZ 2.1.
- Kapci zatvaranja pulta 565/146, POZ 3.2.
- stol prodaje karata 135,5/60 2 kom.
- stol prodaje karata 146/60 2 kom.
- Garderobni ormari
Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacrt i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan provjeriti na licu mjesta!
Obračun po komadu dostavljenog montiranog i priključenog modula sa svim atestima.
- kom 1,00
5. Nabava, doprema i montaža predgotovljenog modula zahoda, dimenzija 2,44/6,05/2,60 m, POZ 1.5.
Predgotovljeni modul treba izvesti u svemu prema šemi projektanta i opremiti svim potrebnim instalacijama i opremom.
- Jednokrillna zaokretna ulazna vrata s otvorima za provjetravanje 90/215, POZ 1.2. 2 kom.
- Jednokrillna zaokretna ulazna vrata s otvorima za provjetravanje 9100/215, POZ 1.3. 1 kom.
- Pregrada s dvoja vrata WC-a 185/220 POZ 1.1. 2 kom
- WC školjke s vodokotlićima
- WC školjka s vodokotlićem za invalide
- Umivaonici
- Pisoari
Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacrt i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan provjeriti na licu mjesta!
Obračun po komadu dostavljenog montiranog i priključenog modula sa svim atestima.
- kom 1,00
6. Nabava, doprema i montaža predgotovljenog modula bankomata, dimenzija 2,44/2,44/2,60 m, POZ 1.6.
Predgotovljeni modul treba izvesti u svemu prema šemi projektanta i opremiti svim potrebnim instalacijama i opremom.
Modul na objekat mora doći rastavljen, pošto se otvori u stropu i podu za stupove nadstrešnice moraju izvesti na licu mjesta.
- Jednokrillna zaokretna ulazna vrata s otvorima za provjetravanje 90/215, POZ 1.2.
Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacrt i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan provjeriti na licu mjesta! Cijenom obuhvatiti i brtvljenje prodora stupova u krovu i podu s plaštem/manžetom i ostalim potrebnim elementima.
Obračun po komadu dostavljenog montiranog i priključenog modula sa svim atestima.
- kom 1,00

Građevina:		arhitektonskiBIROanteKUZMANIĆ		oznaka projekta:	
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GATA SV.PETRA U GRADSKOJ LUCI SPLIT		Split, Trg Mihovila Pavlinovića 1		TD: 12/23-IZ ZOP: GSP	
4. MONTAŽERSKI RADOVI PREDGOTOVLJENIH MODULA					
R.b.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos
7.	Nabava, doprema i montaža predgotovljenog modula spremišta, dimenzija 2,44/2,44/2,60 m, POZ 1.7. Predgotovljeni modul treba izvesti u svemu prema šemi projektanta i opremiti svim potrebnim instalacijama i opremom. Modul na objekat mora doći rastavljen, pošto se otvori u stropu i podu za stupove nadstrešnice moraju izvesti na licu mjesta. - Jednokrilna zaokretna ulazna vrata s otvorima za provjetravanje 90/215, POZ 1.2. Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan provjeriti na licu mjesta! Cijenom obuhvatiti i brtvljenje prodora stupova u krovu i podu s plaštem/manžetom i ostalim potrebnim elementima. Obračun po komadu dostavljenog montiranog i priključenog modula sa svim atestima.	kom	1,00		
8.	Nabava, doprema i montaža predgotovljenog modula za osoblje, dimenzija 2,44/2,44/2,60 m, POZ 1.8. Predgotovljeni modul treba izvesti u svemu prema šemi projektanta i opremiti svim potrebnim instalacijama i opremom. - Jednokrilna zaokretna ulazna vrata 90/215, POZ 1.4. - Prozor 68/135, POZ 2.2. 2 kom. - Stol 180/60 Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan provjeriti na licu mjesta! Obračun po komadu dostavljenog montiranog i priključenog modula sa svim atestima.	kom	2,00		
4.	MONTAŽERSKI RADOVI PREDGOTOVLJENIH MODULA:	UKUPNO:			

Gradjevina:		oznaka projekta:	
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GATA SV.PETRA U GRADSKOJ LUCI SPLIT		arhitektonski BIRO ante KUZMANIĆ	TD: 12/23-IZ
		Split, Trg Mihovila Pavlinovića 1	ZOP: GSP

5.	FASADERSKI RADOVI				
R.b.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos

5. FASADERSKI RADOVI

1. Izoliranje kontaktne fasade izolirane pločama kamene vune za fasadu debljine 7,00 cm trafostanice.

Ploče kamene vune se postavljaju ljepljenjem i dodatnim učvršćivanjem sidrima za vunu minimalno 6 komada po m². Na postavljenu vunu se nanose dva sloja polimer cementnog ljepila sa staklenom mrežicom, sloj impregnacije i silikatni završni sloj. Silikatni završni sloj se izvodi u dvije gradacije zrna po projektu.

Stavkom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal, pričvrсни i pomoćni materijal i radne skele.

Obračun po m² izvedene izolacije kontaktne fasade.

m² 101,50

2. Obrada fasade silikatnom žbukom bez izolacije strehe trafostanice.

Fasada se obrađuje slojem cementnog ljepila u dva sloja sa staklenom mrežicom, sloj impregnacije i silikatni završni sloj gradacije i boje po izboru projektanta.

Stavkom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal, pričvrсни i pomoćni materijal i radne skele.

Obračun po m² izvedene obrade fasade.

m² 40,10

3. Ugradnja pločica od porculanske keramike fasada modula na nehrđajućoj podkonstrukciji.

Fasade modula se oblažu velikoformatnim pločama od porculanske keramike visokootporne na atmosferiju, posolicu, kemijske utjecaje, ogrebotine, udarce i Sunčeve zrake, nevidljivo pričvršćenima silikonskim ljepilom na potkostrukciju i uglovne profile osnovne konstrukcije, s izborom obrada ploha poput kamena (na bučardu, martelinu i sl.) i mogućnošću izvedbe "monolitnih" uglova, u bijeloj ili sivoj nijansi. Baza zidnog platna u visini parapeta eventualno može biti istaknuta urezivanjem reški raspoređenih kao u zidarskom vezu s nepodudarnim ležajnicama i sudarnicama (tzv. splitskom vezu). Friz je obložen opisanim velikoformatnim pločama od porculanske keramike glatke obrade plohe u istoj nijansi kao zidno platno.

Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan provjeriti na licu mjesta!

Stavkom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal, pričvrсни i pomoćni materijal i radne skele.

Obračun po m² izvedene fasade.

m² 206,90

5.	FASADERSKI RADOVI:	UKUPNO:			
----	---------------------------	----------------	--	--	--

Građevina:		oznaka projekta:	
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GATA SV.PETRA U GRADSKOJ LUCI SPLIT		arhitektonski BIRO ante KUZMANIĆ	TD: 12/23-IZ
		Split, Trg Mihovila Pavlinovića 1	ZOP: GSP

6.	<i>DRVENE OBLOGE</i>				
R.b.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos

6. DRVENE OBLOGE

- Obloga atike modula drvenim platicama na potkonstrukciji.
Drvene platice su od visokootpornog drva kao akacija, pričvršćene na profile od nehrđajućeg čelika (AISI 316) u svemu prema detalju projektanta. Sav spojni materijal je od nehrđajućeg čelika (AISI 316).
Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan provjeriti na licu mjesta!
Stavkom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal, pričvrсни i pomoćni materijal i radne skele.
Obračun po m² izvedene obloge.

- POZ 4.1. ograda na krovu zapadnog bloka.	m ²	22,10
- POZ 4.2. ograda na krovu istočnog bloka.	m ²	56,70
POZ 4.3. ograda na krovu kućica za osoblje.	m ²	10,80

- Izvedba panela štitnika uz vrata modula drvenim platicama na potkonstrukciji POZ 4.4.
Drvene platice su od visokootpornog drva kao akacija, pričvršćene na profile od nehrđajućeg čelika (AISI 316) u dva sloja (sa svake strane) u svemu prema detalju projektanta. Sav spojni materijal je od nehrđajućeg čelika (AISI 316).
Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan provjeriti na licu mjesta!
Stavkom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal, pričvrсни i pomoćni materijal i radne skele.
Obračun po m² izvedenog štitnika..

m² 15,10

- Izrada i postava podnice bara od letava smreke 10/2,50 cm.
Letve su od drva prve klase blanžane. Stavkom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal, pričvrсни i pomoćni materijal .
Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan provjeriti na licu mjesta!
Obračun po m² izvedene podnice..

m² 4,92

6.	DRVENE OBLOGE:	UKUPNO:			
-----------	-----------------------	----------------	--	--	--

Građevina:	arhitektonskiBIROanteKUZMANIĆ Split, Trg Mihovila Pavlinovića 1	oznaka projekta:
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GATA SV.PETRA U GRADSKOJ LUCI		TD: 12/23-IZ
SPLIT		ZOP: GSP

7.	KAMENARSKI RADOVI				
R.b.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos

7. KAMENARSKI RADOVI

1. Dobava i oblaganje kamenom podova, debljine obloge 6,00 cm u cementnom mortu.

Podovi se oblažu pilanim prirodnim kamenom gornje površine obrađene na bučadu. Kamen je lokalni vapnenac u bijeloj ili svjetlosivoj boji. Kamene ploče su dimenzija 6/50/slobodno i ugrađuju se u cementni mort debljine 4,00 cm. Stavkom je obuhvaćeno i fugiranje produžnim mortom i impregnacija gotove obloge vodoodbojnom impregnacijom. Prije početka radova potrebno je napraviti probno polje i tražiti potvrdu projektanta prije nastavka radova.

Obračun po m² izvedenog poda. m² 1.230,00

2. Dobava i postava kamenih rubnjaka, dimenzije 18/24 cm. Kameni rubnjaci se polažu u zemljanosuhi beton. Kamen je lokalni vapnenac u bijeloj ili svjetlosivoj boji. Stavkom je obuhvaćeno i fugiranje produžnim mortom i impregnacija gotovih rubnjaka vodoodbojnom impregnacijom.

Obračun po m postavljenog rubnjaka. m² 130,50

3. Nadoplata za izvedbu ukošenja rubnjaka za osobe u kolicima. Ukošenja rubnjaka se izvode prema detalju projektanta.

Obračun po komadu izvedenog ukošenja. kom 3,00

4. Nabava kamena i izrada opločenja oko stupova nadstrešnice. Opločenje oko stupova nadstrešnice se izvode od istog kamena kao i opločenje, sve prema detalju projektanta. Opločenje oko stupova se brtvi trajnoelastičnim kitom otpornim na sol i ultraljubičaste zrake.

Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan provjeriti na licu mjesta!

Obračun po komadu izvedenog opločenja. kom 9,00

7.	KAMENARSKI RADOVI:	UKUPNO:			
----	--------------------	---------	--	--	--

Građevina:		arhitektonskiBIROanteKUZMANIĆ		oznaka projekta:	
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GATA SV.PETRA U GRADSKOJ LUCI SPLIT				TD: 12/23-IZ	
		Split, Trg Mihovila Pavlinovića 1		ZOP: GSP	
8. BRAVARSKI RADOVI					
R.b.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos

8. BRAVARSKI RADOVI

1. Izrada, doprema i montaža jednokrlnih zaokretnih vrata trafostanice, dimenzija 100/240 cm, POZ 1.1.

Izrada, isporuka i postava vanjskih metalnih pocinčanih jednokrlnih zaokretnih vrata sa ugrađenom žaluzinom (kišna rešetka) u gornjem i donjem dijelu svakog krila, s okvirom izrađenim od šupljih profila. Stavkom je obuhvaćena i stražnja pocinčanamreža za sprječavanje ulaza životinja. Suha ugradnja sa slijepim okvirom. Na spoju dovratnika i zida završni poklopni profil. Jedinичnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrt, sav spojni i pričvrtni materijal kao potreban propisani okov. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. Boja po izbor projektanta.

Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacrt i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan provjeriti na licu mjesta! Svi vanjski spojevi moraju biti vodotjesni.

Obračun po komadu kompletno ugrađenih vrata dovedenih do pune funkcionalnosti.

- Dimenzija zidarskog otvora 100/240 cm kom 2,00

2. Izrada, doprema i montaža dvokrlnih zaokretnih vrata trafostanice, dimenzija 170/240 cm, POZ 1.2.

Izrada, isporuka i postava vanjskih metalnih pocinčanih dvokrlnih zaokretnih vrata sa ugrađenim žaluzinama (kišna rešetka) u gornjem i donjem dijelu svakog krila, s okvirom izrađenim od šupljih profila. Stavkom je obuhvaćena i stražnja pocinčanamreža za sprječavanje ulaza životinja. Suha ugradnja sa slijepim okvirom. Na spoju dovratnika i zida završni poklopni profil. Jedinичnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrt, sav spojni i pričvrtni materijal kao potreban propisani okov. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. Boja po izbor projektanta.

Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacrt i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan provjeriti na licu mjesta! Svi vanjski spojevi moraju biti vodotjesni.

Obračun po komadu kompletno ugrađenih vrata dovedenih do pune funkcionalnosti.

- Dimenzija zidarskog otvora 170/240 cm kom 2,00

Građevina:		oznaka projekta:
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GATA SV.PETRA U GRADSKOJ LUCI SPLIT		TD: 12/23-IZ
arhitektonskiBIROanteKUZMANIĆ		ZOP: GSP
Split, Trg Mihovila Pavlinovića 1		

8.	BRAVARSKI RADOVI				
R.b.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos

3. Izrada, doprema i montaža fiksne rebrenice trafostanice, dimenzija 170/60 cm, POZ 2.1.

Dobava, izrada i montaža fiksne rebrenice od protukišne rešetke, Z profil. Okvir i lamele od profiliranog, pocinčanog čeličnog lima. Vertikalni razmak lamela 50 mm, osno. Cijenom obuhvatiti sav potreban pričvrtni, spojni i zaptivni materijal. Stavkom je obuhvaćena i stražnja pocinčanamreža za sprječavanje ulaza životinja. Također obuhvatiti završnu obradu cinčanjem uz sve prethodne radnje u smislu zaštite od korozije. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta.

Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan provjeriti na licu mjesta! Svi vanjski spojevi moraju biti vodotjesni.

Obračun po komadu izvedene rešetke dovedene do pune funkcionalnosti.

- Dimenzija zidarskog otvora 170/60 cm. kom 4,00

4. Izrada, doprema i montaža strehe predgotovljenih modula, POZ 3.1.

Izrada, isporuka i postava pocinčane čelične konstrukcije obložene nehrđajućim čeličnim limom (AISI 316) strehe predgotovljenih modula. U limenu oblogu uključena je ispunjena OSB pločama. Postavlja se na skrivenom pocinčanom okviru koji se pričvršćuje za konstrukciju modula. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacрта, sav spojni i pričvrtni materijal kao potreban propisani okov. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu.

Svi vanjski spojevi moraju biti vodotjesni.

Obračun po m² tlocrtne površine ugrađene strehe dovedene do pune funkcionalnosti.

m² 51,10

5. Izrada, doprema i montaža pulta predgotovljenog modula caffe bara, dimenzija 565/44, POZ 3.2.

Izrada, isporuka i postava pocinčane čelične konstrukcije obložene nehrđajućim čeličnim limom (AISI 316) pulta predgotovljenih modula. U limenu oblogu uključena je ispunjena OSB pločama. Postavlja se na skrivenom pocinčanom okviru koji se pričvršćuje za konstrukciju modula. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacрта, sav spojni i pričvrtni materijal kao potreban propisani okov. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu.

Svi vanjski spojevi moraju biti vodotjesni.

Obračun po komadu ugrađenog pulta dovedenog do pune funkcionalnosti.

- Dimenzija 565/44 cm. kom 1,00

Građevina:		oznaka projekta:
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GATA SV.PETRA U GRADSKOJ LUCI SPLIT		TD: 12/23-IZ
arhitektonskiBIROanteKUZMANIĆ Split, Trg Mihovila Pavlinovića 1		ZOP: GSP

8.	BRAVARSKI RADOVI				
R.b.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos

6. Izrada, doprema i montaža pulta predgotovljenog modula prodaje karata, dimenzija 565/44, POZ 3.3.
- Izrada, isporuka i postava pocinčane čelične konstrukcije obložene nehrđajućim čeličnim limom (AISI 316) pulta predgotovljenih modula. U limenu oblogu uključena je ispunja OSB pločama. Postavlja se na skrivenom pocinčanom okviru koji se pričvršćuje za konstrukciju modula. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrt, sav spojni i pričvrtni materijal kao potreban propisani okov. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu.
- Svi vanjski spojevi moraju biti vodotjesni.
- Obračun po komadu ugrađenog pulta dovedenog do pune funkcionalnosti.

- Dimenzija 565/44 cm. kom 2,00

7. Izrada, doprema i montaža stuba predgotovljenih modula, POZ 4.5.
- Izrada, isporuka i postava pocinčane čelične rešetke s kvadratičnim okom 30/30 mm. Postavlja se na pocinčanom okviru sa nožicama koji se veže za konstrukciju modula. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrt, sav spojni i pričvrtni materijal kao potreban propisani okov. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu.

Svi vanjski spojevi moraju biti vodotjesni.

Obračun po komadu kompletno ugrađenih stuba dovedenih do pune funkcionalnosti.

- Dimenzija stuba 80/33 cm kom 9,00

8. Izrada, doprema i montaža čelične rampe prilaza osoba u kolicima s ogradom i rukohvatom, POZ 4.6.
- Izrada, isporuka i postava čelične rampe za osobe u kolicima s drvenom ogradom. Nosiva konstrukcija rampe je izvedena od čeličnih profila i pričvršćena je za tlo. Vozna površina rampe je izvedena od rebrastog lima. Kompletna konstrukcija je vruće cinčana. Rukohvat je izveden od cijevi od nehrđajućeg čelika (AISI 316) pasiviziranog i poliranog. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrt, sav spojni i pričvrtni materijal kao potreban propisani okov. Sve izvesti u skladu sa šemama iz izvedbenog projekta, te dogovorima i odobrenjima glavnog projektanta. Mjere obavezno provjeriti na objektu. Boja po izboru projektanta.
- Svi vanjski spojevi moraju biti vodotjesni.
- Obračun po kilogramu kompletno ugrađene rampe i metru ograde, dovedenih do pune funkcionalnosti.

- Rampa kg 268,00
- Ograda m 11,80

Gradevina:		oznaka projekta:
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GATA SV.PETRA U GRADSKOJ LUCI	arhitektonski BIRO ante KUZMANIĆ	TD: 12/23-IZ
SPLIT	Split, Trg Mihovila Pavlinovića 1	ZOP: GSP

8.	<i>BRAVARSKI RADOVI</i>				
R.b.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos
9.	Izrada, doprema i montaža čeličnih postolja trafoa. Izrada, isporuka i postava čeličnih postolja trafoa. Mjere obavezno provjeriti na objektu. Postolja se ugrađuju u betonsku ploču. Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan provjeriti na licu mjesta! Obračun po kilogramu kompletno ugrađenog postolja, dovedenih do pune funkcionalnosti.	kg	290,00		
8.	BRAVARSKI RADOVI:		UKUPNO:		

Građevina:		arhitektonskiBIROanteKUZMANIĆ		oznaka projekta:	
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GATA SV.PETRA U GRADSKOJ LUCI SPLIT				TD: 12/23-IZ	
		Split, Trg Mihovila Pavlinovića 1		ZOP: GSP	
9. ČELIČNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICE					
R.b.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos

9. ČELIČNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICE

- Izrada, doprema i ugradnja sidara M20 s vijcima i pločicama.
Sidra se ugrađuju u temeljne ploče prema projektu.
Obračun po komadu ugrađenog sidra.

- Sidra M20 s pločicama dužine 40,00 cm kom 132,00

- Nabava materijala i zaljevanje ležaja specijalnim mortom za zaljevanje.
Obračun po m³ utrošenog morta.

m³ 0,25

- Nabava materijala, izrada, dovoz i montaža čelične konstrukcije nadstrešnice.
Nosiva konstrukcija čelika je izvedena od čelika kvalitete S355JR i spojnim vijcima kvalitete 8,8 u svemu prema posebnom projektu. Stavkom je obuhvaćena i antikorozivna zaštita i bojanje i revizijski otvori s poklopcem na stupovima za oborinsku odvodnju. Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan provjeriti na licu mjesta!
Obračun po kilogramu izvedene konstrukcije.

kg 18.500,00

- Nabava materijala, izrada, dovoz i montaža pokrova nadstrešnice od lamiliranog polukaljenog stakla.
Pokrov se izvodi od polukaljenog lamiliranog stakla debljine 6,00 mm prema TPZSK. Cijenom obuhvatiti i svu potkonstrukciju s brtvljenjem i dilatacijskim opšavima prema detaljima. Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan provjeriti na licu mjesta!
Obračun po m² izvedenog ostakljenja.

m² 345,32

- Nabava materijala, izrada, dovoz i montaža odvodnje oborinske vode.
Oborinska odvodnja se izvodi unutar svakog stupa. Cijev vertikalnog oluka, vodolovno grlo (sa zaštitom od začepljenja otvora), brtveni prsteni i trajnoelastični kit otporan na UV i kemijske utjecaje na spojevima prema detaljima. Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan provjeriti na licu mjesta!
Obračun po komadu izvedene odvodnje.

kom 11,00

9.	ČELIČNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICE:	UKUPNO:
----	------------------------------------	---------

Građevina:		arhitektonskiBIROanteKUZMANIĆ		oznaka projekta:	
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GATA SV.PETRA U GRADSKOJ LUCI SPLIT				TD: 12/23-IZ	
		Split, Trg Mihovila Pavlinovića 1		ZOP: GSP	
10. URBANA OPREMA					
R.b.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos

10. URBANA OPREMA

1. Izvedba betonske klupe od vodonepropusnog bijelog betona klase C 45/50, POZ 2.1.

Bijeli beton poboljšane ugradivosti (konzistencija slijeganjem 210 ± 20 mm) s bijelim cementom i bijelim agregatom. Beton je razreda tlačne čvrstoće C 45/50 te razreda izloženosti XS3, vodonepropusnost VDP2. Beton je sitnozrni maksimalnog zrna 16 mm. U beton s dodatkom kvarca i mikrovlakana (tzv. tehnobeton).

Površina klupe mora biti očišćena od svih ostataka betona, oplata, veznih sredstava oplata, bez neravnina, brušeno. Na betonsku klupe se montira sjedište i naslon od akacije na potkonstrukciji od nehrđajućeg čelika (AISI 316). Sav spojni materijal je nehrđajući (AISI 316).

Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan provjeriti na licu mjesta!

Obračun po komadu izvedene i postavljene klupe ukupne količine betona 0,60 m³.

kom 2,00

2. Izvedba betonske jerule od vodonepropusnog bijelog betona klase C 45/50, POZ 2.2.

Bijeli beton poboljšane ugradivosti (konzistencija slijeganjem 210 ± 20 mm) s bijelim cementom i bijelim agregatom. Beton je razreda tlačne čvrstoće C 45/50 te razreda izloženosti XS3, vodonepropusnost VDP2. Beton je sitnozrni maksimalnog zrna 16 mm. U beton s dodatkom kvarca i mikrovlakana (tzv. tehnobeton).

Površina jerule mora biti očišćena od svih ostataka betona, oplata, veznih sredstava oplata, bez neravnina, brušeno.

Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan provjeriti na licu mjesta!

Obračun po komadu izvedene i postavljene jerule ukupne količine betona 1,65 m³.

kom 1,00

3. Nabava, doprema i montaža ekrana reda plovidbe, dimenzija 420/164 cm, POZ 5.1.

Stavkom je obuhvaćena nabava, doprema i montaža ekrana zajedno s kućištem prema shemi, pratećom podrškom i puštanjem u pogon. Ekran mora biti otporan na atmosferilije, UV zračenje i posolicu.

Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan provjeriti na licu mjesta!

Obračun po komadu postavljenog ekrana.

kom 2,00

Građevina:		oznaka projekta:
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GATA SV.PETRA U GRADSKOJ LUCI	arhitektonski BIRO ante KUZMANIĆ	TD: 12/23-IZ
SPLIT	Split, Trg Mihovila Pavlinovića 1	ZOP: GSP

10. **URBANA OPREMA**

R.b.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos
4.	Nabava, doprema i montaža ploča sa znakovljem od akrilnog stakla debljine 12 mm. Stavkom je obuhvaćena nabava, izrada, doprema i montaža ploča sa znakovljem od akrilnog stakla. Sav spojni materijal je iz nehrđajućeg čelika (AISI 316). Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan provjeriti na licu mjesta! Obračun po komadu postavljene ploče.				
	- Ploče površine 0,60 m².	kom	2,00		
	- Ploče površine 0,80 m².	kom	2,00		
	- Ploče površine 1,80 m².	kom	1,00		
5.	Nabava, doprema i postavljanje kanti za razvrstane otpatke. Stavkom je obuhvaćena nabava, doprema i postavljanje kanti za otpatke od nehrđajućeg čelika (AISI 316). Obračun po komadu postavljene kante.	kom	12,00		
6.	Nabava, doprema i postavljanje kanti za razvrstane otpatke od plastike s oblogom od drvenih platice i uloškom radi jednostavnijeg čišćenja. Stavkom je obuhvaćena nabava, doprema i postavljanje kanti za otpatke od plastike s uloškom. Obračun po komadu postavljene kante.	kom	8,00		
7.	Nabava, doprema i postavljanje traka na stupićima za usmjeravanje putnika. Stavkom je obuhvaćena nabava, doprema i postavljanje pomičnih barijera otpornih na atmosferilije, UV zračenje i posolicu. Obračun po komadu postavljene barijere.	kom	15,00		
10.	URBANA OPREMA:		UKUPNO:		

Gradovina:	arhitektonskiBIROanteKUZMANIĆ Split, Trg Mihovila Pavlinovića 1	oznaka projekta:
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GATA SV.PETRA U GRADSKOJ LUCI SPLIT		TD: 12/23-IZ ZOP: GSP

REKAPITULACIJA:

R.b.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos
------	-------------	------------	----------	-------------	-------

REKAPITULACIJA:

GRAĐEVINSKI RADOVI

1. **BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI:**
2. **ZIDARSKI RADOVI:**

GRAĐEVINSKI RADOVI:	UKUPNO:
----------------------------	----------------

ZANATSKI RADOVI

3. **HIDRO I TERMO IZOLACIJSKI RADOVI:**
4. **MONTAŽERSKI RADOVI PREDGOTOVLJENIH MODULA:**
5. **FASADERSKI RADOVI:**
6. **DRVENE OBLOGE:**
7. **KAMENARSKI RADOVI:**
8. **BRAVARSKI RADOVI:**
9. **ČELIČNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICE:**
10. **URBANA OPREMA:**

ZANATSKI RADOVI:	UKUPNO:
GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI:	UKUPNO:

IZNOS PDV-a:
GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI S PDV-om:


Projektant:

Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.


B.

GRAFIČKI PRIKAZI


B.1 NACRTI

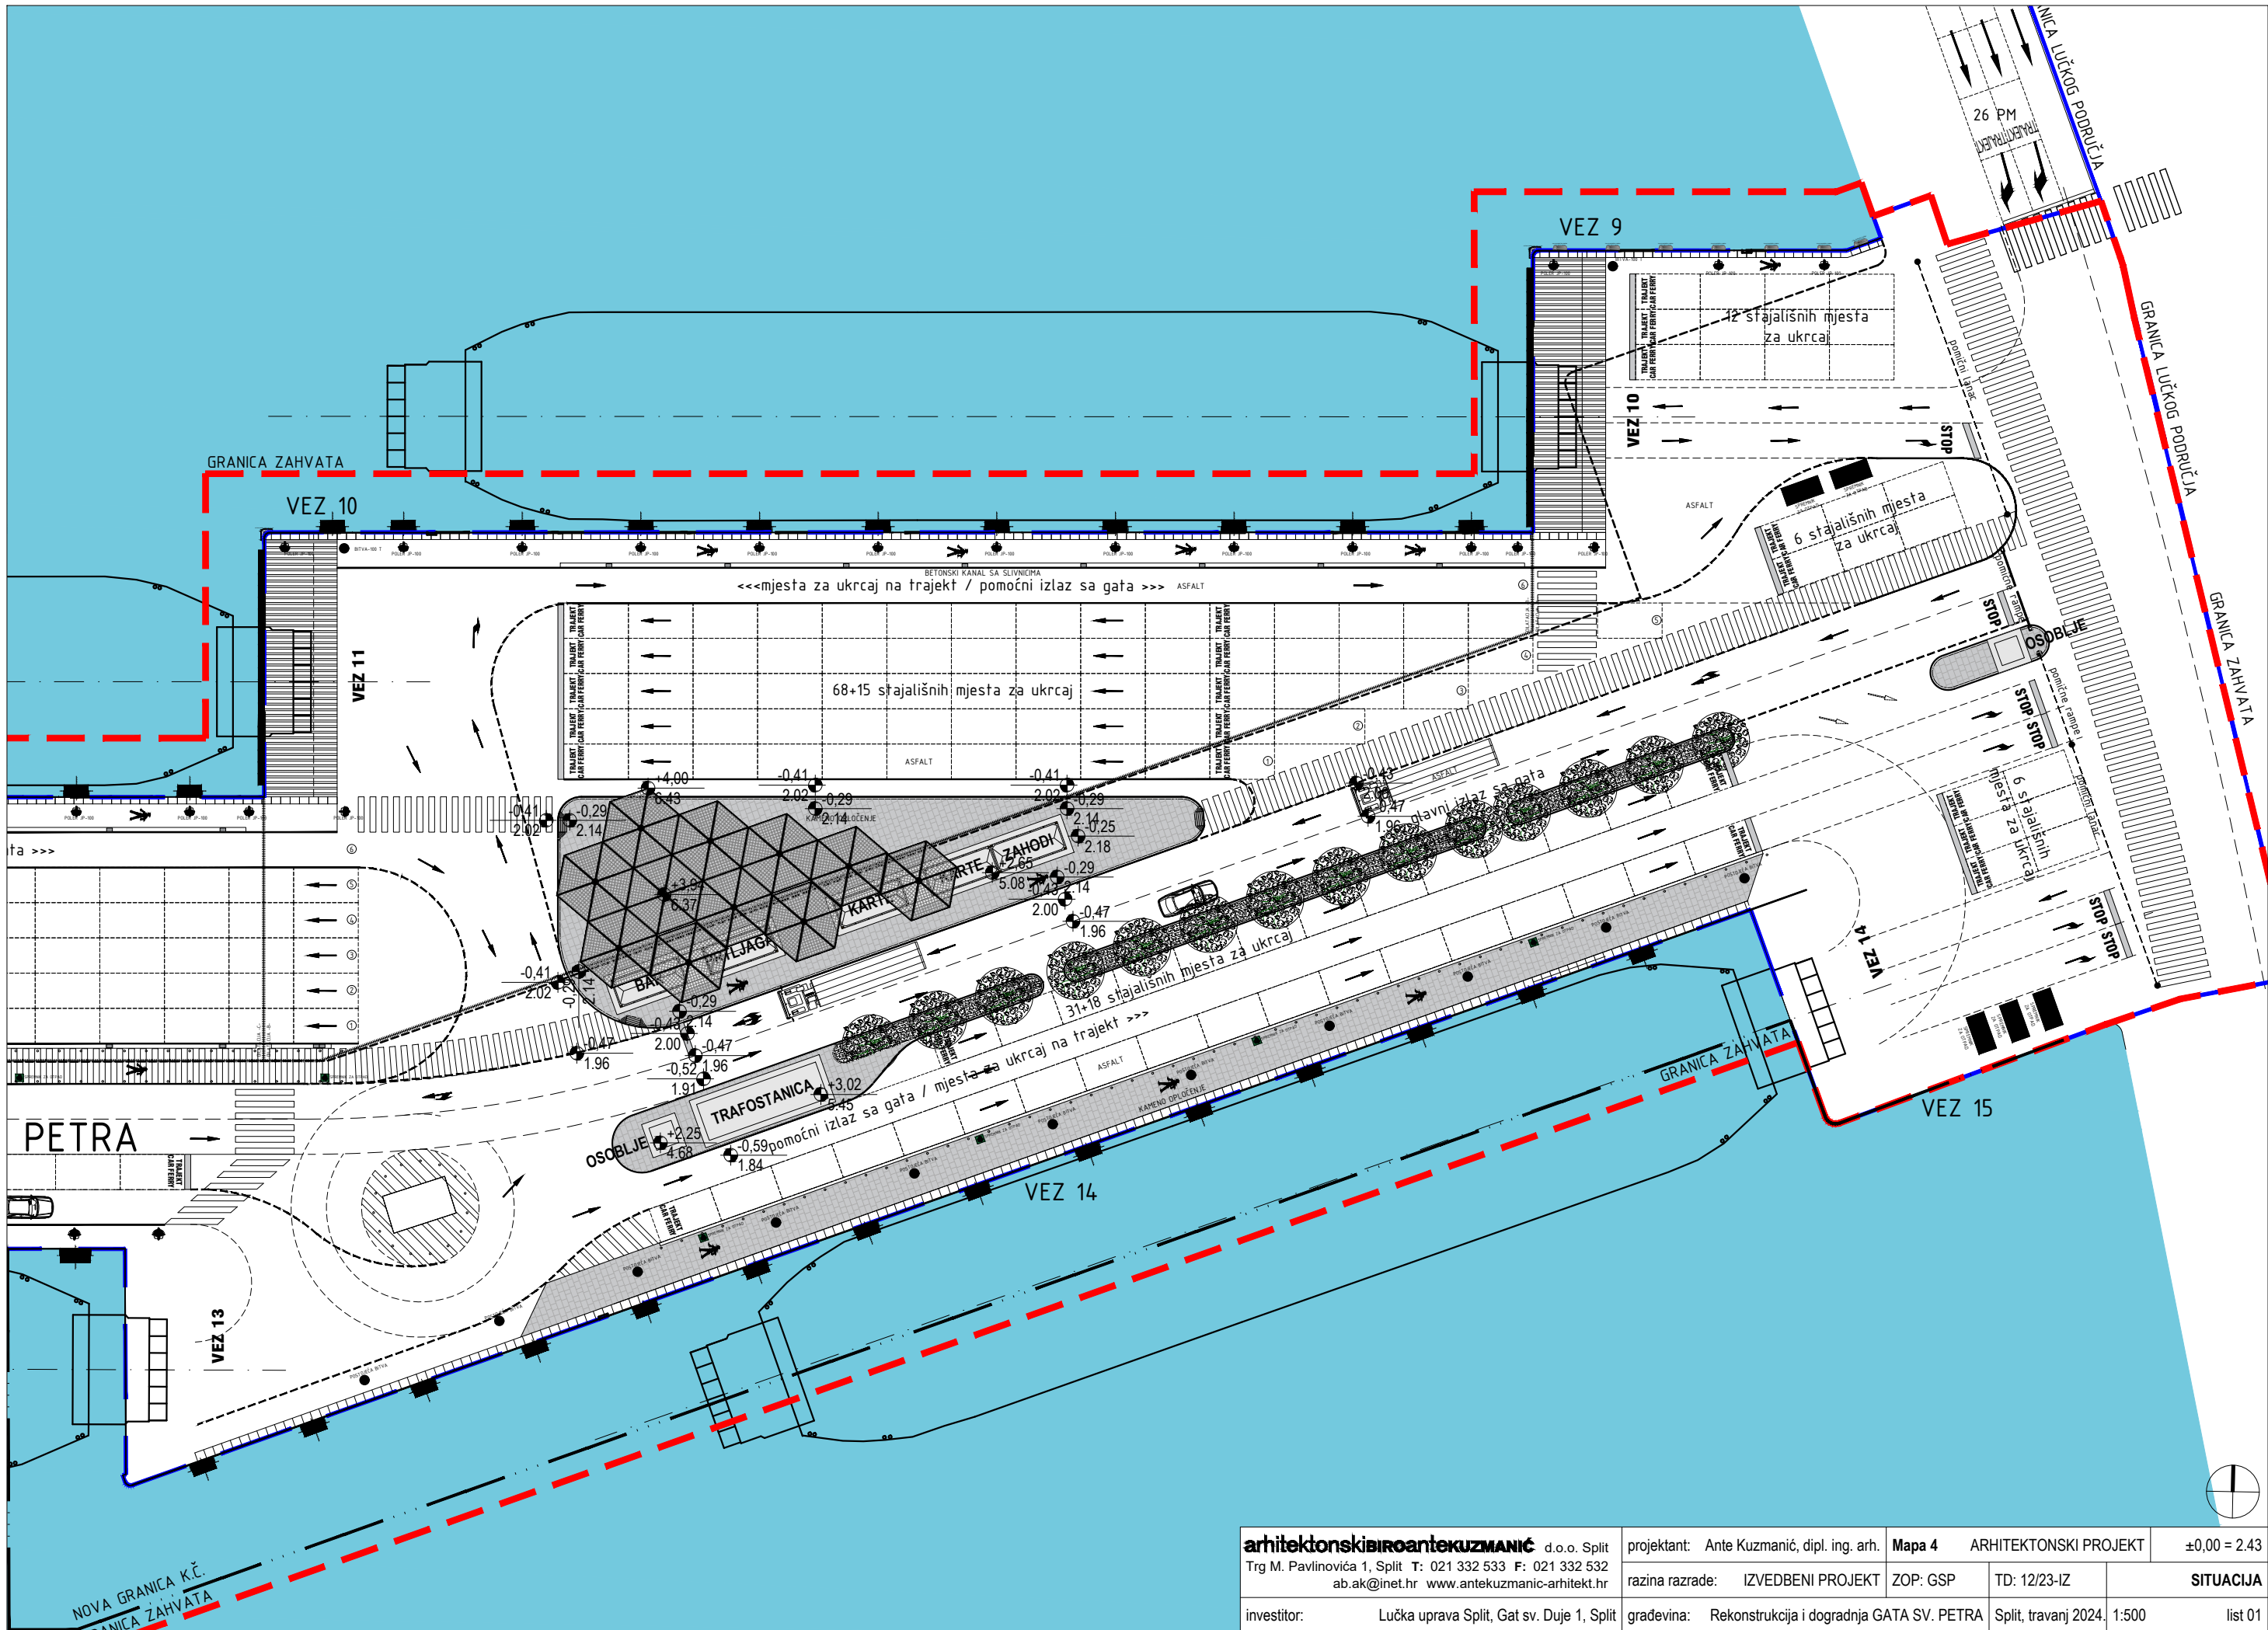



arhitektonskibirooantekuzMANIĆ d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektnant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		±0,00 = 2.43
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	SITUACIJA	
	investitor: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA	Split, travanj 2024.	1:500	list 01

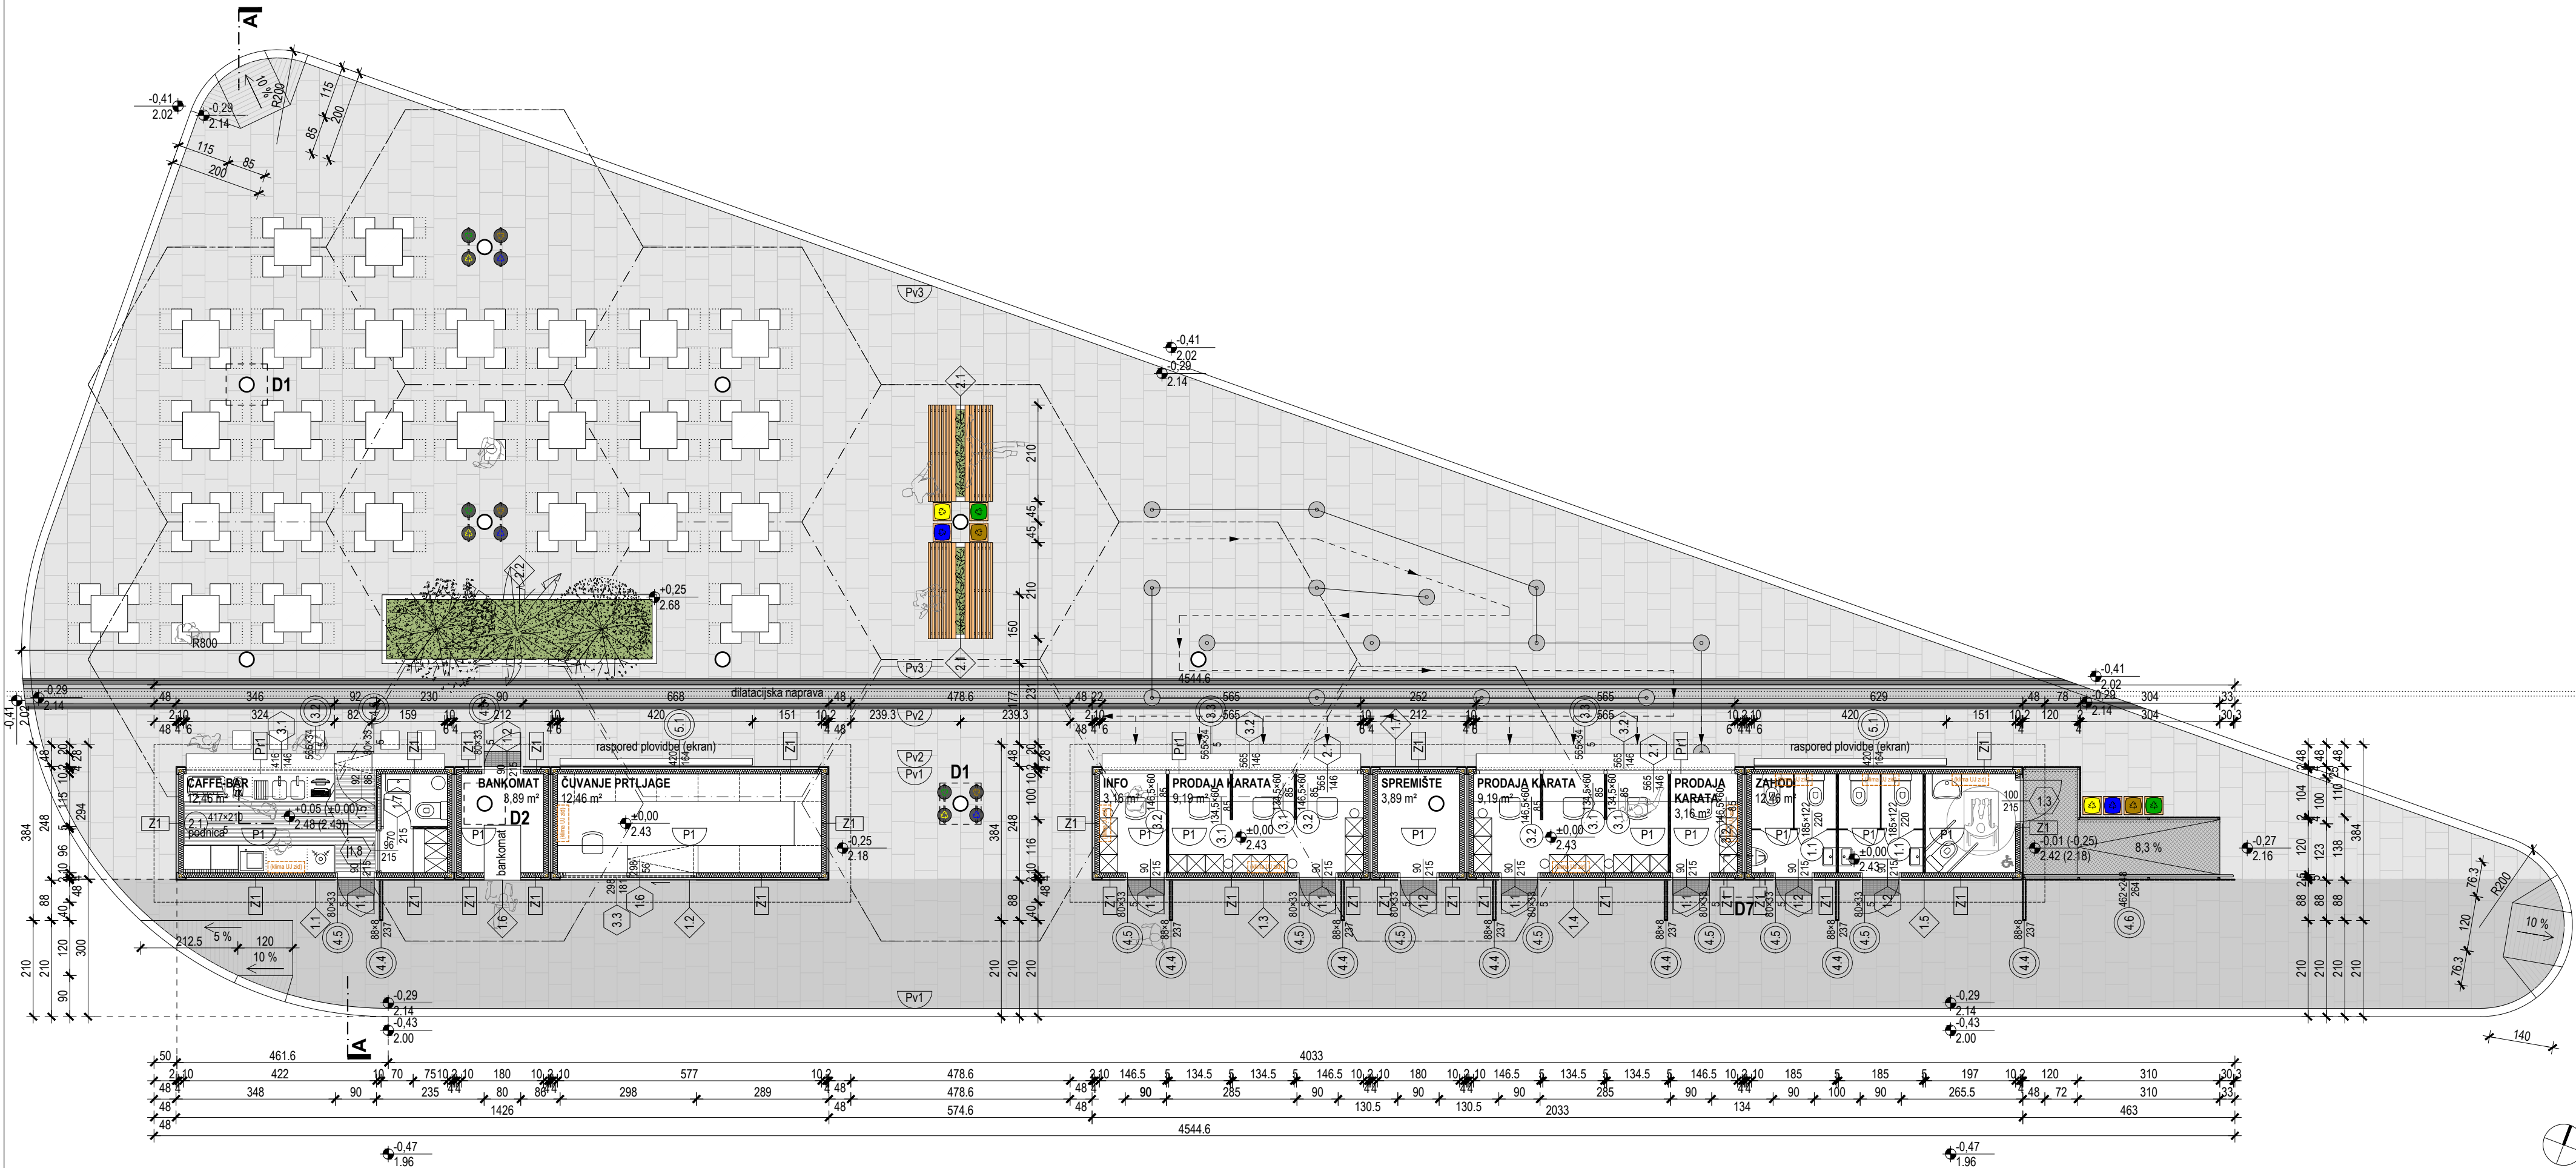


arhitektonski biro antekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.	Mapa 4	ARHITEKTONSKI PROJEKT		±0.00 = 2.43
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	TLOCRT PRIZEMLJA PUTNIČKOG SKLOPA	
	investitor: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA	Split, travanj 2024.	1:100	list 02

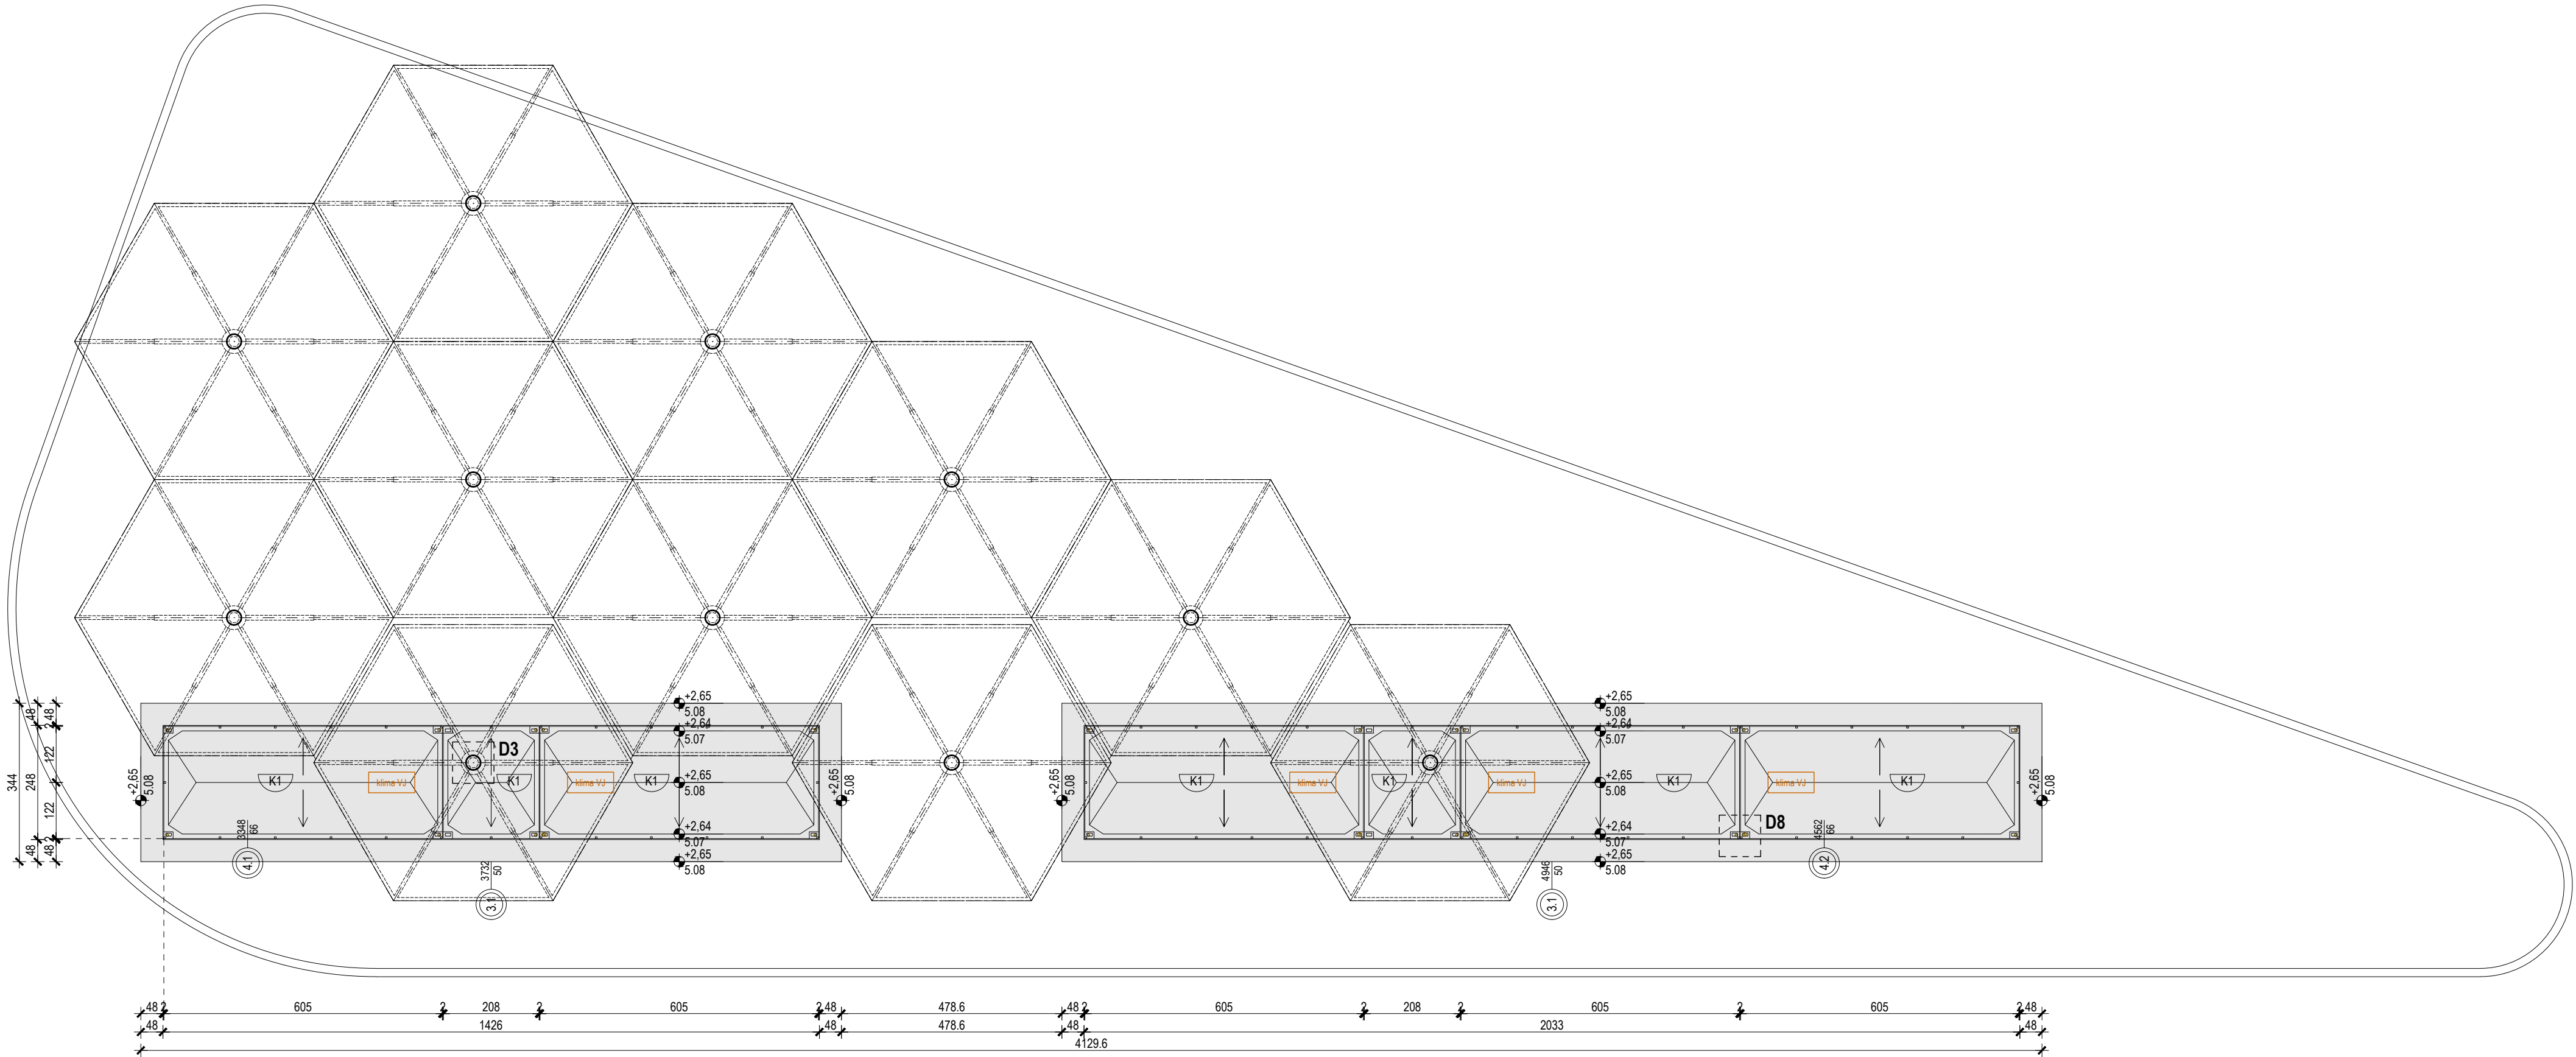



arhitektonski biro ante kuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.ante-kuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.	Mapa 4	ARHITEKTONSKI PROJEKT		±0.00 = 2.43
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	TLOCRT KROVNIH PLOHA PUTNIČKOG SKLOPA	
	investitor: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA	Split, travanj 2024.	1:100	list 03

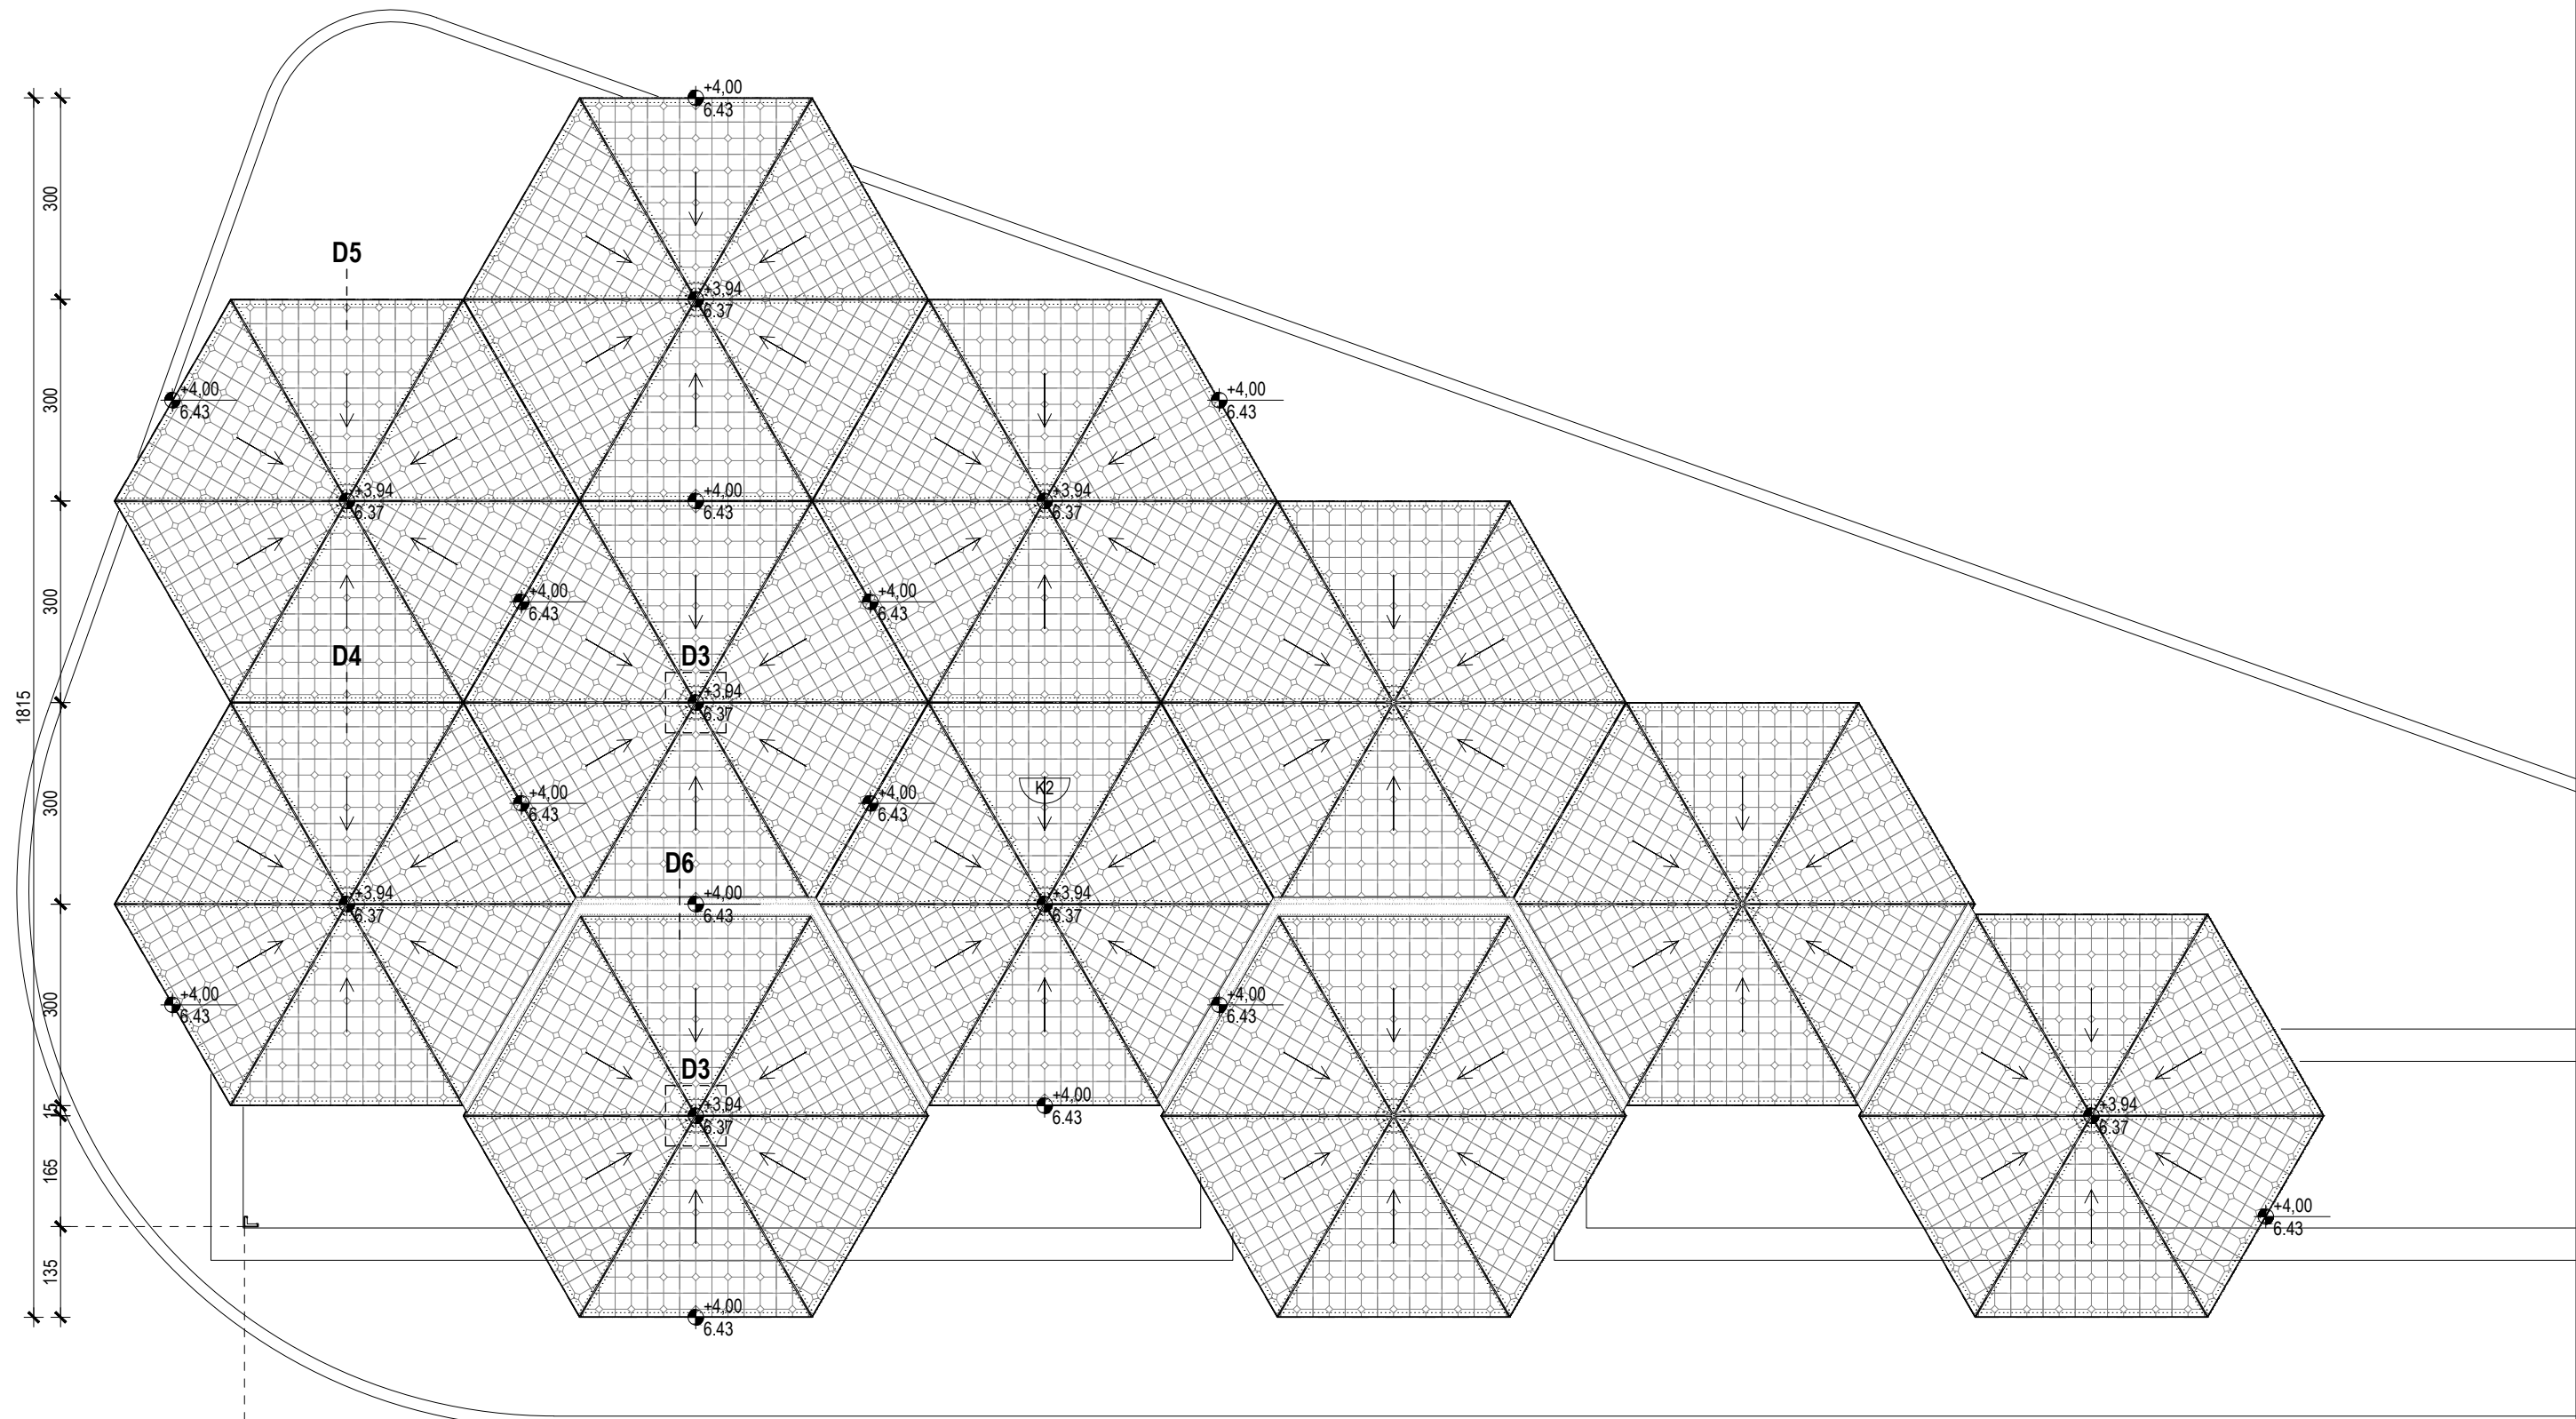

arhitektonskibiroantekuzMANIĆ d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		±0,00 = 2.43
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	TLOCRT KROVNIH PLOHA NADSTREŠNICE	
	investitor: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA	Split, travanj 2024.	1:100	list 04

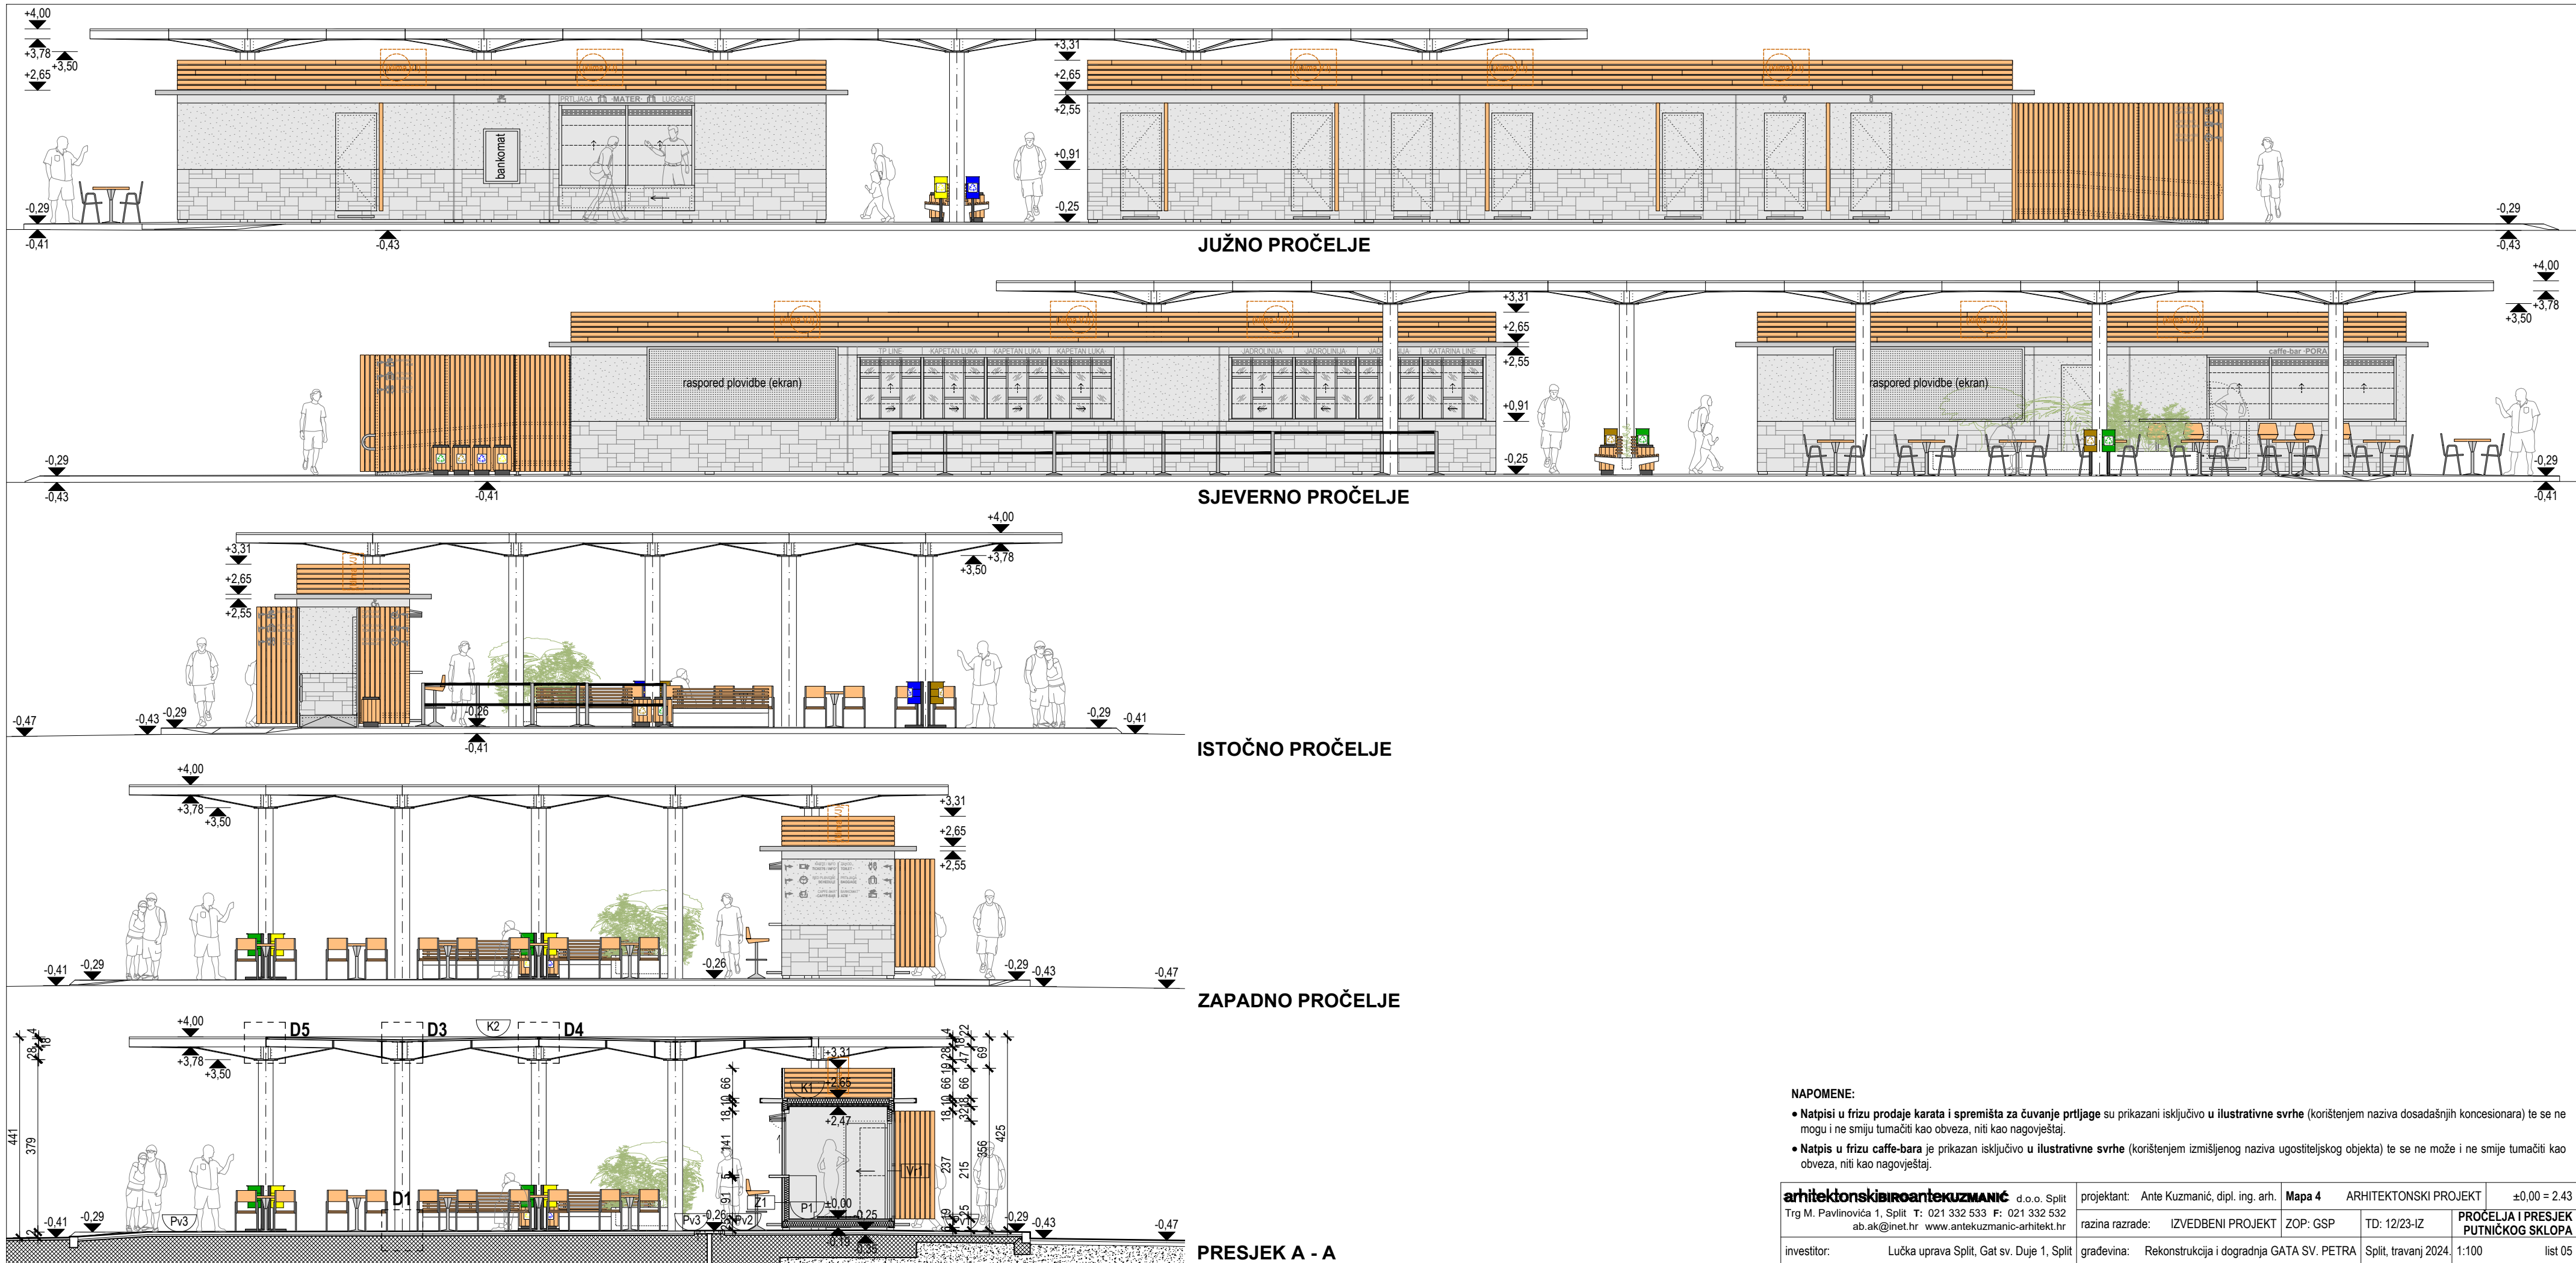

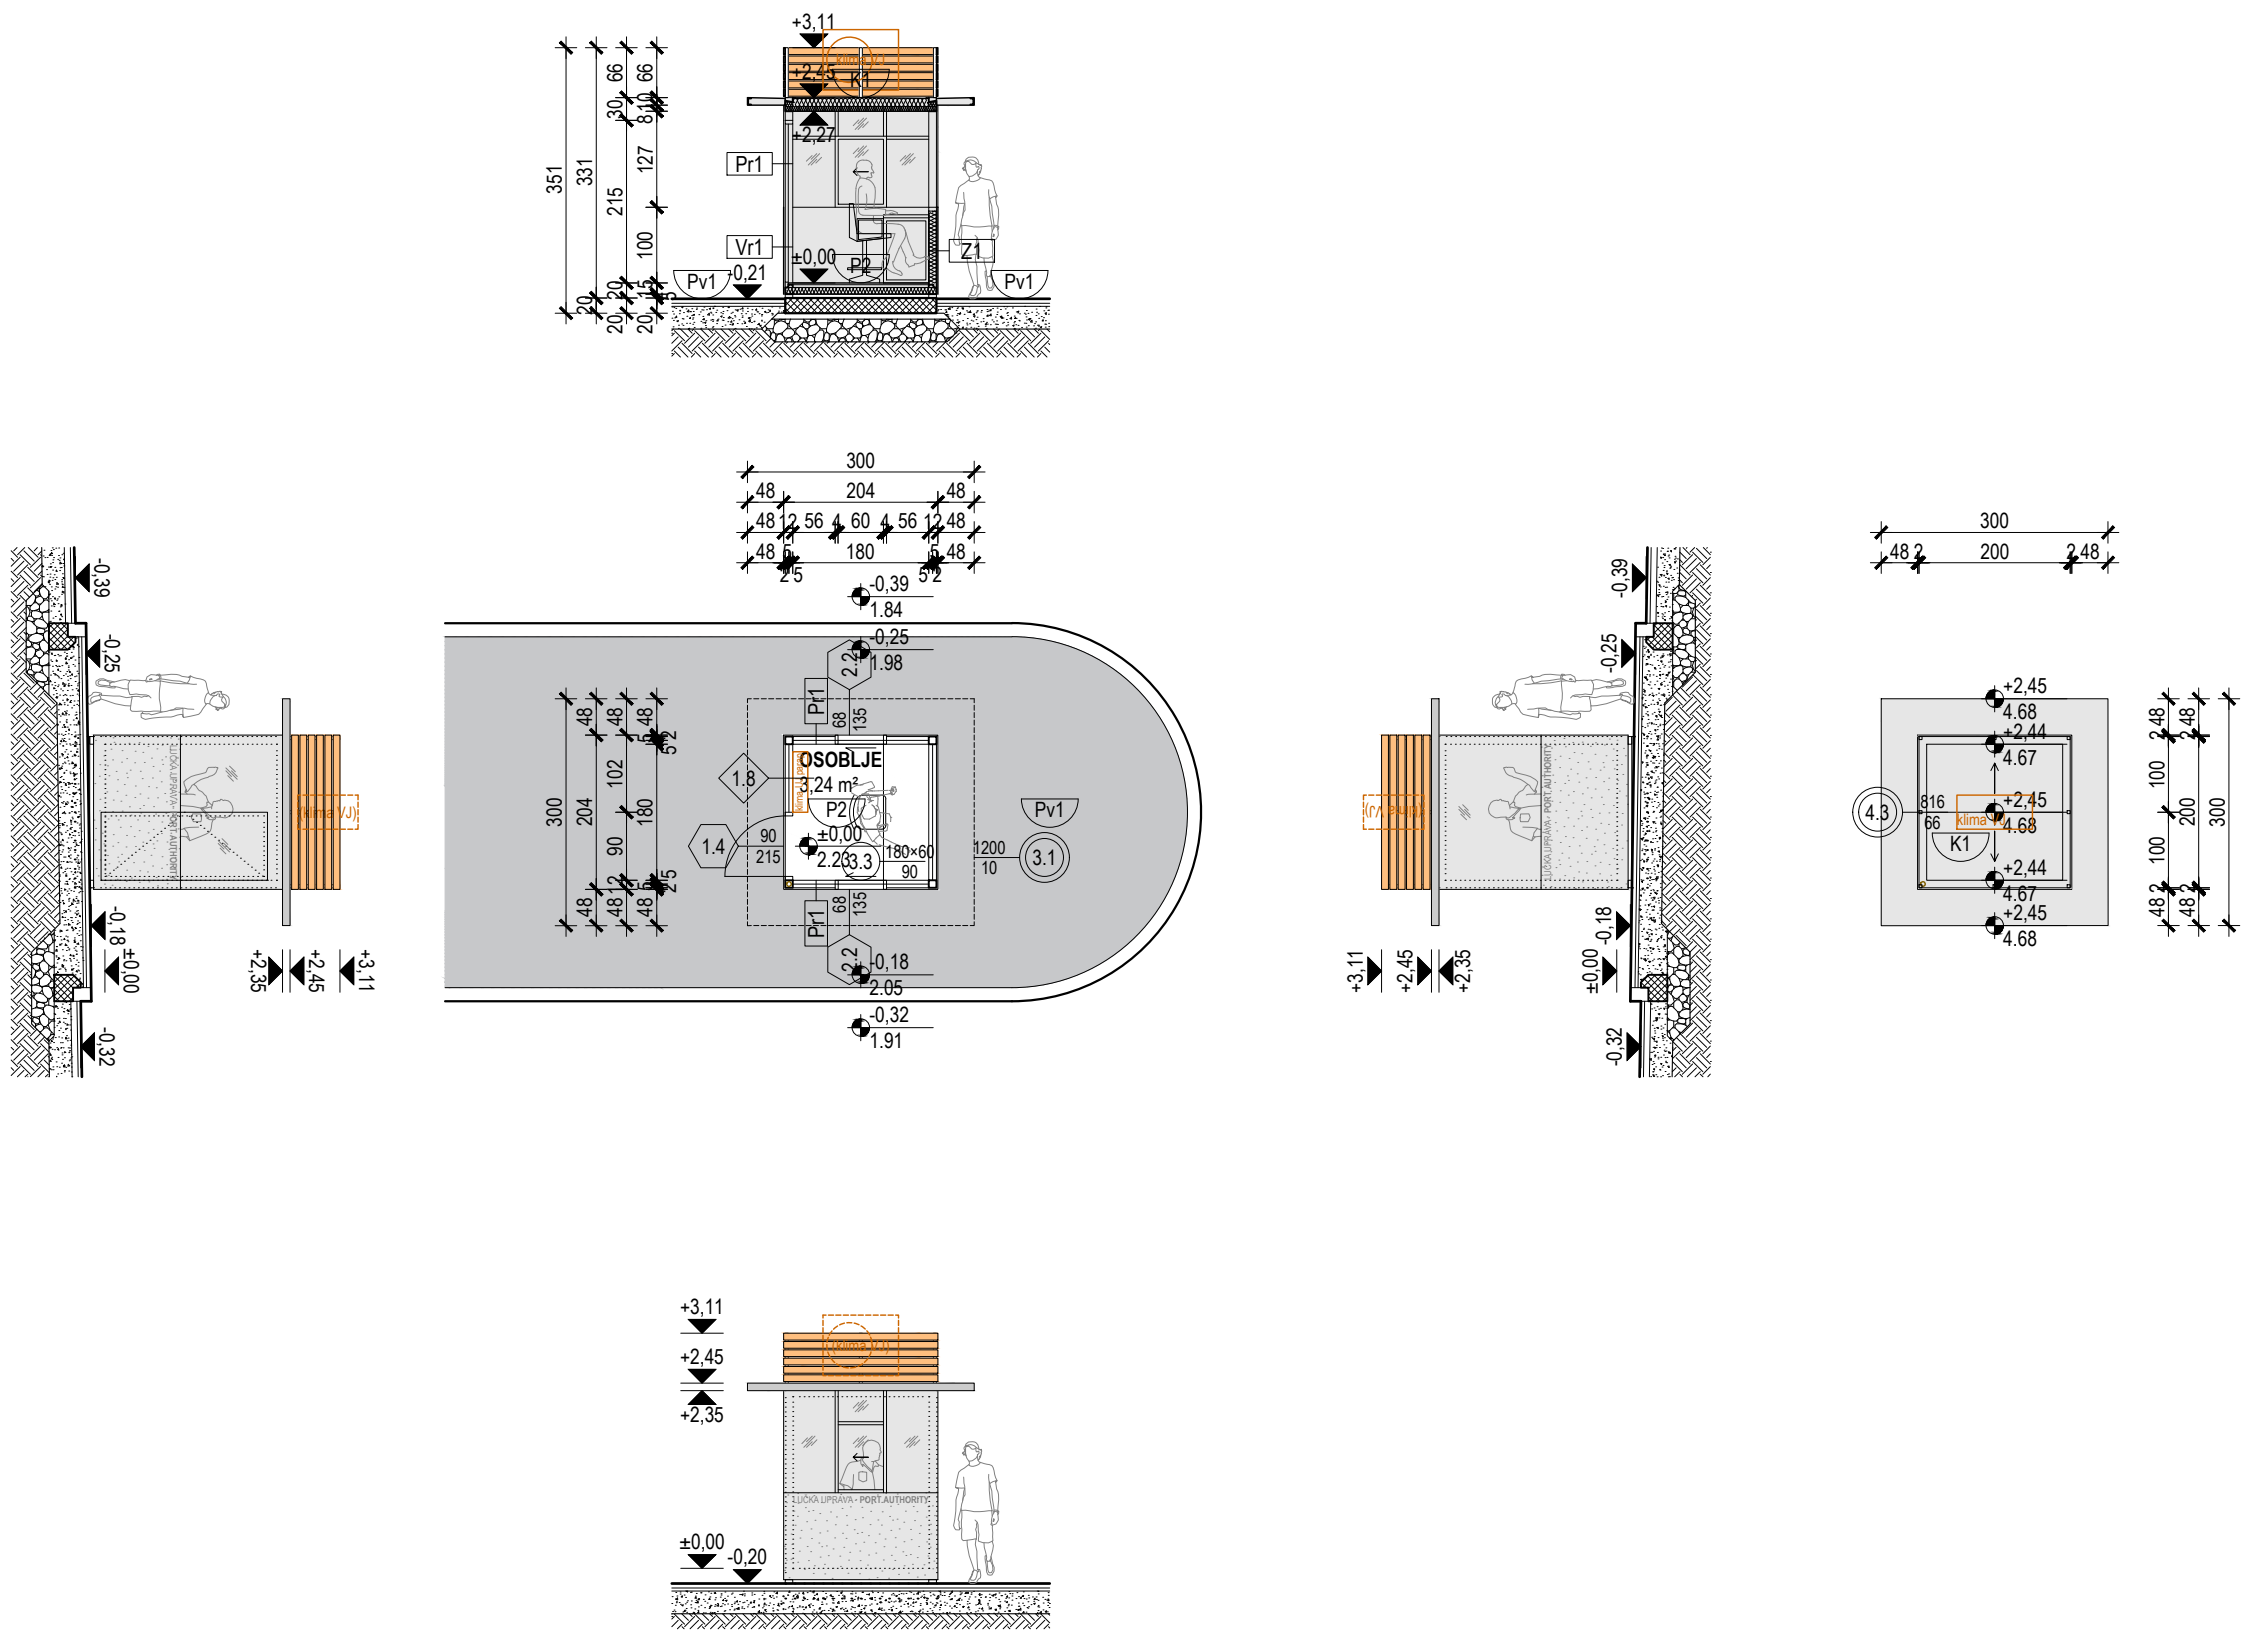

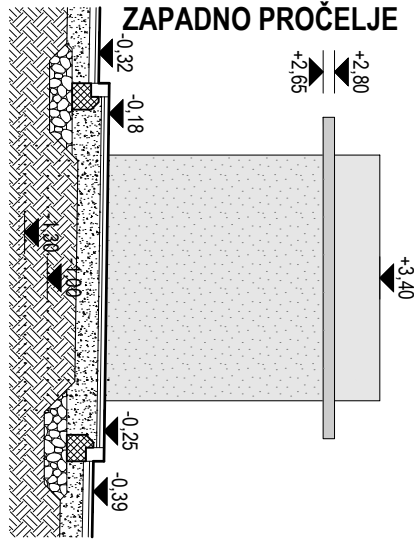



SJEVERNO PROČELJE

TLOCRT

PRESJEK 1 - 1

PRESJEK 2 - 2


JUŽNO PROČELJE

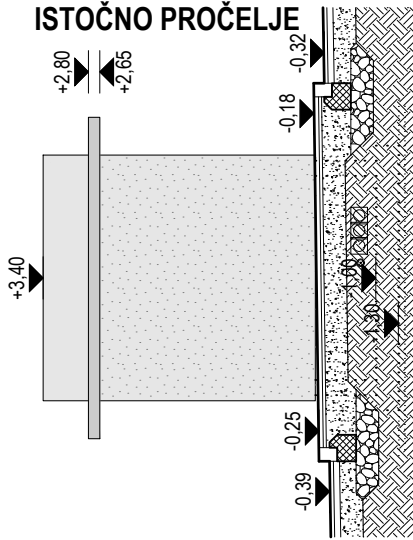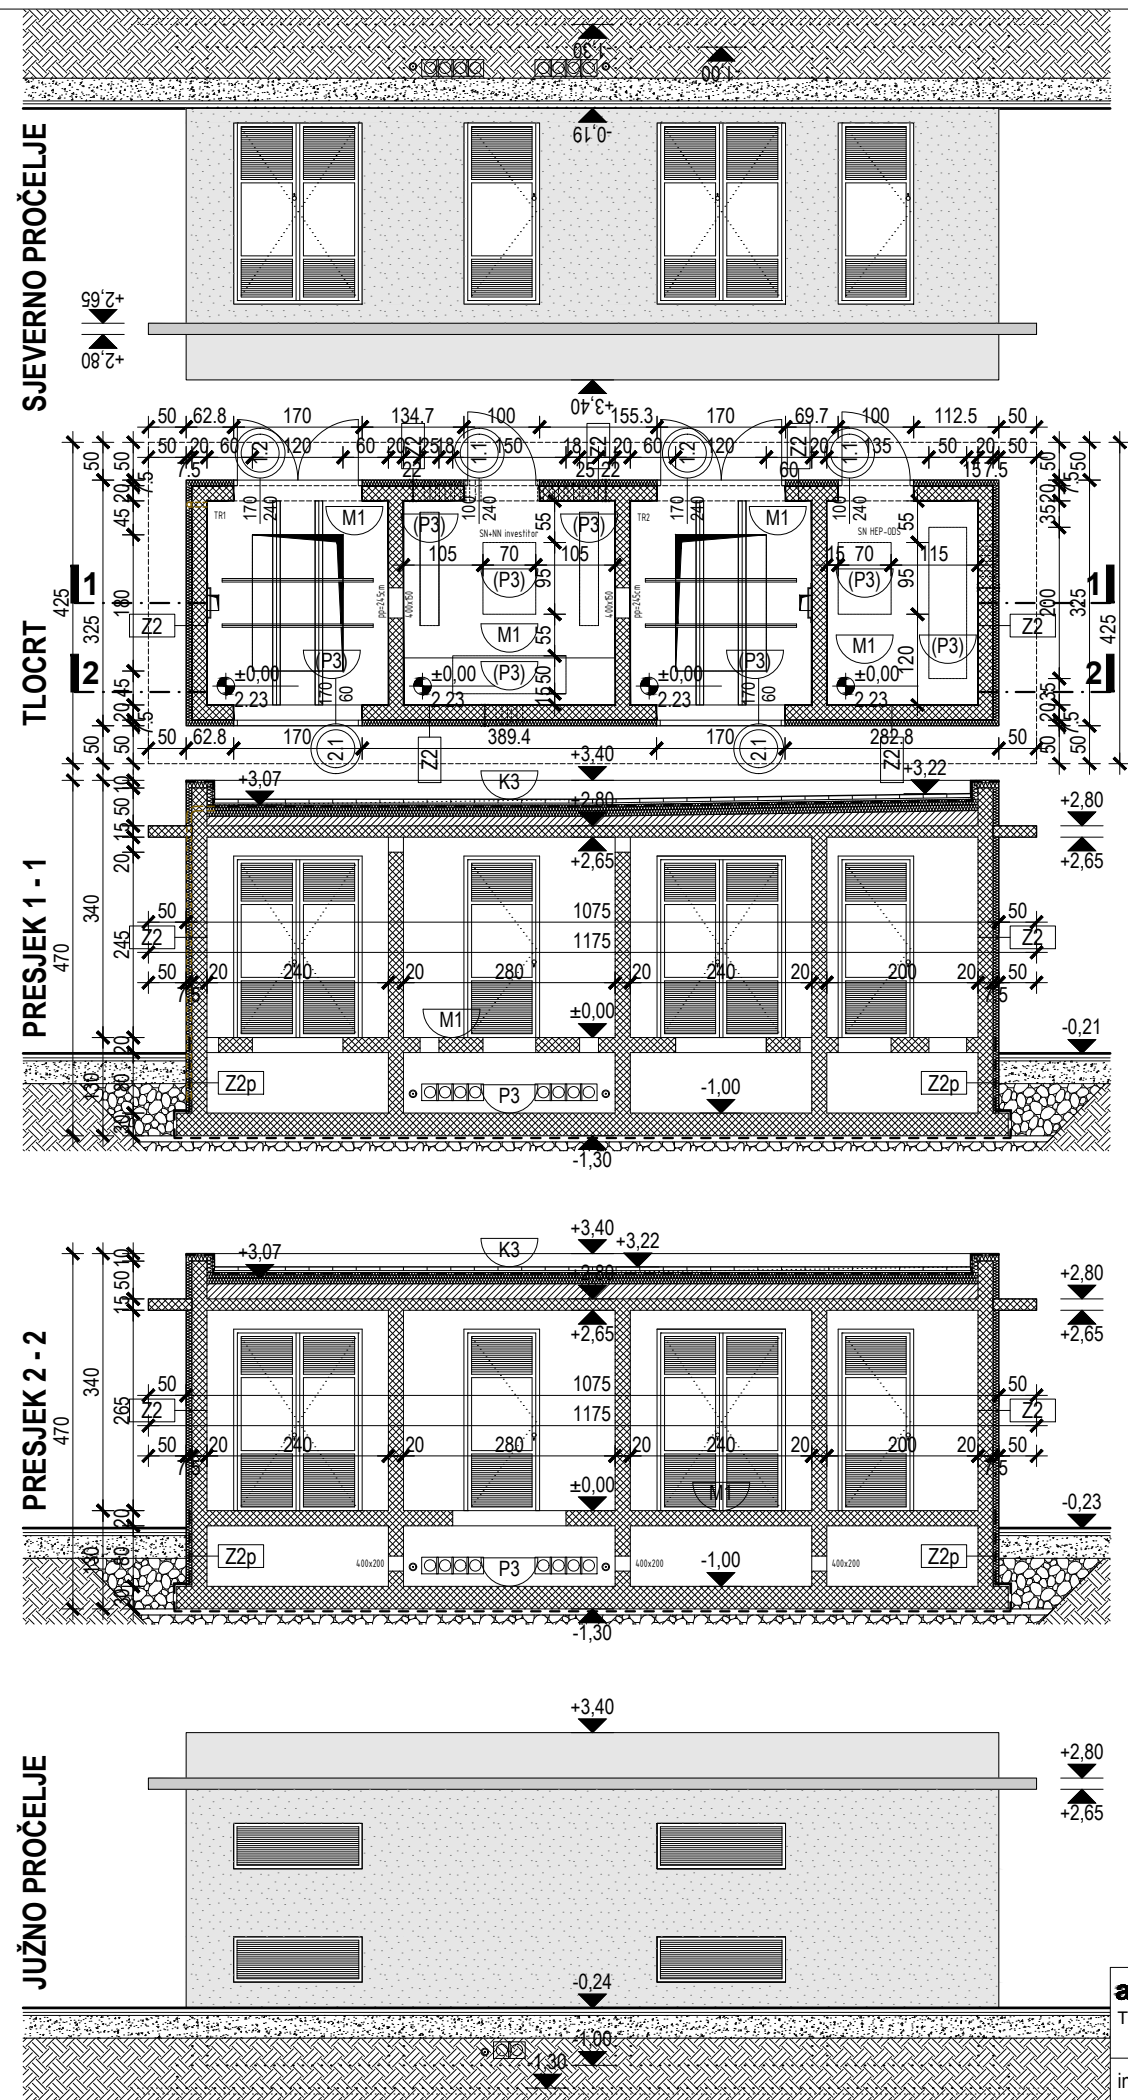


arhitektonskibirooantekuzMANIĆ d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		±0,00 = 2.23
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	NACRTI TRAFOSTANICE	
	investitor: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA	Split, travanj 2024.	1:100	list 07





B.2 DETALJI

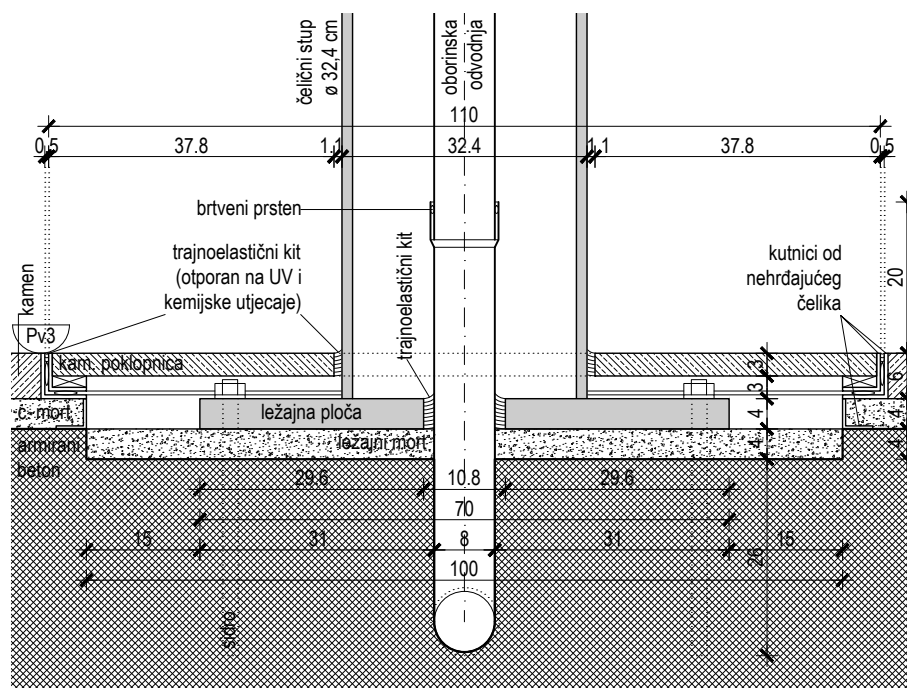


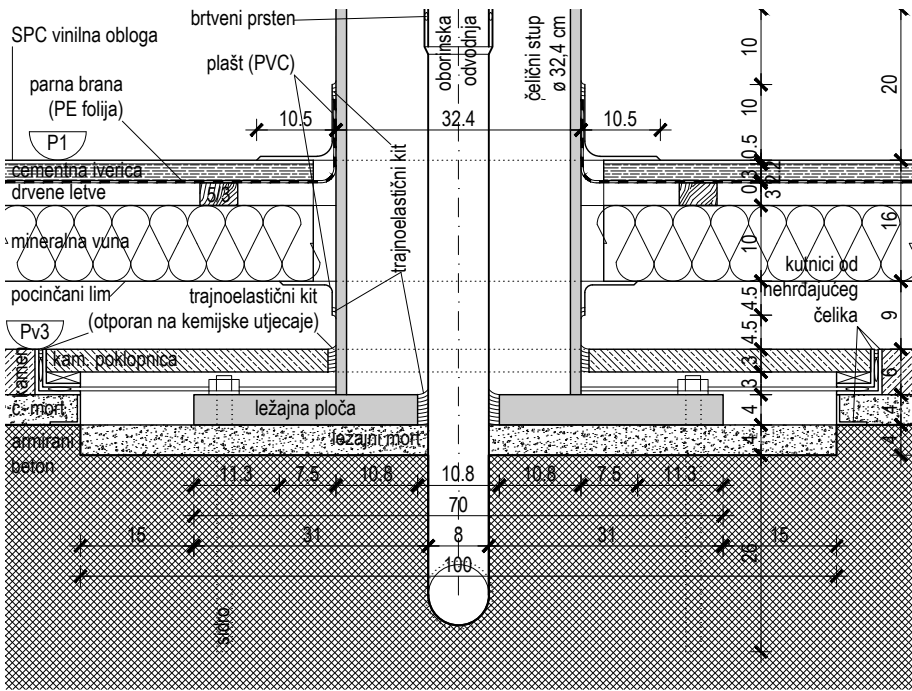


arhitektonskibiroo antekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		±0.00 = 2.43
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT		ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	DETALJ D2
	investitor: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split		građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA Split, travanj 2024.		1:10 list D2

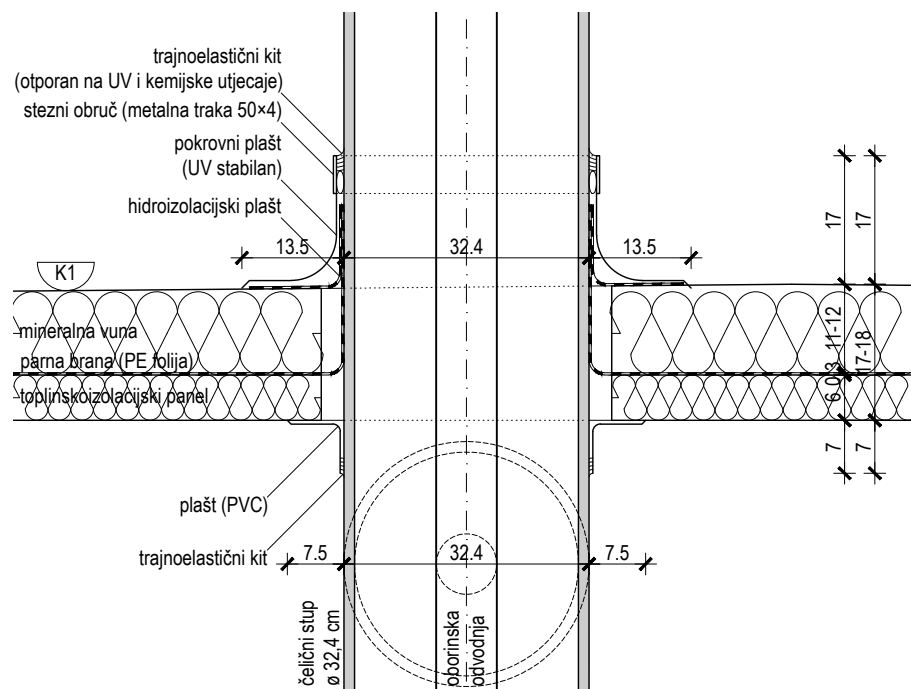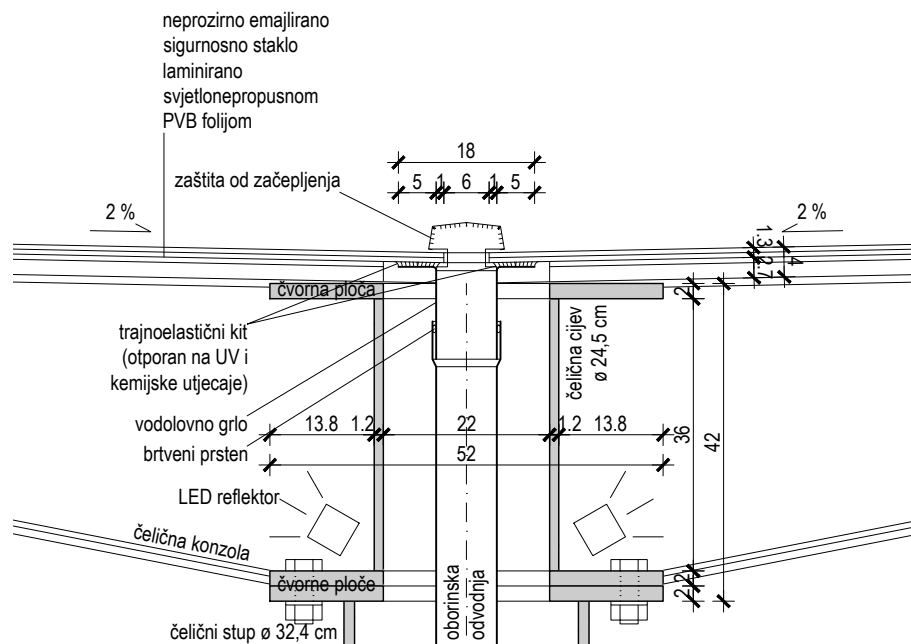


arhitektonski biro antekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		±0.00 = 2.43
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT		ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	DETALJ D3
investitor:	Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split		građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA	Split, travanj 2024.	1:10 list D3

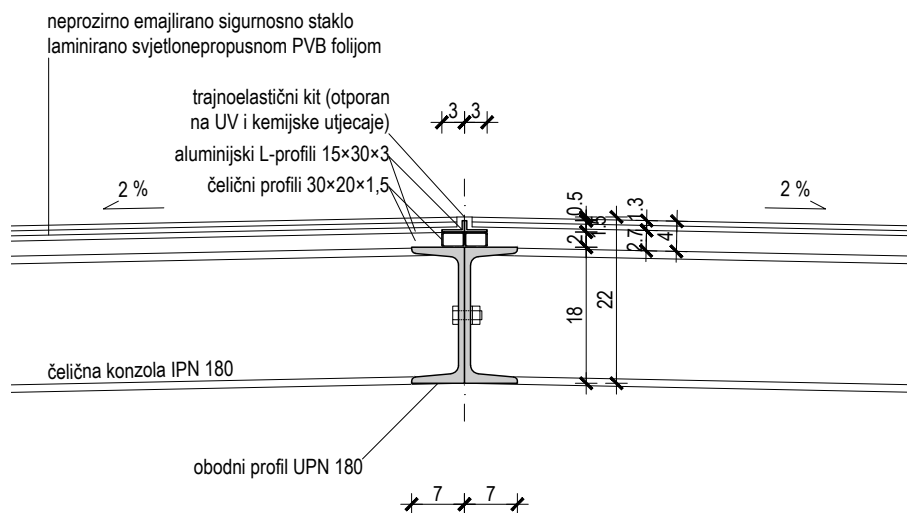



arhitektonski biro antekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projekant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		±0,00 = 2.43
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT		ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	DETALJ D4
investitor: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA		Split, travanj 2024.	1:10	list D4

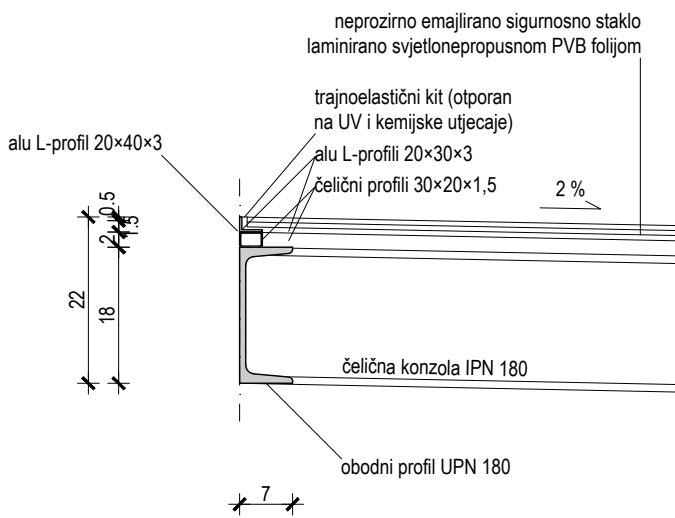

arhitektonski biro ante kuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.ante-kuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		±0,00 = 2.43
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	DETALJ D5	
investitor: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA	Split, travanj 2024.	1:10	list D5	

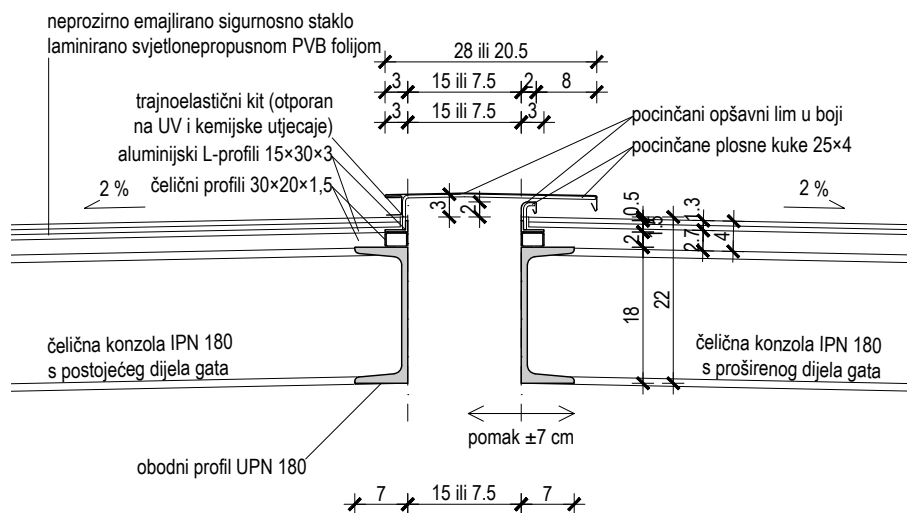

arhitektonski biro antekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.	Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		±0,00 = 2.43
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	DETALJ D6
investitor: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA	Split, travanj 2024.	1:10	list D6

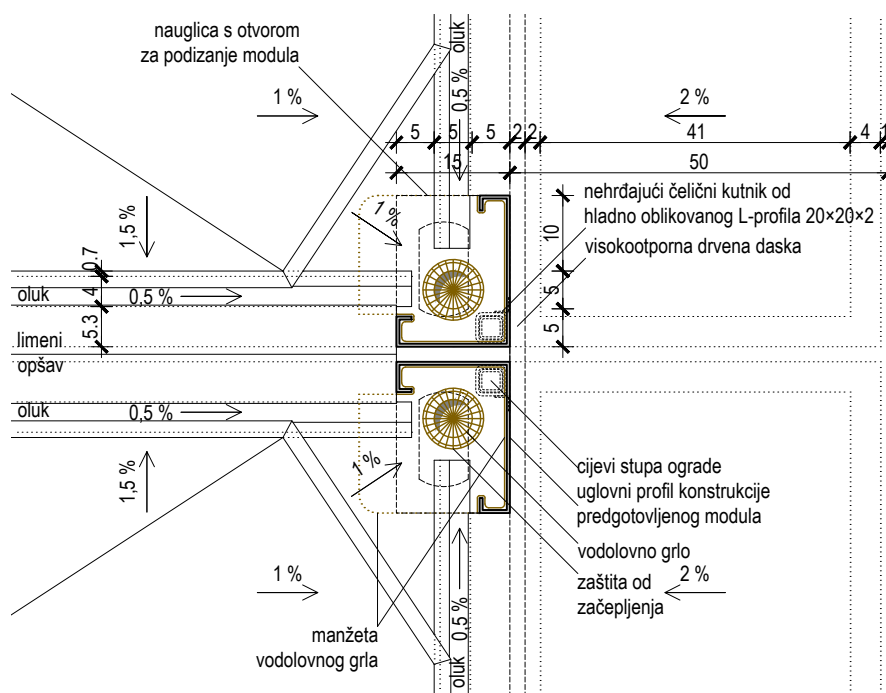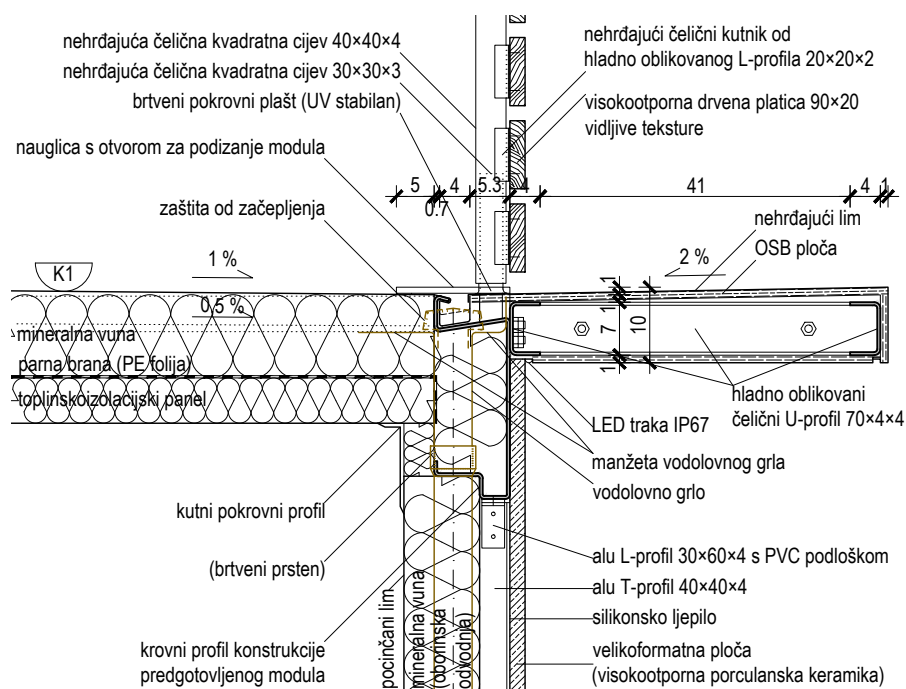


B.3 SCHEME BRAVARSKIH STAVKI

Vanjska jednokrilna zaokretna vrata u nosivom zidu trafostanice

Vanjska metalna pocinčana jednokrilna zaokretna vrata s ugrađenom žaluzinom (kišnom rešetkom) u gornjem i donjem dijelu svakog krila s okvirom izrađenim od šupljih profila. Boja po izboru projektanta. Stavkom je obuhvaćena i stražnja pocinčana mreža za sprječavanje ulaza životinja. Suha ugradnja sa slijepim okvirom. Na spoju dovratnika i zida završni poklopni profil. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacрта, sav spojni i pričvrсни materijal, kao i potreban propisani okov i brave. Sve izvesti u skladu sa shemom te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po komadu kompletno ugrađenih vrata dovedenih do pune funkcionalnosti.
Zidarski otvor 100/240 cm.

kom D: 2

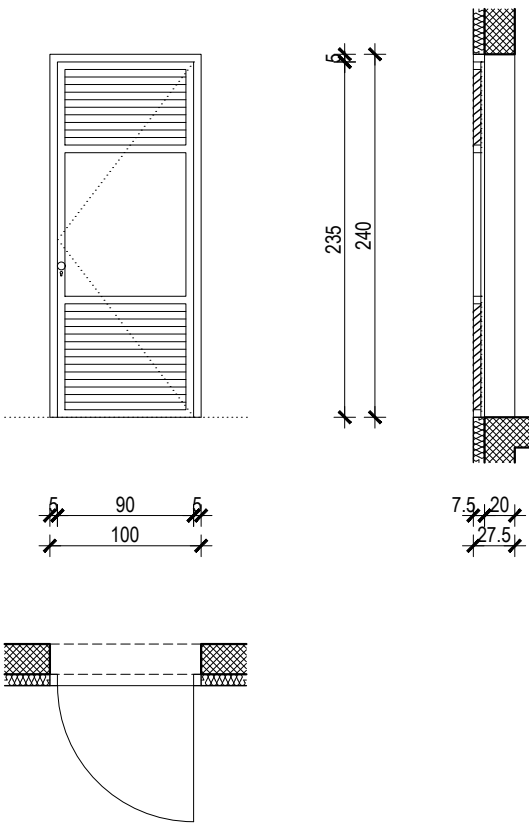

NAPOMENA:
Izdavač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!


arhitektonskibirooantekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT		ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	
investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA		1:50		1.1

Vanjska dvokrilna zaokretna vrata u nosivom zidu trafostanice

Vanjska metalna pocinčana dvokrilna zaokretna vrata s ugrađenom žaluzinom (kišnom rešetkom) u gornjem i donjem dijelu svakog krila s okvirom izrađenim od šupljih profila. Boja po izboru projektanta. Stavkom je obuhvaćena i stražnja pocinčana mreža za sprječavanje ulaza životinja. Suha ugradnja sa slijepim okvirom. Na spoju dovratnika i zida završni poklopni profil. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrtu, sav spojni i pričvrzni materijal, kao i potreban propisani okov i brave. Sve izvesti u skladu sa shemom te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po komadu kompletno ugrađenih vrata dovedenih do pune funkcionalnosti.

Zidarski otvor 170/240 cm.

kom: 2

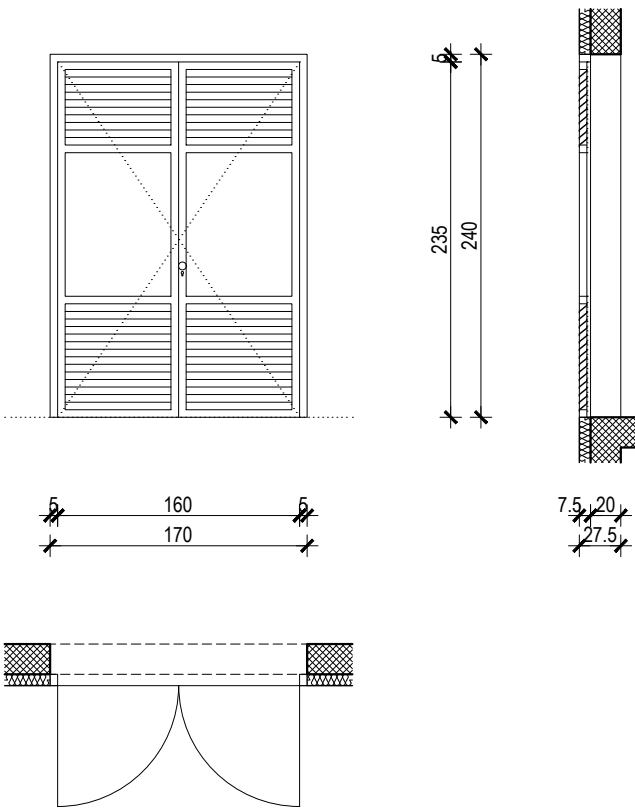


NAPOMENA:
Izdavač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!

arhitektonskibirooantekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.	Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	SHEMA BRAVARIJE
investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA	1:50		1.2

Vanjska fiksna rebrenica u nosivom zidu trafostanice

Vanjska fiksna rebrenica od protukišne rešetke, Z profil. Okvir i lamele od profiliranog, pocinčanog čelilčnog lima. Vertikalni razmak lamela 50 mm, osno. Cijenom obuhvatiti sav potreban pričvrsni, spojni i zaptivni materijal. Stavkom je obuhvaćena i stražnja pocinčana mreža za sprječavanje ulaza životinja. Također obuhvatiti završnu obradu cinčanjem uz sve prethodne radnje u smislu zaštite od korozije. Sve izvesti u skladu sa shemom te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po komadu izvedene rebrenice dovedene do pune funkcionalnosti. Zidarski otvor 170/60 cm.

kom: 4

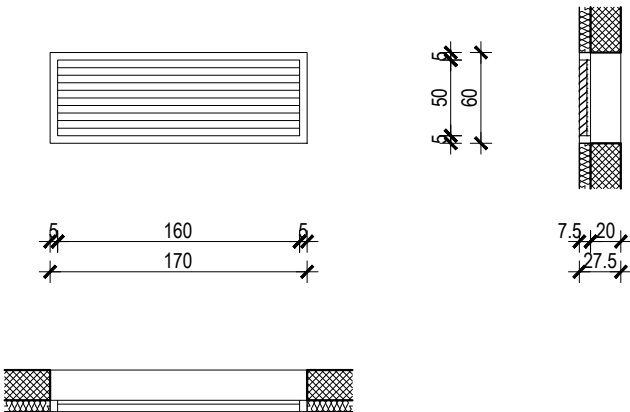


NAPOMENA:
Izdavač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!

arhitektonskibirooantekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	SHEMA BRAVARIJE	
investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA		1:50	2.1	

Vanjska streha predgotovljenih modula

Vanjska streha od pocinčane čelične konstrukcije obložene nehrđajućim čeličnim limom u boji po izboru projektanta. U limenu oblogu uključena je ispunjena OSB pločama. Postavlja se na skrivenom pocinčanom okviru koji se pričvršćuje za konstrukciju predgotovljenog modula. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrt, sav spojni i pričvršni materijal, kao i potreban propisani okov. Sve izvesti u skladu sa shemom te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po m² tlocrtne površine ugrađene strehe dovedene do pune funkcionalnosti. Dubina strehe 50 cm. Uglova 16 kom.

m²: 51,10

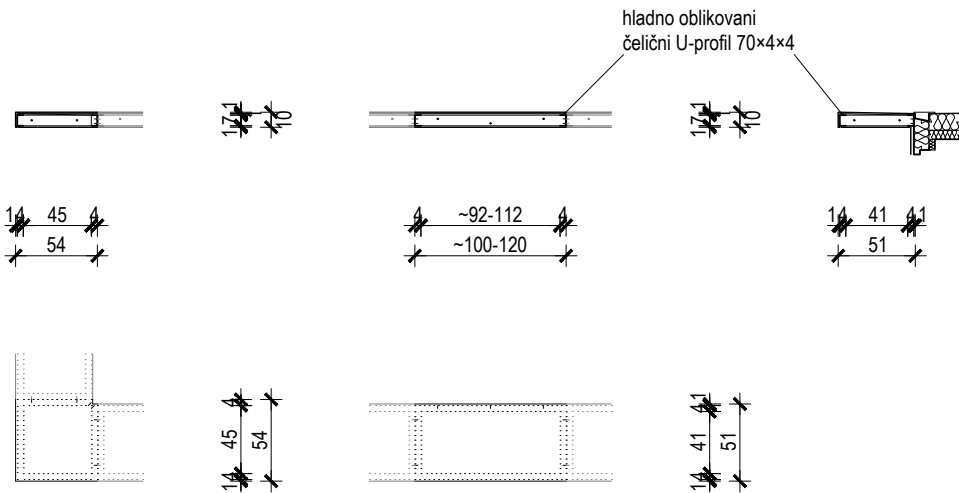

NAPOMENA:
Izdavač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!


arhitektonskibirooantekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT		ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	
investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA		1:50		3.1

Vanjski pult predgotovljenog modula caffe-bara

Vanjski pult od pocinčane čelične konstrukcije obložene nehrđajućim čeličnim limom u boji po izboru projektanta. U limenu oblogu uključena je ispuna OSB pločama. Postavlja se na skrivenom pocinčanom okviru koji se pričvršćuje za konstrukciju predgotovljenog modula. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacрта, sav spojni i pričvrсни materijal, kao i potreban propisani okov. Sve izvesti u skladu sa shemom te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po komadu ugrađenog pulta dovedenog do pune funkcionalnosti.

Mjere 565×44×5 cm.

kom: 1

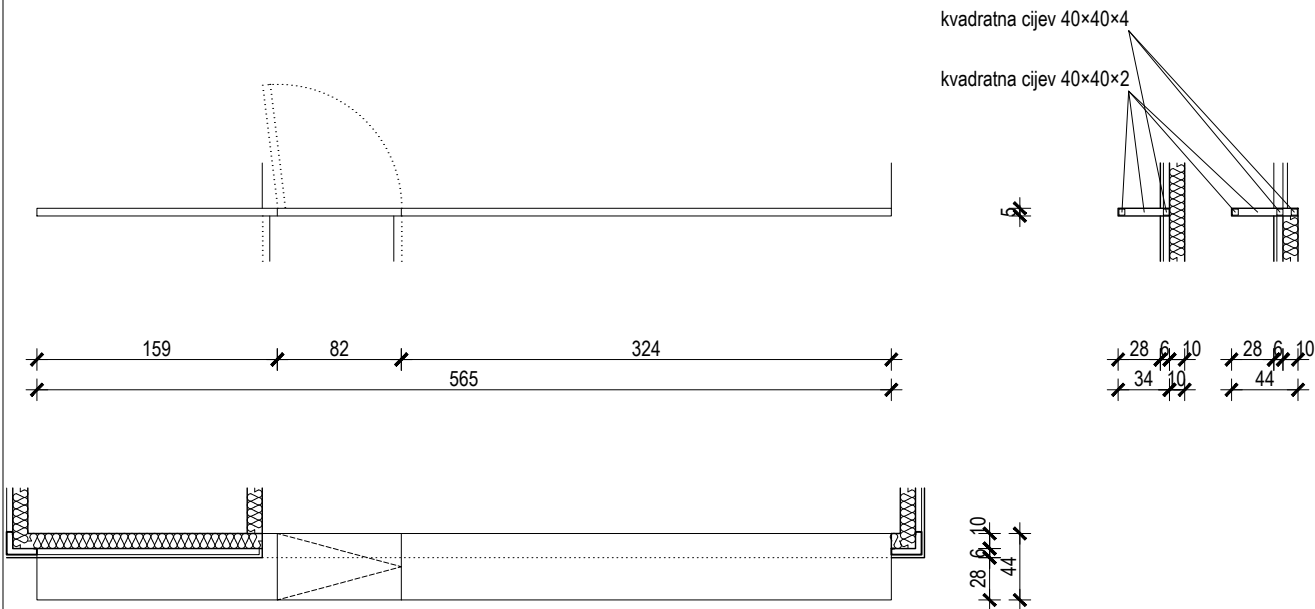

NAPOMENA:
Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!


arhitektonskibirooantekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.	Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	SHEMA BRAVARIJJE
investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA			1:50 3.2

Vanjski pult predgotovljenog modula prodaje karata

Vanjski pult od pocinčane čelične konstrukcije obložene nehrđajućim čeličnim limom u boji po izboru projektanta. U limenu oblogu uključena je ispuna OSB pločama. Postavlja se na skrivenom pocinčanom okviru koji se pričvršćuje za konstrukciju predgotovljenog modula. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacрта, sav spojni i pričvrсни materijal, kao i potreban propisani okov. Sve izvesti u skladu sa shemom te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po komadu ugrađenog pulta dovedenog do pune funkcionalnosti.

Mjere 565×37×5 cm.

kom: 2

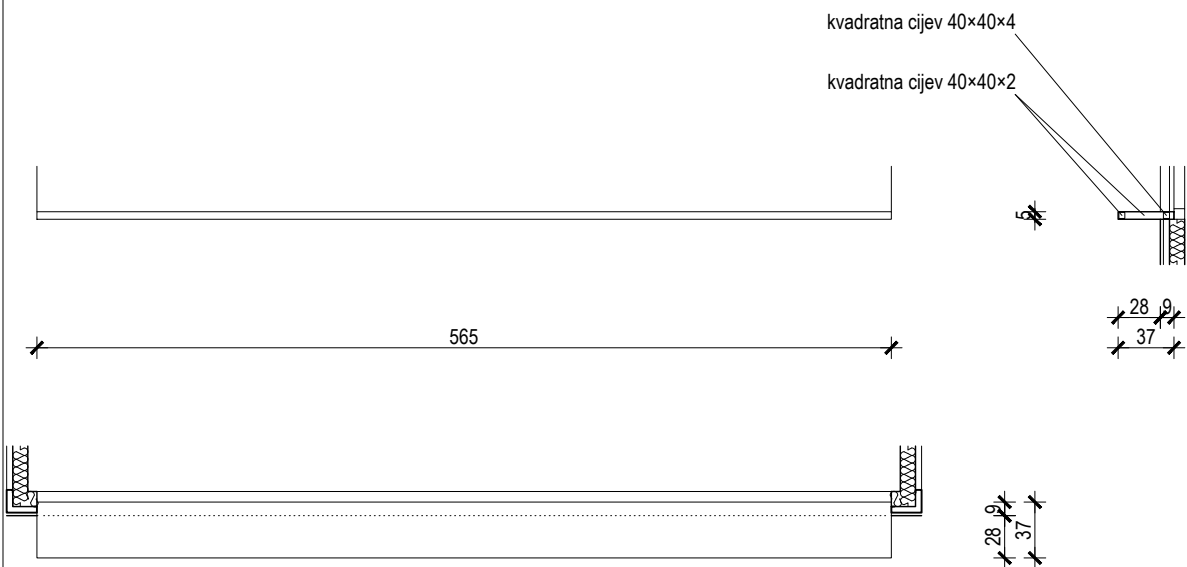


NAPOMENA:
Izdavač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!

arhitektonski biro antekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.	Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	SHEMA BRAVARIJE
investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA			1:50 3.3

Vanjska ograda na krovu zapadnog kvadra

Vanjska ograda od drvenih platica na potkonstrukciji. Drvene platice su od visokootpornog drva kao akacija, pričvršćene na profile od nehrđajućeg čelika izvana nevidljivim spojem. Sav spojni materijal je od nehrđajućeg čelika. Cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrt. Stavkom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal, pričvrсни i pomoćni materijal i radne skele. Sve izvesti u skladu sa shemom te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po m² izvedene ograde. Visina 66 cm.

m²: 22,10

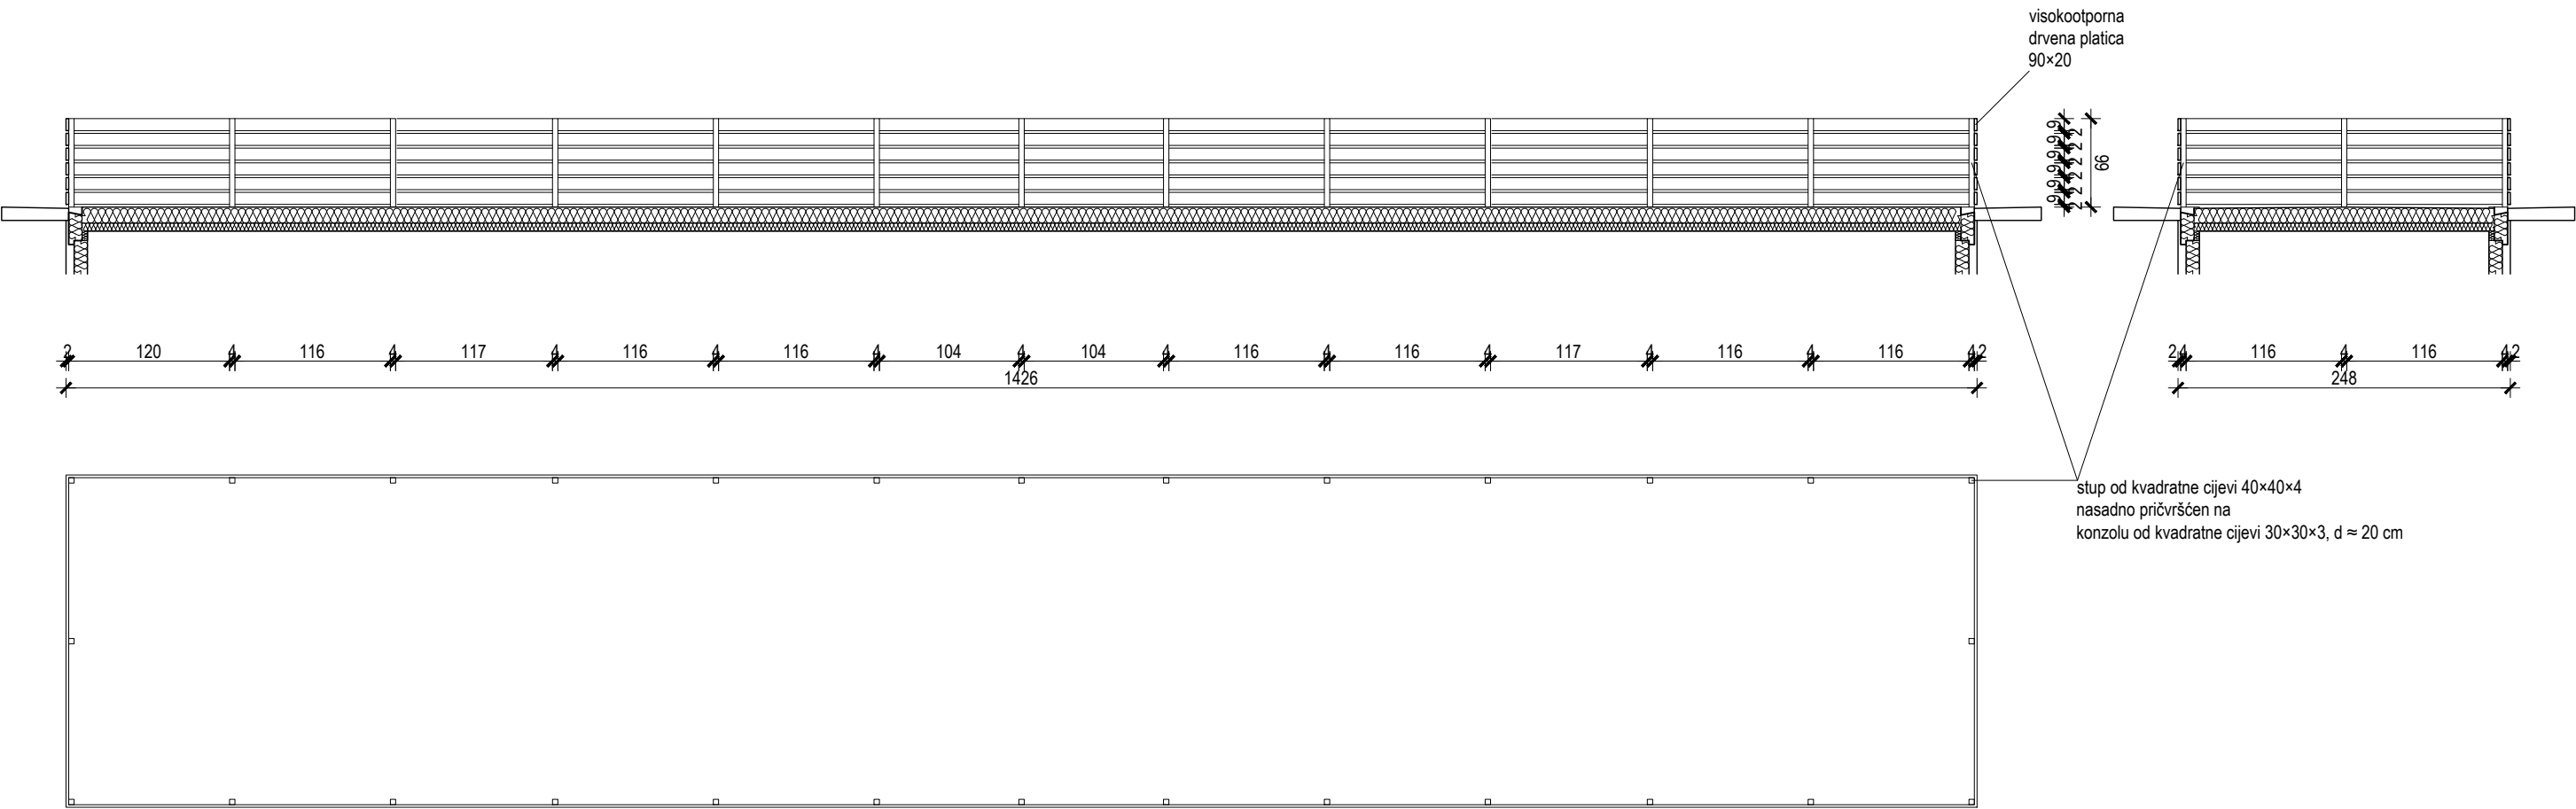

NAPOMENA:
Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!


arhitektonskibiroantekuzMANIĆ d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	SHEMA BRAVARIJE	
	investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA			1:50 4.1

Vanjska ograda na krovu kućice za osoblje

Vanjska ograda od drvenih platica na potkonstrukciji. Drvene platice su od visokootpornog drva kao akacija, pričvršćene na profile od nehrđajućeg čelika izvana nevidljivim spojem. Sav spojni materijal je od nehrđajućeg čelika. Cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacрта. Stavkom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal, pričvrsni i pomoćni materijal i radne skele. Sve izvesti u skladu sa shemom te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po m² izvedene ograde.

Visina 66 cm.

m²: 10,80

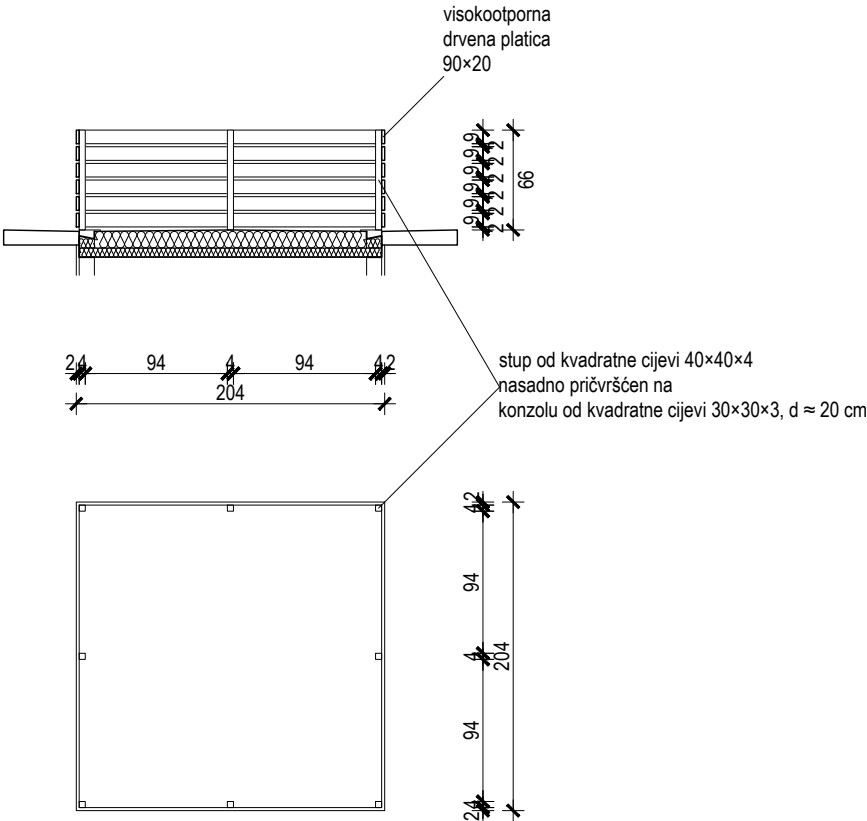


NAPOMENA:
Izdavač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!

arhitektonski biro antekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.	Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	SHEMA BRAVARIJE
investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA			1:50 4.3

Vanjski štitić uz vrata

Vanjski štitić od drvenih platice na potkonstrukciji. Drvene platice su od visokootpornog drva kao akacija, pričvršćene obostrano i preko čela na konzolne profile od nehrđajućeg čelika. Sav spojni materijal je od nehrđajućeg čelika. Cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrtu. Stavkom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal, pričvrsni i pomoćni materijal i radne skele. Sve izvesti u skladu sa shemom te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po m² izvedenog štitića. Mjere 88×8×237 cm.

m²: 15,10

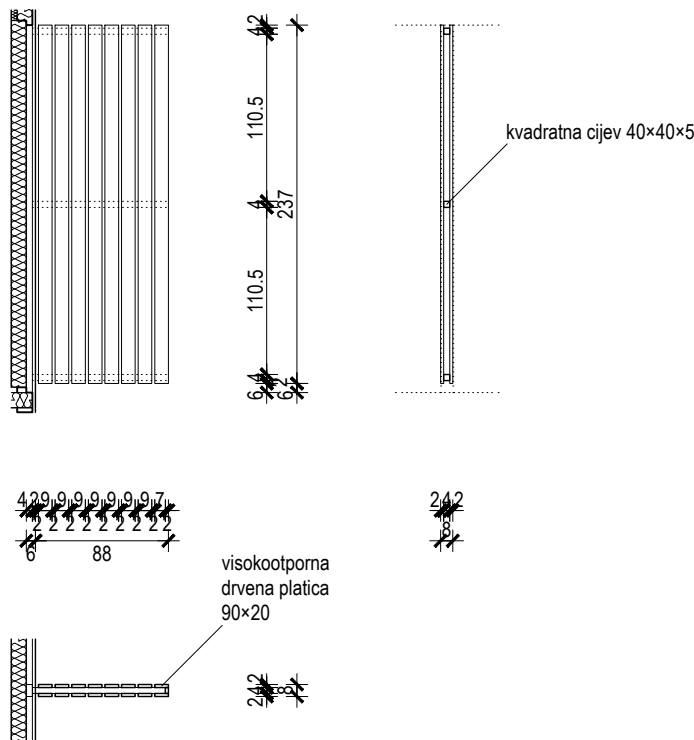


NAPOMENA:
Izdavač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!

arhitektonski biro antekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT		ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	SHEMA BRAVARIJJE
investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA			1:50	4.4

Vanjska stuba ispred vrata

Vanjska stuba od pocinčane čelične rešetke s kvadratičnim okom 30/30 mm na pocinčanom okviru s konzolama spojenim na konstrukciju modula. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrtu, sav spojni i pričvrzni materijal, kao i potreban propisani okov. Sve izvesti u skladu sa shemom te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po komadu kompletno ugrađene stube dovedene do pune funkcionalnosti.
Mjere 80×33×5 cm.

kom: 9

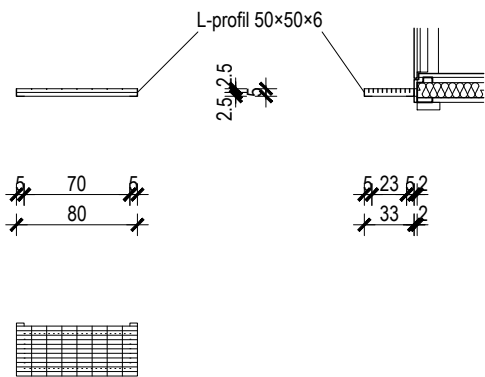


NAPOMENA:
Izdavač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!

arhitektonskibirooantekuzMANIĆ d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT		ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	SHEMA BRAVARIJE
investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA			1:50	4.5

Vanjska rampa s ogradom

Rampa za osobe u kolicima s drvenom ogradom. Nosiva konstrukcija je izvedena od čeličnih profila i pričvršćena je za tlo. Vozna površina je izvedena od rebrastog lima. Kompletna konstrukcija je vruće cinčana. Rukohvat je izveden od cijevi od nehrđajućeg čelika pasiviziranog i poliranog. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacрта, sav spojni i pričvrсни materijal, kao i potreban propisani okov. Sve izvesti u skladu sa shemom te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po kilogramu kompletno ugrađene rampe i po tlocrtnoj duljini izvedene ograde dovedene do pune funkcionalnosti. Mjere 464×336×264 cm.

kg: 268,00
m': 11,80

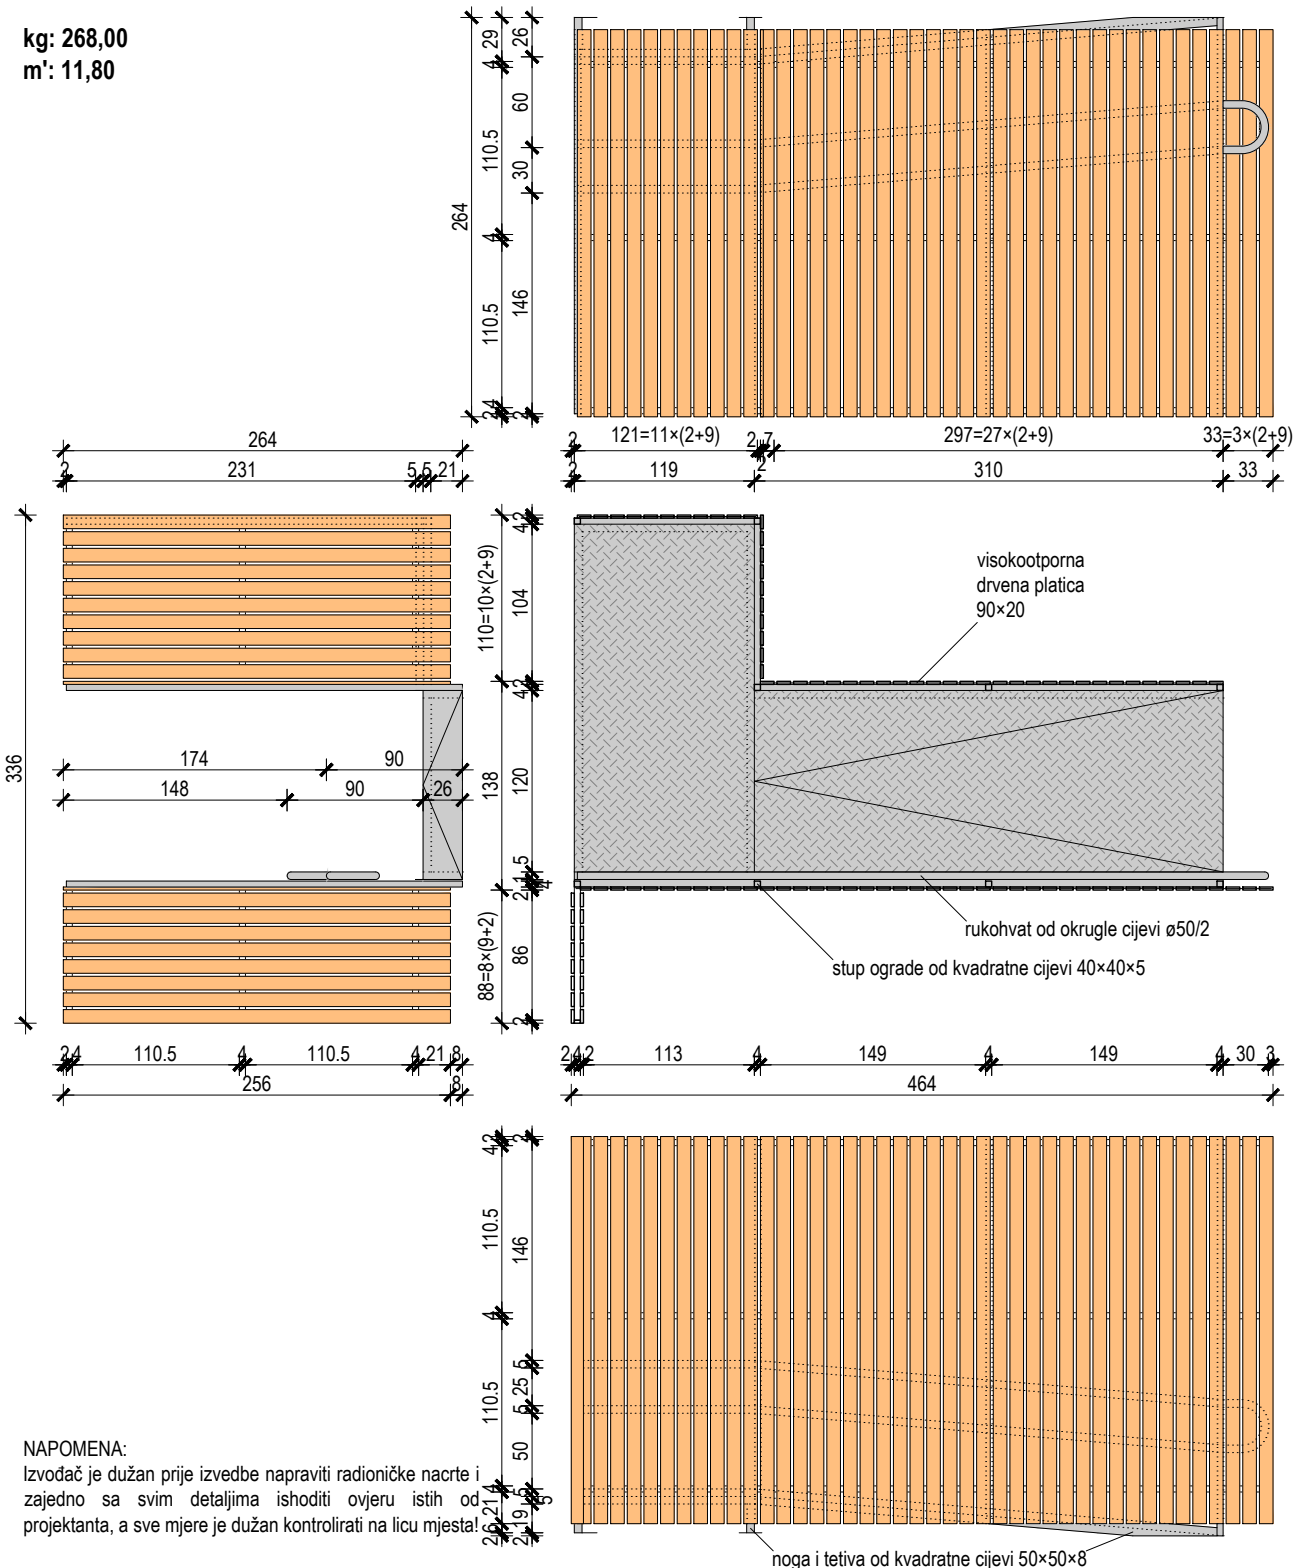


NAPOMENA:
Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!

arhitektonskibiroo antekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT		ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	
investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA		1:50		4.6

Vanjsko kućište ekrana rasporeda plovidbe

Vanjsko kućište u boji po izboru projektanta s potkonstrukcijom i ekranom odgovarajućih tehničkih karakteristika, sve otporno na atmosferilije, UV zračenje i posolicu. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrt, sav potreban pričvrzni, spojni i zaptivni materijal, kao i potreban propisani okov. Sve izvesti u skladu sa shemom te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po komadu postavljenog kućišta s ekranom. Mjere 420×164×15 cm.

kom: 2

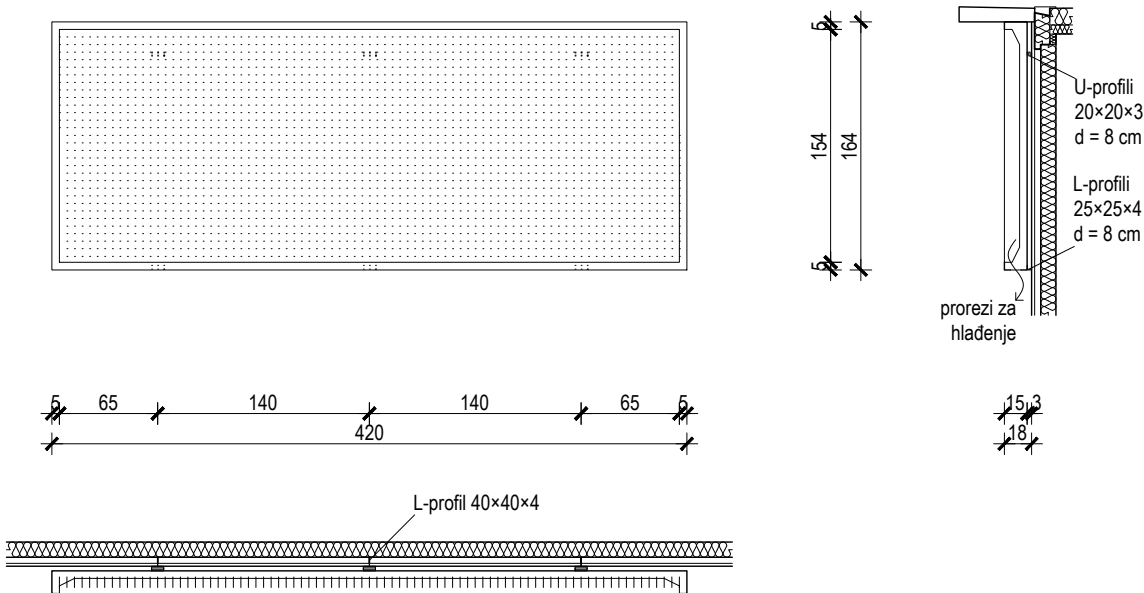

NAPOMENA:
Izdavač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!


arhitektonskibirooantekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ab@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT		ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	SHEMA BRAVARIJJE
investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA			1:50	5.1

B.4 SHEME ALUMINIJSKIH STAVKI

Vanjska jednokrilna puna zaokretna ulazna vrata predgotovljenog modula

Vanjska jednokrilna puna zaokretna vrata od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom i ispune krila od termoizolacijskog panela. Brtvljenje radi zrakonepropusnosti i vodonepropusnosti prema projektu. Krilo je s vanjske strane obloženo velikoformatnim pločama od porculanske keramike visokootporne na atmosferilija, posolicu, kemijske utjecaje, ogrebotine, udarce i Sunčeve zrake da bi bilo uklopljeno u oblogu zidnog platna s minimalnom reškom. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrtu, sav spojni i pričvrсни materijal, kao i potreban propisani okov i brave. Sve izvesti u skladu sa shemom te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po komadu kompletno ugrađenih vrata dovedenih do pune funkcionalnosti. Građevinski otvor 90/215 cm.

kom L: 2
kom D: 3

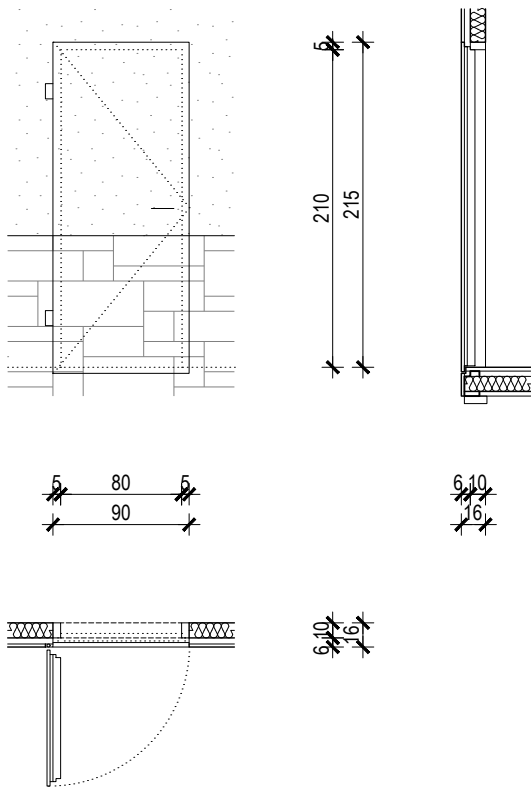


NAPOMENA:
Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!

arhitektonskibiroantekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT		ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	ALUMINIJSKA SHEMA
investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA		1:50		1.1

Vanjska jednokrilna puna zaokretna ulazna vrata predgotovljenog modula

Vanjska jednokrilna puna zaokretna vrata od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom i ispune krila od termoizolacijskog panela. Brtvljenje radi zrakonepropusnosti i vodonepropusnosti prema projektu. Krilo je s vanjske strane obloženo velikoformatnim pločama od porculanske keramike visokootporne na atmosferilija, posolicu, kemijske utjecaje, ogrebotine, udarce i Sunčeve zrake da bi bilo uklopljeno u oblogu zidnog platna s minimalnom reškom. Pri dnu i pri vrhu krila su ispuna i obloga perforirane prema shemi radi prozračivanja. S unutarnje strane obloge preko perforacija je kitom za lijepljenje i brtvljenje zalijepljena nehrđajuća mreža za sprječavanje ulaza životinja. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacрта, sav spojni i pričvrсни materijal, kao i potreban propisani okov i brave. Sve izvesti u skladu sa shemom te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po komadu kompletno ugrađenih vrata dovedenih do pune funkcionalnosti.
Građevinski otvor 90/215 cm.

kom L: 2
kom D: 2

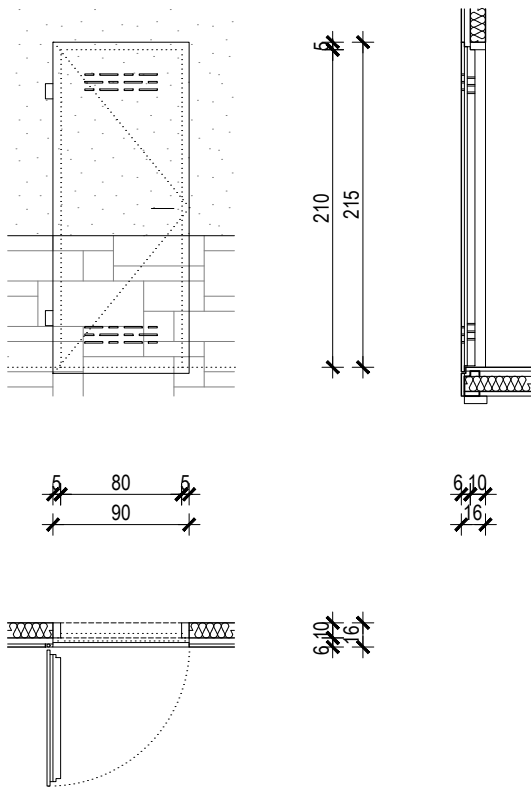

NAPOMENA:
Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!

arhitektonskibirooantekuzMANIĆ d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT		ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	ALUMINIJSKA SHEMA
investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA			1:50	1.2


Vanjska jednokrilna puna zaokretna ulazna vrata predgotovljenog modula

Vanjska jednokrilna puna zaokretna vrata od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom i ispune krila od termoizolacijskog panela. Brtvljenje radi zrakonepropusnosti i vodonepropusnosti prema projektu. Krilo je s vanjske strane obloženo velikoformatnim pločama od porculanske keramike visokootporne na atmosferilija, posolicu, kemijske utjecaje, ogrebotine, udarce i Sunčeve zrake da bi bilo uklopljeno u oblogu zidnog platna s minimalnom reškom. Pri dnu i pri vrhu krila su ispuna i obloga perforirane prema shemi radi prozračivanja. S unutarnje strane obloge preko perforacija je kitom za lijepljenje i brtvljenje zalijepljena nehrđajuća mreža za sprječavanje ulaza životinja. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacрта, sav spojni i pričvrсни materijal, kao i potreban propisani okov i brave. Sve izvesti u skladu sa shemom te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po komadu

kompletno ugrađenih vrata dovedenih do pune funkcionalnosti.

Građevinski otvor 100/215 cm, svijetli otvor 90/210 cm.

kom D: 1

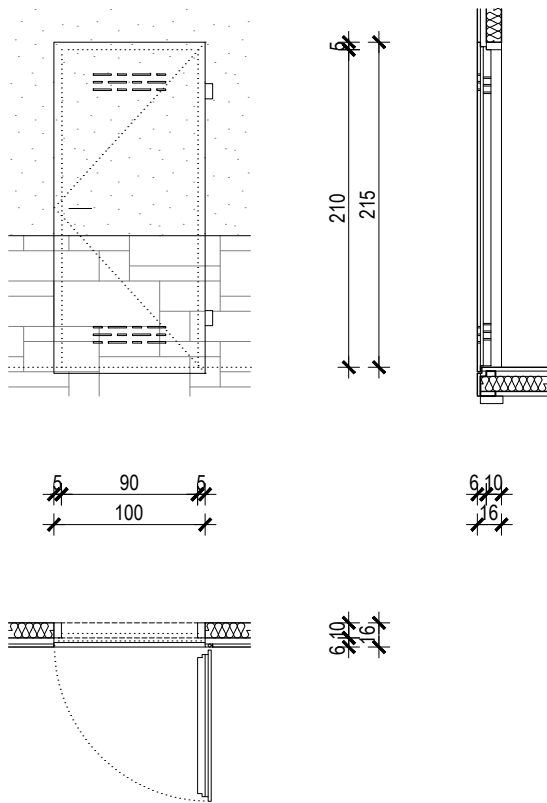


NAPOMENA:
Izdavač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!

arhitektonskibirooantekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	ALUMINIJSKA SHEMA	
investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA			1:50	1.3

Vanjska jednokrilna zaokretna ulazna vrata kućice za osoblje

Vanjska jednokrilna zaokretna vrata od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom i ispune krila od termoizolacijskog panela u donjem dijelu, a od izostakla u gornjem. Brtvljenje radi zrakonepropusnosti i vodonepropusnosti prema projektu. Krilo je s vanjske strane u donjem dijelu obloženo velikoformatnim pločama od porculanske keramike visokootporne na atmosferilija, posolicu, kemijske utjecaje, ogrebotine, udarce i Sunčeve zrake da bi bilo uklopljeno u oblogu zidnog platna s minimalnom reškom, dok je iz istog razloga u gornjem dijelu izostaklo ugrađeno preko skrivenih profila krila. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacрта, sav spojni i pričvrсни materijal, kao i potreban propisani okov i brave. Sve izvesti u skladu sa shemom te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po komadu kompletno ugrađenih vrata dovedenih do pune funkcionalnosti. Građevinski otvor 90/215 cm.

kom D: 2

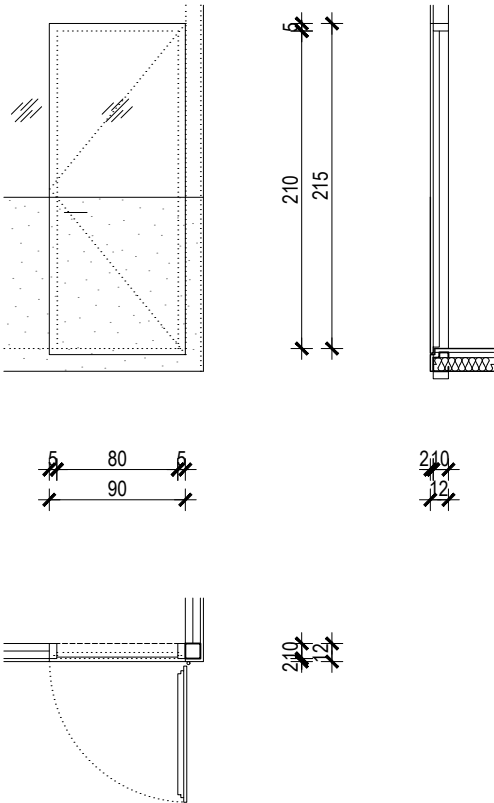


NAPOMENA:
Izdavač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!

arhitektonskibirooantekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT		ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	ALUMINIJSKA SHEMA
investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA		1:50		1.4

Vanjska jednokrilna puna zaokretna ulazna vrata pulta caffe-bara

Vanjska jednokrilna puna zaokretna vrata od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom i ispune krila od termoizolacijskog panela. Brtvljenje radi zrakonepropusnosti i vodonepropusnosti prema projektu. Krilo je s vanjske strane obloženo velikoformatnim pločama od porculanske keramike visokootporne na atmosferilija, posolicu, kemijske utjecaje, ogrebotine, udarce i Sunčeve zrake da bi bilo uklopljeno u oblogu zidnog platna s minimalnom reškom. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrtu, sav spojni i pričvrсни materijal, kao i potreban propisani okov i brave. Sve izvesti u skladu sa shemom te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po komadu kompletno ugrađenih vrata dovedenih do pune funkcionalnosti. Građevinski otvor 92/86 cm.

kom D: 1

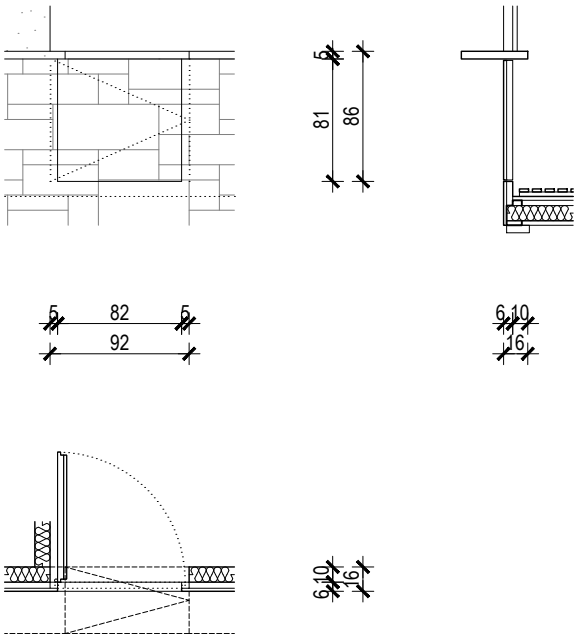


NAPOMENA:
Izdavač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!

arhitektonski biro antekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	ALUMINIJSKA SHEMA	
investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA		1:50	1.5	

Vanjska dvokrilna puna klizna ulazna vrata pulta spremišta za čuvanje prtljage

Vanjska dvokrilna puna klizna vrata od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom i ispune krila od termoizolacijskog panela. Brtvljenje radi zrakonepropusnosti i vodonepropusnosti prema projektu. Krila su s vanjske strane obložena velikoformatnim pločama od porculanske keramike visokootporne na atmosferilija, posolicu, kemijske utjecaje, ogrebotine, udarce i Sunčeve zrake da bi bila uklopljena u oblogu zidnog platna s minimalnom reškom. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacрта, sav spojni i pričvrsni materijal, kao i potreban propisani okov i brave. Sve izvesti u skladu sa shemom te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po komadu kompletno ugrađenih vrata dovedenih do pune funkcionalnosti. Građevinski otvor 298/56 cm.


kom: 1

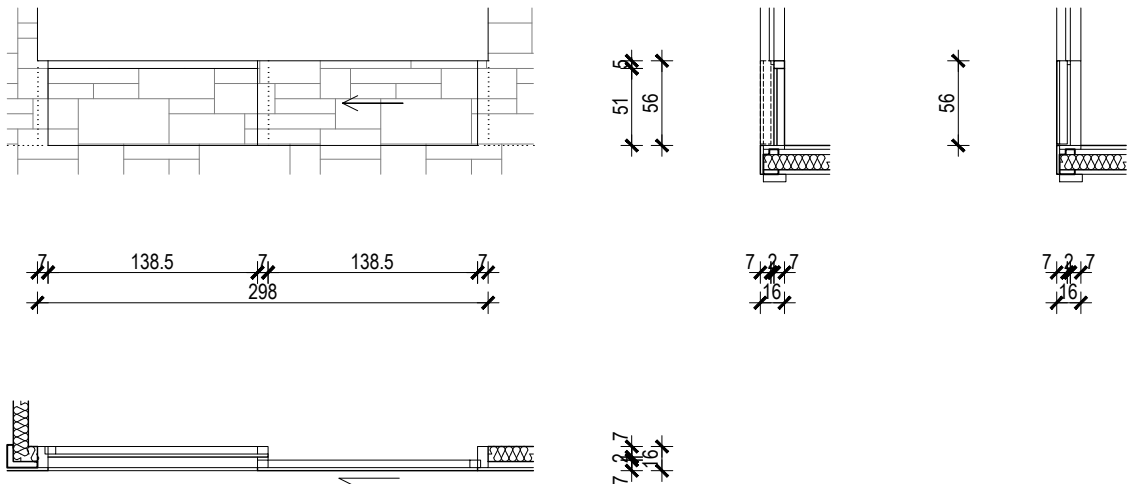

NAPOMENA:
Izdavač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!

arhitektonskibirooantekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT		ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	ALUMINIJSKA SHEMA
investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA			1:50	1.6

kom D: 1

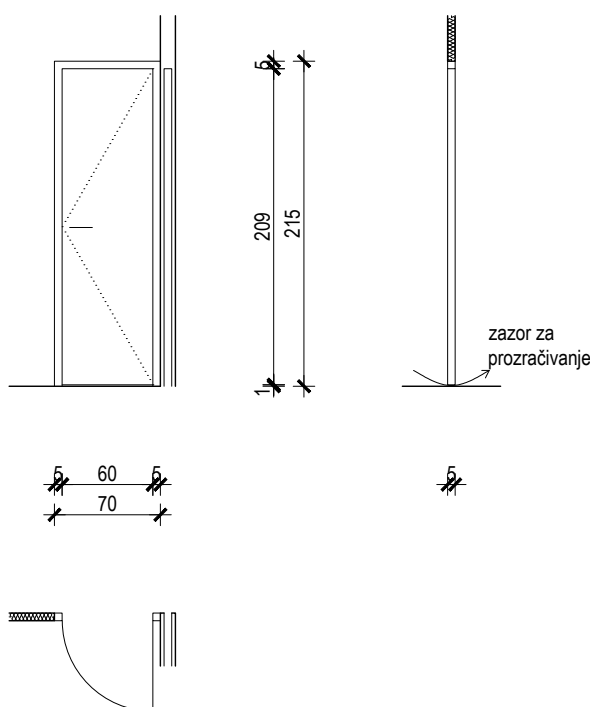


Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!

arhitektonskibiro antekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT		ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	ALUMINIJSKA SHEMA
	investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split		građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA		1:50 1.7

Unutarnja jednokrilna puna klizna vrata garderobe caffe-bara

Unutarnja jednokrilna puna klizna vrata u suhomontažnom pregradnom zidu. Vratno krilo sa zvučnom ispunom, maksimalne debljine 4 cm, industrijski bojano uključujući i sve profile za zvučno i vizualno brtvljenje. Obuhvaćeni svi troškovi izrade utora u pregradnom zidu i suhe montaže vrata u utor. Između krila i poda je zazor radi prozračivanja, a ispred krila minimalni prag radi sprječavanja slijevanja prolivenih tekućina u garderobu. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacрта, sav spojni i pričvrсни materijal, kao i potreban propisani okov i brave. Sve izvesti u skladu sa shemom, tehničkim detaljima, uputstvima te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po komadu kompletno ugrađenih vrata dovedenih do pune funkcionalnosti. Građevinski otvor 96/215 cm.

kom: 1

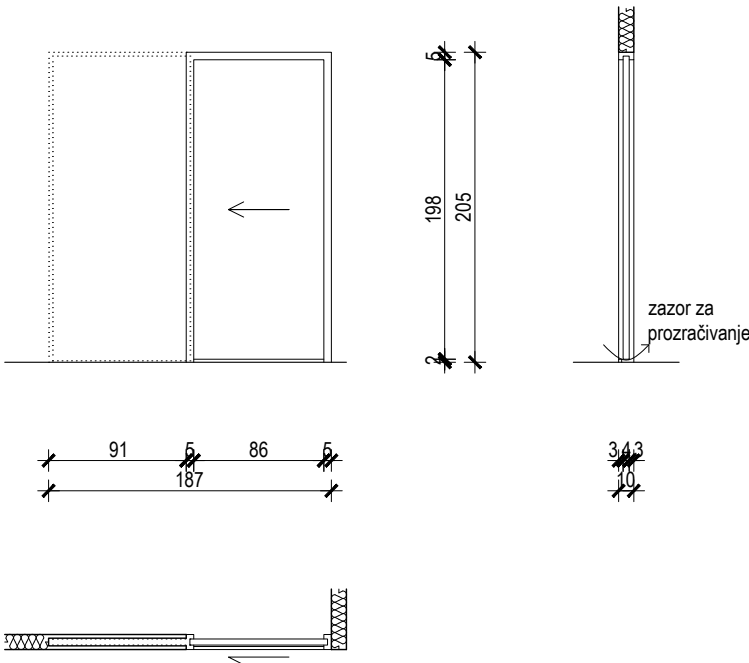


NAPOMENA:
Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!

arhitektonskibirooantekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.	Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	ALUMINIJSKA SHEMA
investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA			1:50 1.8

Vanjski prozor prodaje karata

Vanjski prozor od natur-eloksiranih aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom ostakljen izostaklom. Sastoji se od četiri jednaka dijela, svakog ispred jednog prodajnog mjesta, a svaki dio sastoji se od po pet fiksnih polja i po jednog kliznog krila. Brtvljenje radi zrakonepropusnosti i vodonepropusnosti prema projektu. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacрта, sav spojni i pričvrсни materijal, kao i potreban propisani okov i brave. Sve izvesti u skladu sa shemom te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po komadu kompletno ugrađenog prozora dovedenog do pune funkcionalnosti. Građevinski otvor 565/146 cm.

kom L: 1
kom D: 1

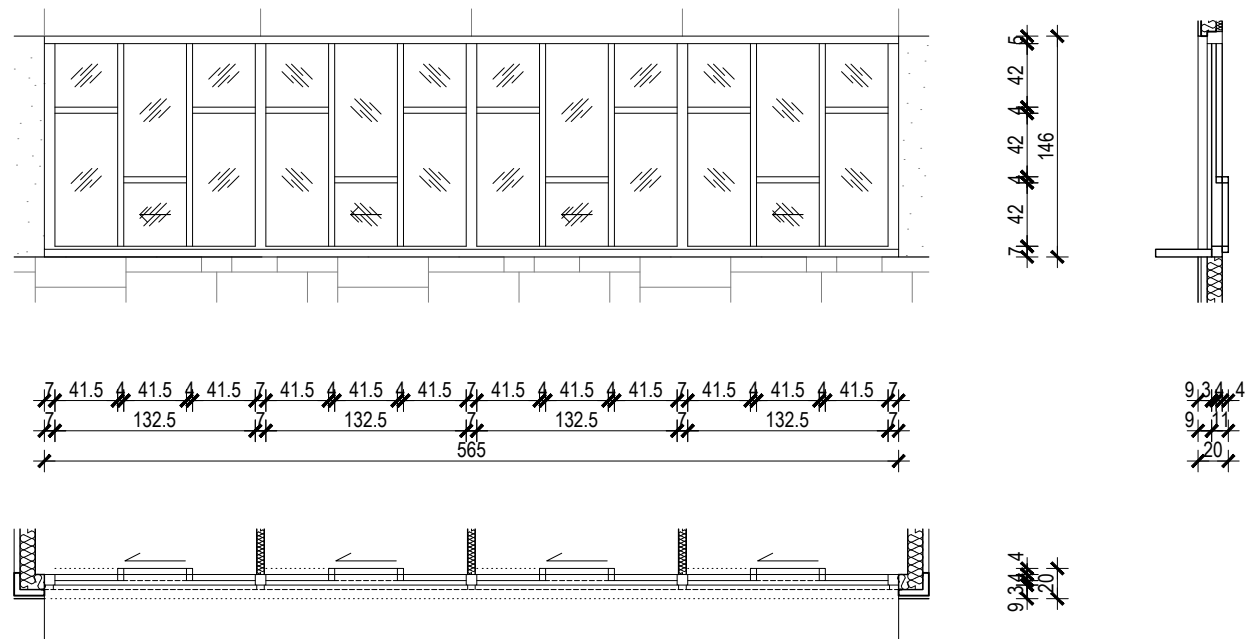

NAPOMENA:
Izdavač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!


arhitektonskibiroo antekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	ALUMINIJSKA SHEMA	
investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA		1:50	2.1	

Vanjski prozor kućice za osoblje

Vanjski prozor od natur-eloksiranih aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom ostakljen izostaklom. Sastoji se od kliznog krila i fiksnog polja iznad njega. Brtvljenje radi zrakonepropusnosti i vodonepropusnosti prema projektu. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrtu, sav spojni i pričvrсни materijal, kao i potreban propisani okov i brave. Sve izvesti u skladu sa shemom te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po komadu kompletno ugrađenog prozora dovedenog do pune funkcionalnosti.

Građevinski otvor 68/135 cm.

kom L: 2
kom D: 2

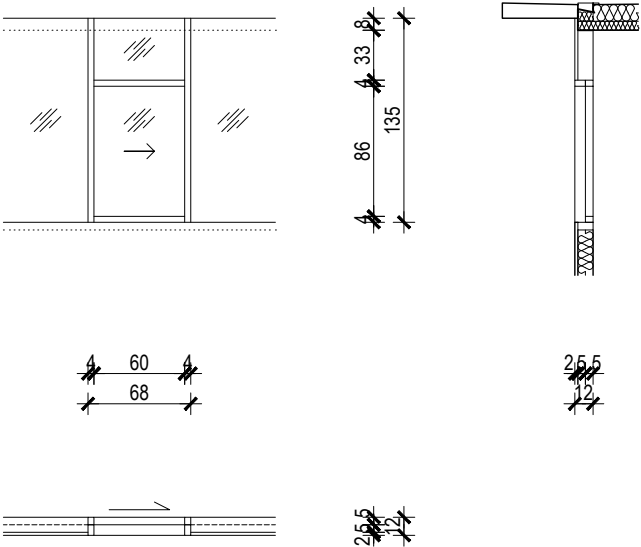


NAPOMENA:
Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!

arhitektonskibirooantekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT		ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	ALUMINIJSKA SHEMA
investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA		1:50		2.2

Vanjski podizno-zaokretni kapci caffe-bara

Vanjski podizno-zaokretni kapci od aluminijske bravarije obložene nehrđajućim limom sa spojevima nevidljivim izvana. Sastoje se od tri jednaka polja, a svako polje zatvaraju po četiri podizno-zaokretna krila spojena u "harmoniku" s mogućnošću fiksiranja u više položaja od potpuno podignutog do potpuno spuštenog i protuprovalno zaključanog. Kapci su izvedeni otporno na atmosferilija, posolicu, ogrebotine, udarce i Sunčeve zrake. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrtu, sav spojni i pričvrсни materijal, kao i potreban propisani okov i brave. Sve izvesti u skladu sa shemom te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po komadu kompletno ugrađenih kapaka dovedenih do pune funkcionalnosti. Građevinski otvor 416/146 cm.

kom: 1

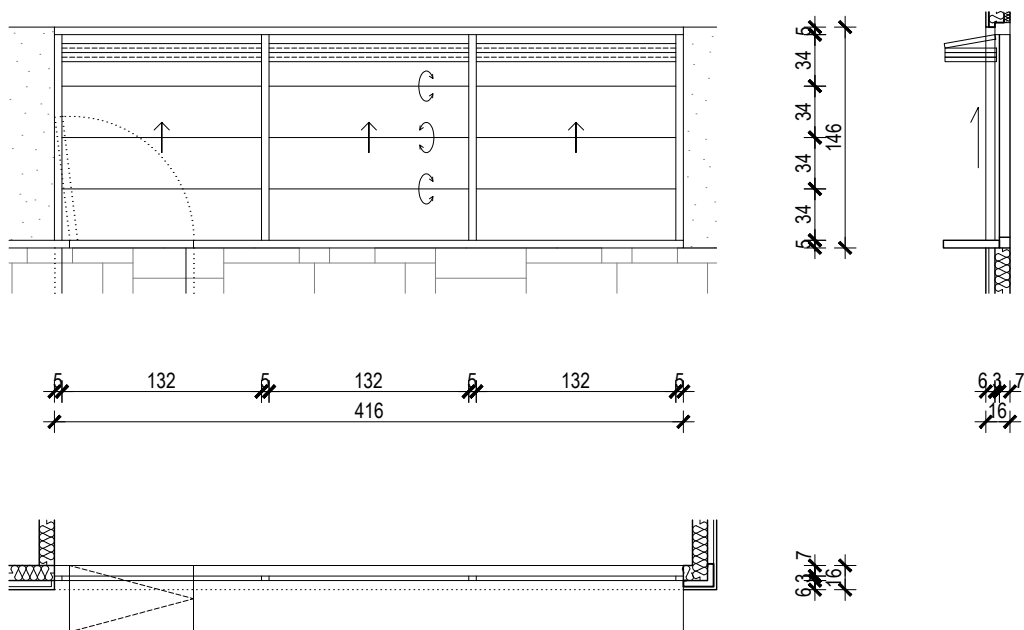


NAPOMENA:
Izdavač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!

arhitektonskibiroantekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	ALUMINIJSKA SHEMA	
investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA		1:50	3.1	

Vanjski podizno-zaokretni kapci prodaje karata

Vanjski podizno-zaokretni kapci od aluminijske bravarije obložene nehrđajućim limom sa spojevima nevidljivim izvana. Sastoje se od četiri jednaka polja, svakog ispred jednog prodajnog mjesta, a svako polje zatvaraju po četiri podizno-zaokretna krila spojena u "harmoniku" s mogućnošću fiksiranja u više položaja od potpuno podignutog do potpuno spuštenog i protuprovalno zaključanog. Kapci su izvedeni otporno na atmosferilija, posolicu, ogrebotine, udarce i Sunčeve zrake. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacрта, sav spojni i pričvrсни materijal, kao i potreban propisani okov i brave. Sve izvesti u skladu sa shemom te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po komadu kompletno ugrađenih kapaka dovedenih do pune funkcionalnosti. Građevinski otvor 565/146 cm.

kom: 2

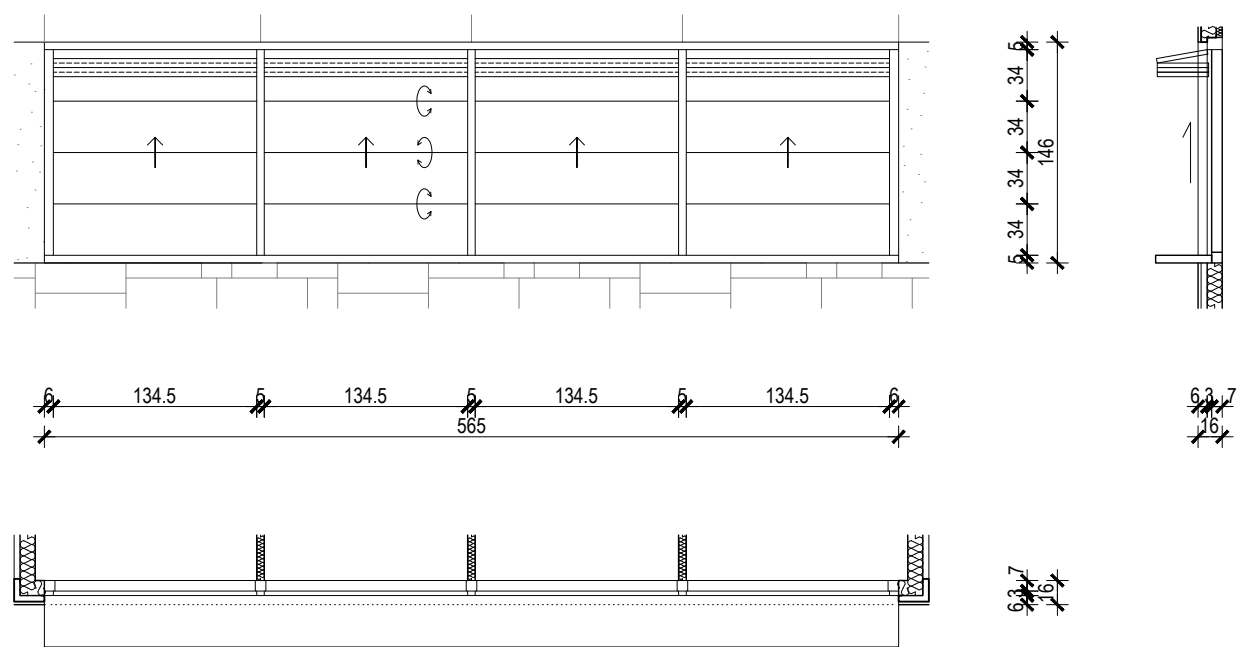


NAPOMENA:
Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!

arhitektonskibirooantekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	ALUMINIJSKA SHEMA	
investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA		1:50	3.2	

Vanjski podizno-zaokretni kapci spremišta za čuvanje prtljage

Vanjski podizno-zaokretni kapci od aluminijske bravarije obložene nehrđajućim limom sa spojevima nevidljivim izvana. Sastoje se od tri jednaka polja, a svako polje zatvaraju po četiri podizno-zaokretna krila spojena u "harmoniku" s mogućnošću fiksiranja u više položaja od potpuno podignutog do potpuno spuštenog i protuprovalno zaključanog. Kapci su izvedeni otporno na atmosferilija, posolicu, ogrebotine, udarce i Sunčeve zrake. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrtu, sav spojni i pričvrсни materijal, kao i potreban propisani okov i brave. Sve izvesti u skladu sa shemom te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po komadu kompletno ugrađenih kapaka dovedenih do pune funkcionalnosti. Građevinski otvor 298/181 cm.

kom: 1

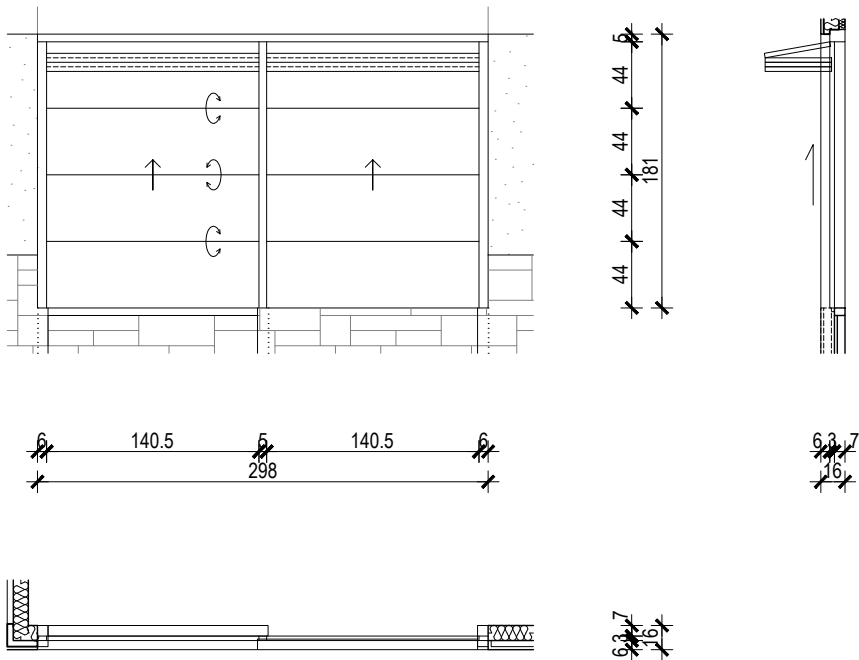

NAPOMENA:
Izdavač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!


arhitektonskibirooantekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	ALUMINIJSKA SHEMA	
investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA			1:50	3.3

B.5 SHEME STOLARSKIH STAVKI

Unutarnja zahodska pregrada s dvama jednokrlnim punim zaokretnim vratima

Unutarnja zahodska pregrada s vratima je izvedena od HPL-ploča u boji i obradi po izboru projektanta. Pričvršćena je na zid i u pod. Noge i sav ostali okov su od nehrđajućeg čelika u boji i obradi po izboru projektanta. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacрта, sav spojni i pričvrсни materijal, kao i potreban propisani okov i brave. Sve izvesti u skladu sa shemom te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po komadu kompletno ugrađenih pregrada dovedenih do pune funkcionalnosti. Mjere 185×122×220 cm. Svijetla širina vrata 65 cm.

kom: 2

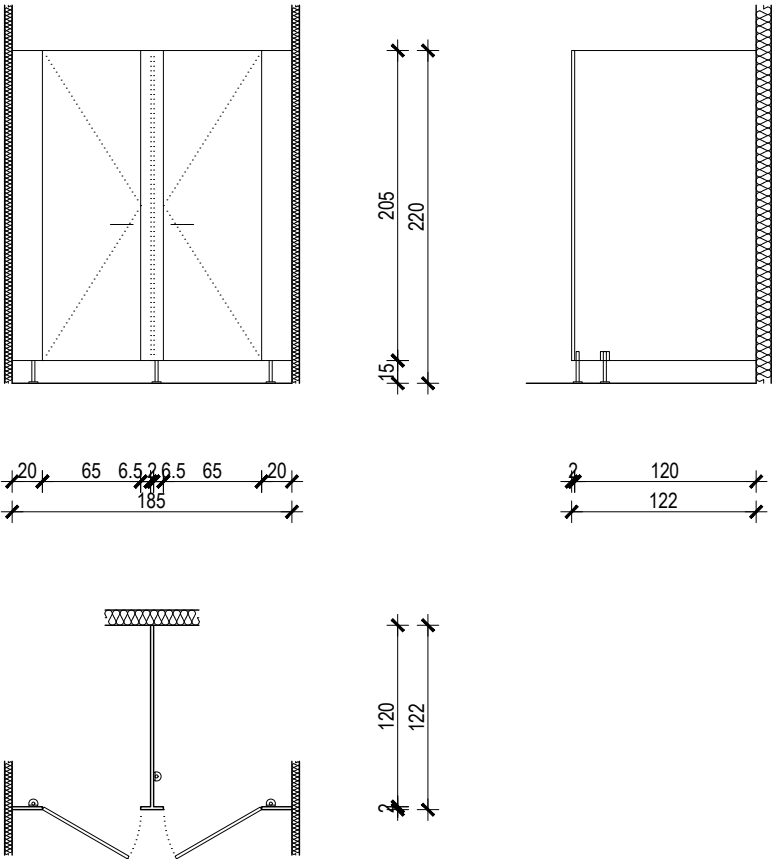


NAPOMENA:
Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!

arhitektonskibirooantekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT		ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	SHEMA STOLARIJE
investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA			1:50	1.1

Unutarnja podnica caffe-bara

Unutarnja podnica iz dva pravokutna dijela od letvi smreke 60/25 mm na kontraletvama 50/30 mm. Letve su od drva prve klase, blanjane i završno obrađene po izboru projektanta. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacрта, sav potreban rad, materijal, pričvrсни i pomoćni materijal. Sve izvesti u skladu sa shemom te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po m² izvedene podnice.
Mjere 417×210×5 cm.

kom: 1

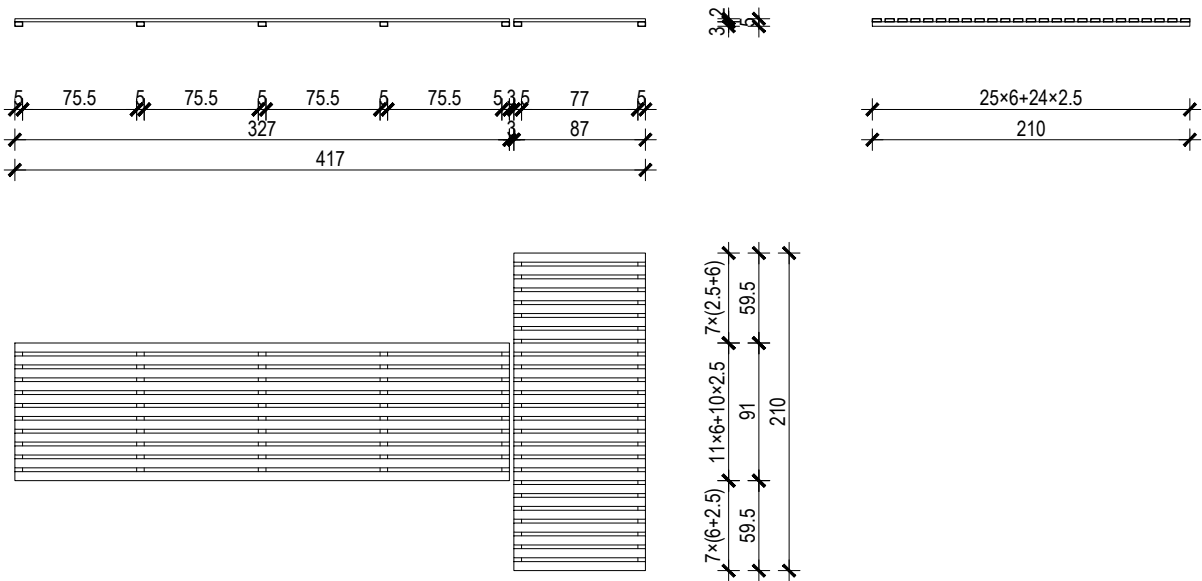

NAPOMENA:
Izdavač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!


arhitektonski biro ante kuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	SHEMA STOLARIJE	
investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA			1:50	2.1

Unutarnji stol prodaje karata

Unutarnji stol od medijapana debljine 4 cm u boji i obradi po izboru projektanta pričvršćenog odozdo s tri strane na stijene od termoizolacijskih panela preko pocinčanih L-profila. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrtu, sav potreban rad, materijal, pričvrсни i pomoćni materijal. Sve izvesti u skladu sa shemom te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po komadu ugrađenih stolova.

Mjere 134,5×60×4 cm. Visina gornje plohe 85 cm iznad poda.

kom: 4

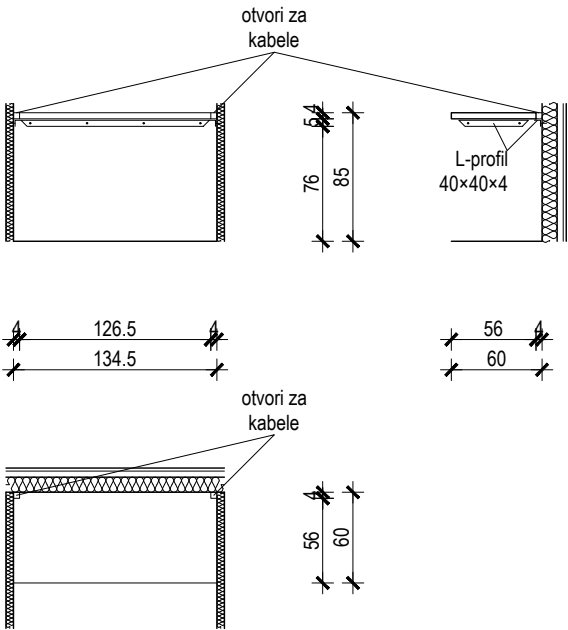

NAPOMENA:
Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!


arhitektonsko inženjersko biro ante kuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.ante-kuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.	Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	SHEMA STOLARIJE
investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA	1:50	3.1	

Unutarnji stol prodaje karata

Unutarnji stol od medijapana debljine 4 cm u boji i obradi po izboru projektanta pričvršćenog odozdo s tri strane na stijene od termoizolacijskih panela preko pocinčanih L-profila. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrt, sav potreban rad, materijal, pričvrsni i pomoćni materijal. Sve izvesti u skladu sa shemom te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po komadu ugrađenih stolova.

Mjere 146,5×60×4 cm. Visina gornje plohe 85 cm iznad poda.

kom: 4

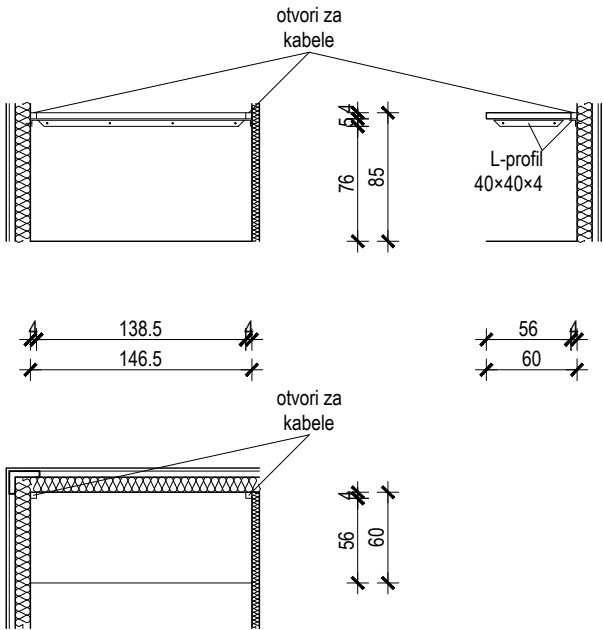

NAPOMENA:
Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!


arhitektonskibiroantekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT		ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	SHEMA STOLARIJE
investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA			1:50	3.2

Unutarnji stol kućice za osoblje

Unutarnji stol od medijapana debljine 4 cm u boji i obradi po izboru projektanta pričvršćenog odozdo s tri strane na stijene od termoizolacijskih panela preko pocinčanih L-profila. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrt, sav potreban rad, materijal, pričvrсни i pomoćni materijal. Sve izvesti u skladu sa shemom te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po komadu ugrađenih stolova.

Mjere 180×60×4 cm. Visina gornje plohe 90 cm iznad poda.

kom: 2

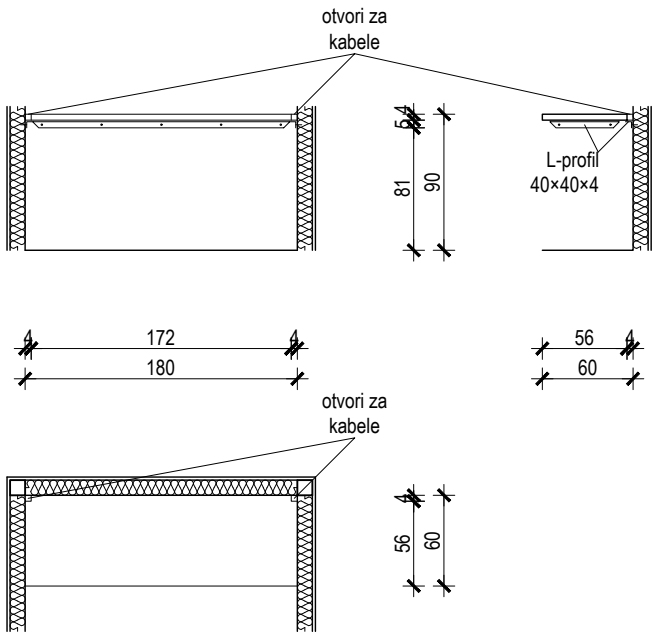

NAPOMENA:
Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!

arhitektonski biro ante kuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.	Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	SHEMA STOLARIJE
investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA			1:50 3.3

B.6 SCHEME STAVKI OBJEKATA


Predgotovljeni modul caffe-bara

Predgotovljeni modul opremljen svim instalacijama i opremom prema projektima i shemama, među kojima su i:

- shema aluminijske stavke 1.1 (vanjska jednokrlna puna zaokretna ulazna vrata) - kom D: 1
- shema aluminijske stavke 1.5 (vanjska jednokrlna puna zaokretna ulazna vrata pulta) - kom D: 1
- shema aluminijske stavke 1.7 (unutarnja jednokrlna puna zaokretna vrata zahoda) - kom D: 1
- shema aluminijske stavke 1.8 (unutarnja jednokrlna puna klizna vrata garderobe) - kom: 1
- shema aluminijske stavke 3.1 (vanjski podizno-zaokretni kapci) - kom: 1
- zahodska školjka s vodokotličem - kom: 1
- umivaonik - kom: 1
- garderobni ormar - kom: 3

Cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacрта. Sve izvesti u skladu sa shemama i projektima te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po komadu dostavljenog, montiranog i priključenog modula. Mjere 605×244×284 cm.

kom: 1

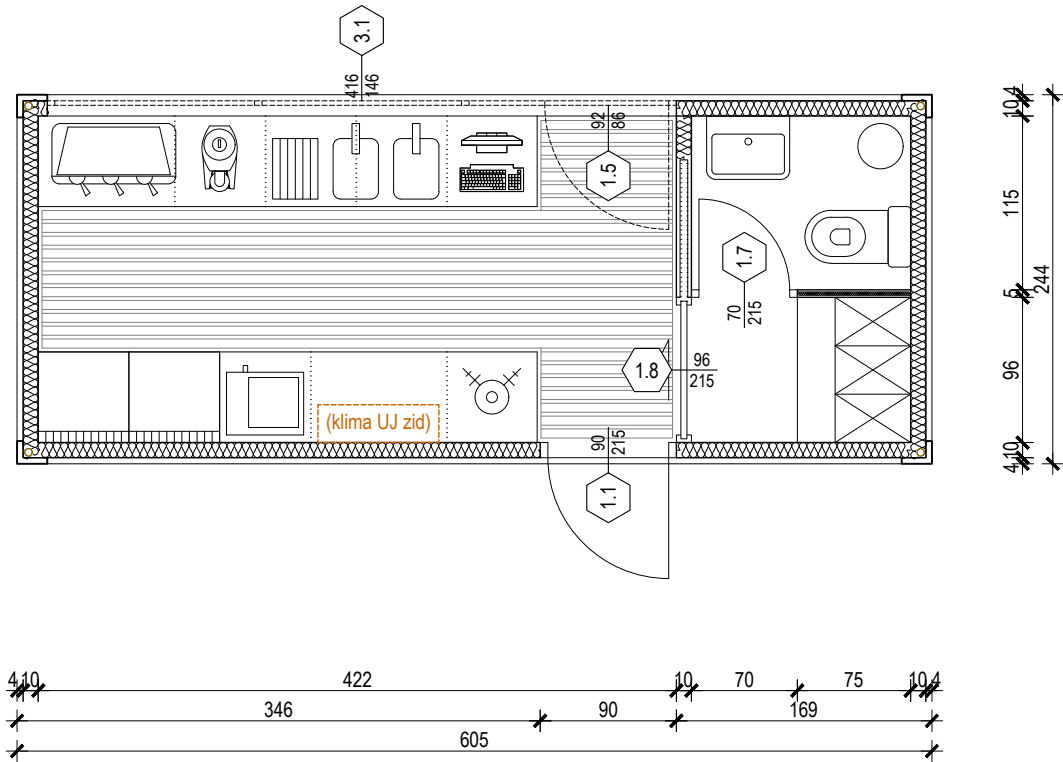

NAPOMENA:

Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!

arhitektonskibiroo ante kuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	SHEMA OBJEKTA	
investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA		1:50	1.1	

Predgotovljeni modul spremišta za čuvanje prtljage


Predgotovljeni modul opremljen svim instalacijama i opremom prema projektima i shemama, među kojima su i:

- shema aluminijske stavke 1.6 (vanjska dvokrilna puna klizna ulazna vrata pulta) - kom: 1
- shema aluminijske stavke 3.3 (vanjski podizno-zaokretni kapci) - kom: 1

Cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacрта. Sve izvesti u skladu sa shemama i projektima te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po komadu dostavljenog, montiranog i priključenog modula.

Mjere 605×244×284 cm.

kom: 1

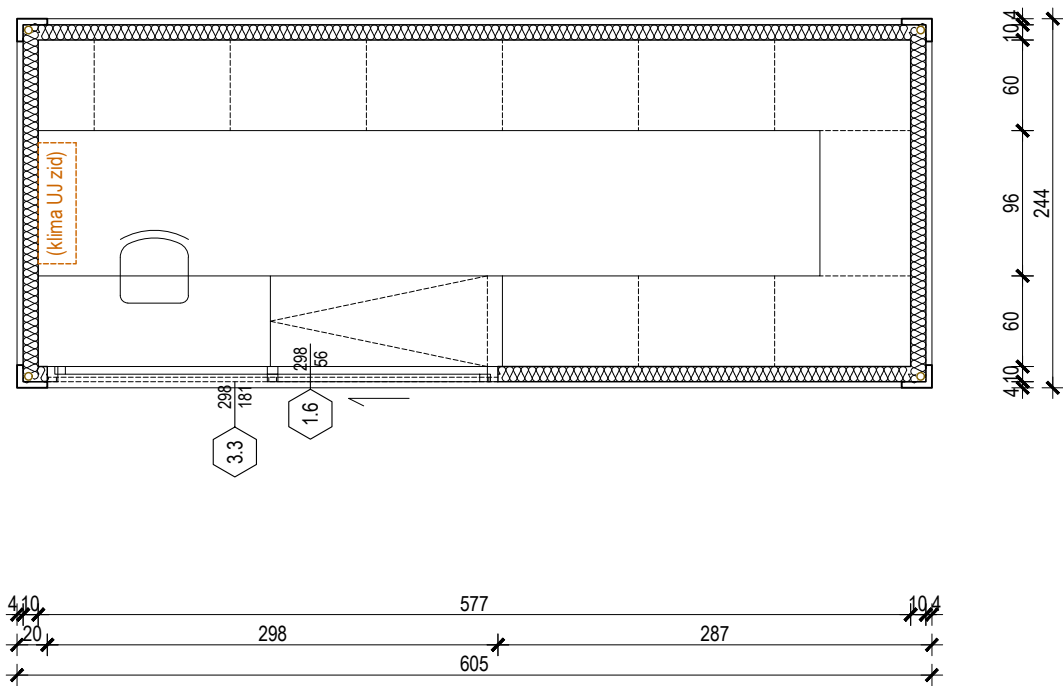

NAPOMENA:
Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!

arhitektonski biro ante kuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.ante-kuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.	Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	SHEMA OBJEKTA
investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA			1:50 1.2

Predgotovljeni modul prodaje karata (zapadni)


Predgotovljeni modul opremljen svim instalacijama i opremom prema projektima i shemama, među kojima su i:

- shema aluminijske stavke 1.1 (vanjska jednokrilna puna zaokretna ulazna vrata) - kom D: 2
- shema aluminijske stavke 2.1 (vanjski prozor) - kom D: 1
- shema aluminijske stavke 3.2 (vanjski podizno-zaokretni kapci) - kom: 1
- shema stolarske stavke 3.1 (unutarnji stol prodaje karata) - kom: 2
- shema stolarske stavke 3.2 (unutarnji stol prodaje karata) - kom: 2
- ormar - kom: 12

Cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacрта. Sve izvesti u skladu sa shemama i projektima te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po komadu dostavljenog, montiranog i priključenog modula.

Mjere 605×244×284 cm.

kom: 1

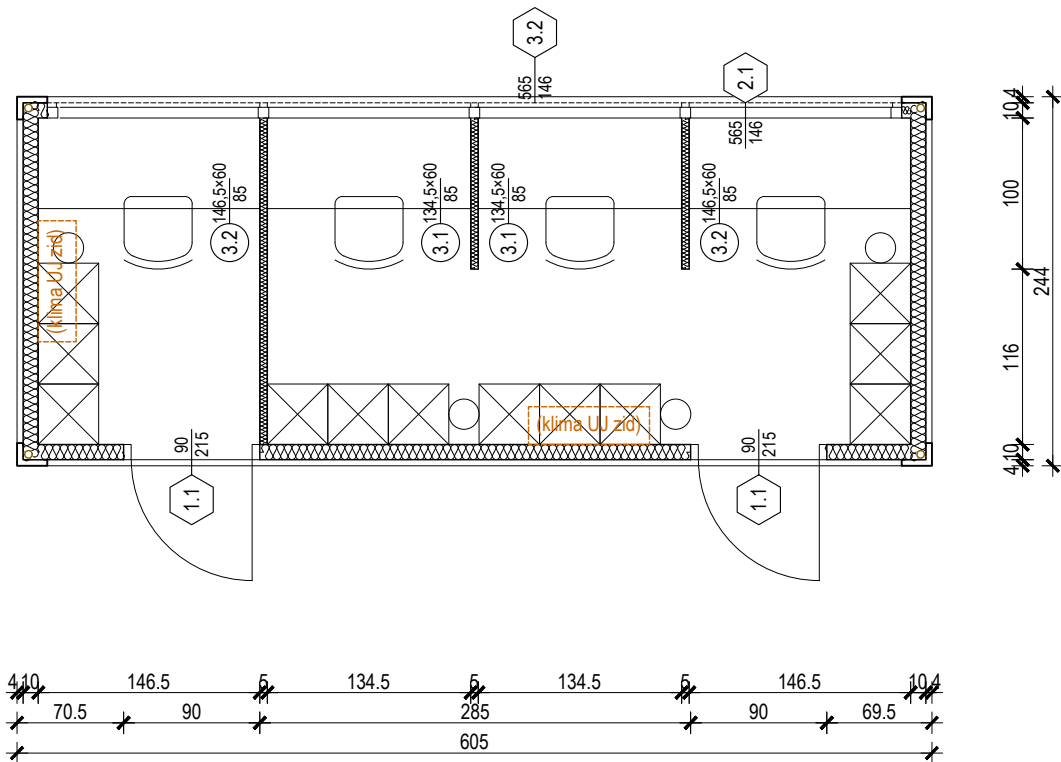

NAPOMENA:
Izdavač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!

arhitektonski biro ante kuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT		ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	SHEMA OBJEKTA
investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA			1:50	1.3

Predgotovljeni modul prodaje karata (istočni)


Predgotovljeni modul opremljen svim instalacijama i opremom prema projektima i shemama, među kojima su i:

- shema aluminijske stavke 1.1 (vanjska jednokrilna puna zaokretna ulazna vrata) - kom L: 2
- shema aluminijske stavke 2.1 (vanjski prozor) - kom L: 1
- shema aluminijske stavke 3.2 (vanjski podizno-zaokretni kapci) - kom: 1
- shema stolarske stavke 3.1 (unutarnji stol prodaje karata) - kom: 2
- shema stolarske stavke 3.2 (unutarnji stol prodaje karata) - kom: 2
- ormar - kom: 12

Cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacрта. Sve izvesti u skladu sa shemama i projektima te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po komadu dostavljenog, montiranog i priključenog modula.

Mjere 605×244×284 cm.

kom: 1

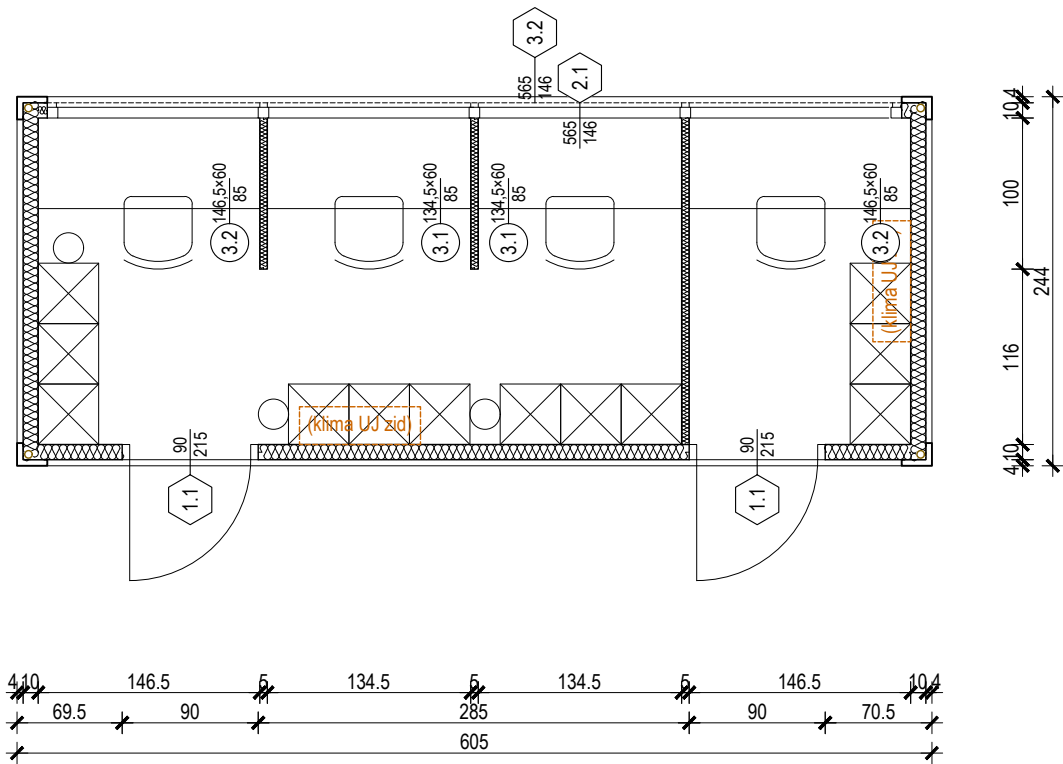

NAPOMENA:
Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!

arhitektonski biro ante kuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.ante kuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT		ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	SHEMA OBJEKTA
investitori:	Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split		građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA		1:50 1.4


Predgotovljeni modul zahoda

Predgotovljeni modul opremljen svim instalacijama i opremom prema projektima i shemama, među kojima su i:

- shema aluminijske stavke 1.2 (vanjska jednokrilna puna zaokretna ulazna vrata) - kom L: 1, kom D: 1
- shema aluminijske stavke 1.3 (vanjska jednokrilna puna zaokretna ulazna vrata) - kom D: 1
- shema stolarske stavke 1.1 (unutarnja zahodska pregrada) - kom: 2
- zahodska školjka s vodokotličem - kom: 4
- zahodska školjka s vodokotličem za osobe u kolicima - kom: 1
- umivaonik - kom: 3
- umivaonik za osobe u kolicima - kom: 1
- pisoar - kom: 1

Cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrt. Sve izvesti u skladu sa shemama i projektima te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po komadu dostavljenog, montiranog i priključenog modula.
Mjere 605×244×284 cm.

kom: 1

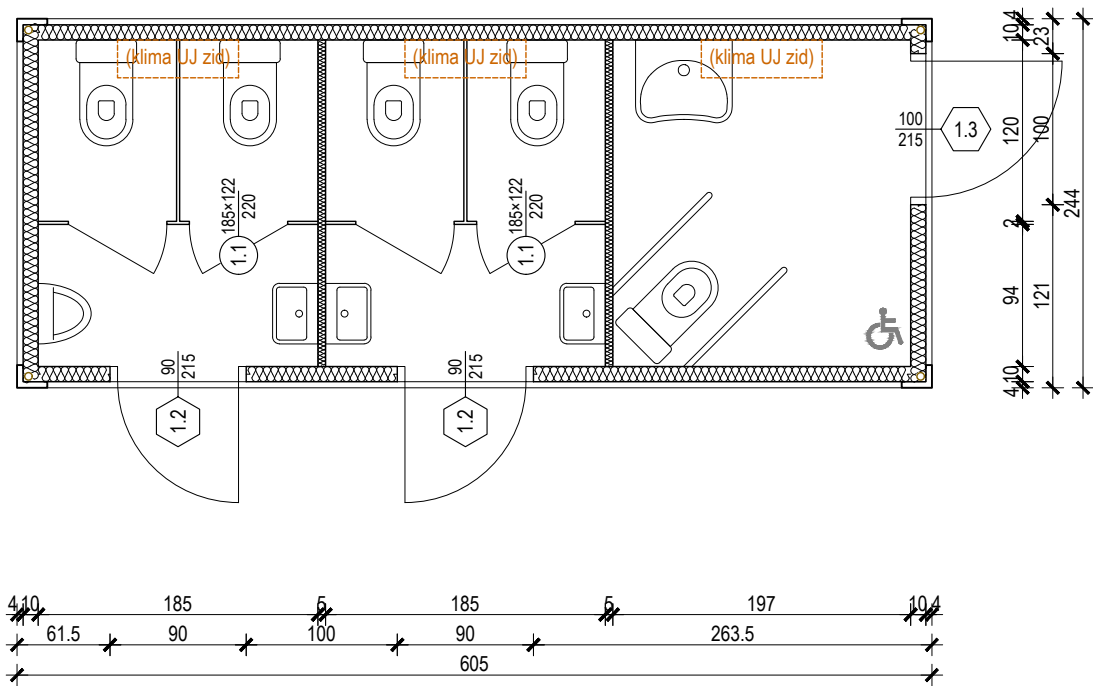

NAPOMENA:

Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!

arhitektonski biro ante kuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT		ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	SHEMA OBJEKTA
investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA			1:50	1.5

Predgotovljeni modul bankomata


Predgotovljeni modul opremljen svim instalacijama i opremom prema projektima i shemama, među kojima su i:

- shema aluminijske stavke 1.2 (vanjska jednokrlna puna zaokretna ulazna vrata) - kom L: 1

Modul na gradilište mora doći rastavljen, pošto se otvori u stropu i podu za stupove nadstrešnice moraju izvesti na licu mjesta. Cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrti i brtvljenje prodora stupova u krovu i podu s plaštem/manžetom i ostalim potrebnim elementima. Sve izvesti u skladu sa shemama i projektima te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po komadu dostavljenog, montiranog i priključenog modula.

Mjere 208×244×284 cm.

kom: 1

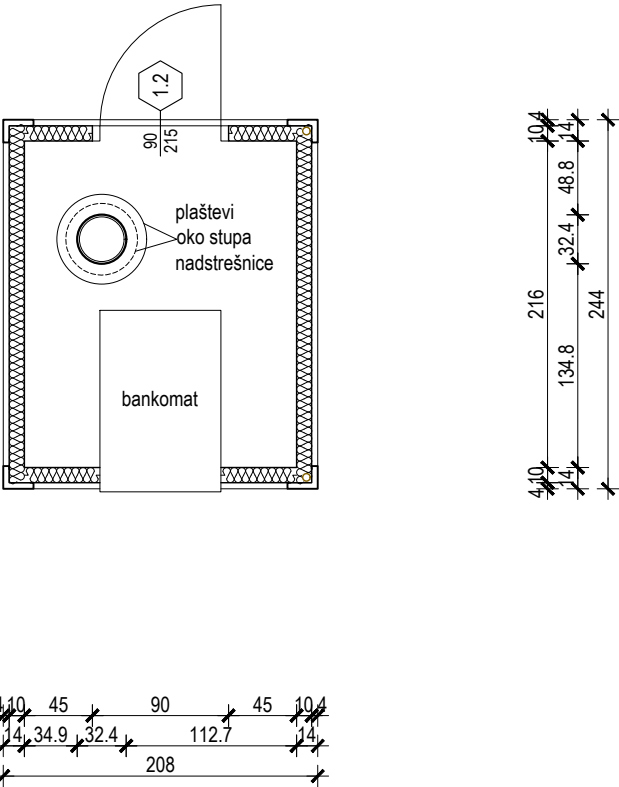

NAPOMENA:
Izdavač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!

arhitektonski biro antekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT		ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	SHEMA OBJEKTA
investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA			1:50	1.6

Predgotovljeni modul spremišta




Predgotovljeni modul opremljen svim instalacijama i opremom prema projektima i shemama, među kojima su i:

- shema aluminijske stavke 1.2 (vanjska jednokrlna puna zaokretna ulazna vrata) - kom D: 1

Modul na gradilište mora doći rastavljen, pošto se otvori u stropu i podu za stupove nadstrešnice moraju izvesti na licu mjesta. Cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacrtu i brtvljenje prodora stupova u krovu i podu s plaštem/manžetom i ostalim potrebnim elementima. Sve izvesti u skladu sa shemama i projektima te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po komadu dostavljenog, montiranog i priključenog modula.

Mjere 208×244×284 cm.

kom: 1

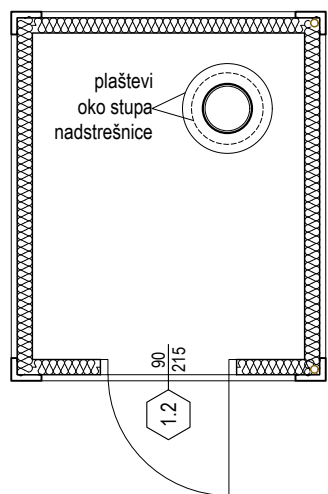

NAPOMENA:
Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!

arhitektonskibirooantekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT		ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	
investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA		1:50		1.7

Predgotovljeni modul kućice za osoblje


Predgotovljeni modul opremljen svim instalacijama i opremom prema projektima i shemama, među kojima su i:

- shema aluminijske stavke 1.4 (vanjska jednokrilna zaokretna ulazna vrata) - kom D: 1
- shema aluminijske stavke 2.2 (vanjski prozor) - kom L: 1, kom D: 1
- shema stolarske stavke 3.3 (unutarnji stol) - kom: 1

Cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacрта. Sve izvesti u skladu sa shemama i projektima te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po komadu dostavljenog, montiranog i priključenog modula.

Mjere 204×204×260 cm.

kom: 2

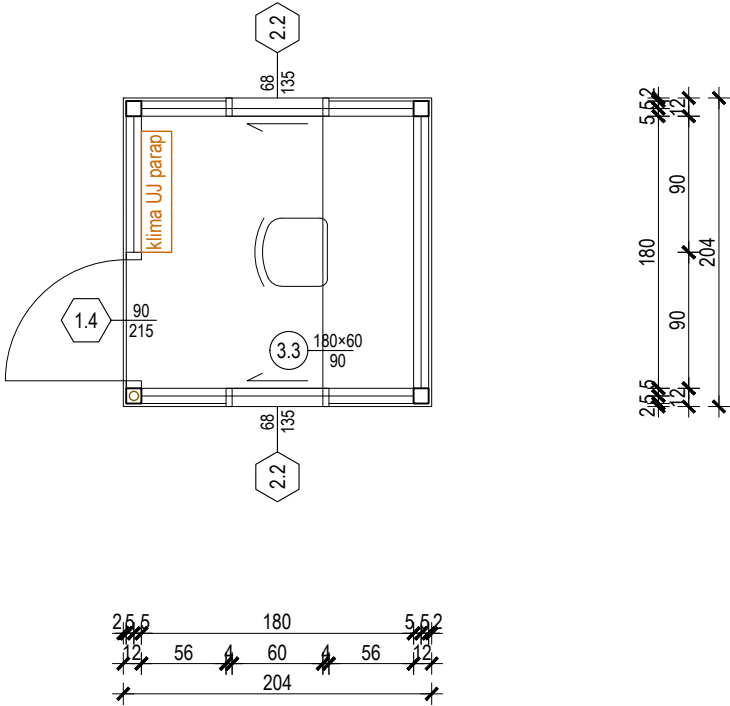

NAPOMENA:
Izvođač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!


arhitektonski biro ante kuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.ante kuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT		ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	SHEMA OBJEKTA
investitori:	Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split		građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA		1:50 1.8

Vanjska klupa

Vanjska klupa s bazom od vodonepropusnog bijelog betona na koju se montira sjedište i naslon od akacije na potkonstrukciji od nehrđajućeg čelika. Sav spojni materijal je nehrđajući. Bijeli beton poboljšane ugradivosti (konzistencija slijevanjem 210 ± 20 mm) s bijelim cementom i bijelim agregatom, razreda tlačne čvrstoće C 45/50 te razreda izloženosti XC4, XD1 i XS1, Dmax 16 mm, s dodatkom kvarca i mikrovlakana. Površina klupe mora biti očišćena od svih ostataka betona, oplate, veznih sredstava oplate, bez neravnina, brušeno. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacрта, sav potreban rad, materijal, pričvrсни i pomoćni materijal. Sve izvesti u skladu sa shemom te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po komadu izvedene i postavljene klupe.

Mjere 210×140×84 cm.

kom: 2

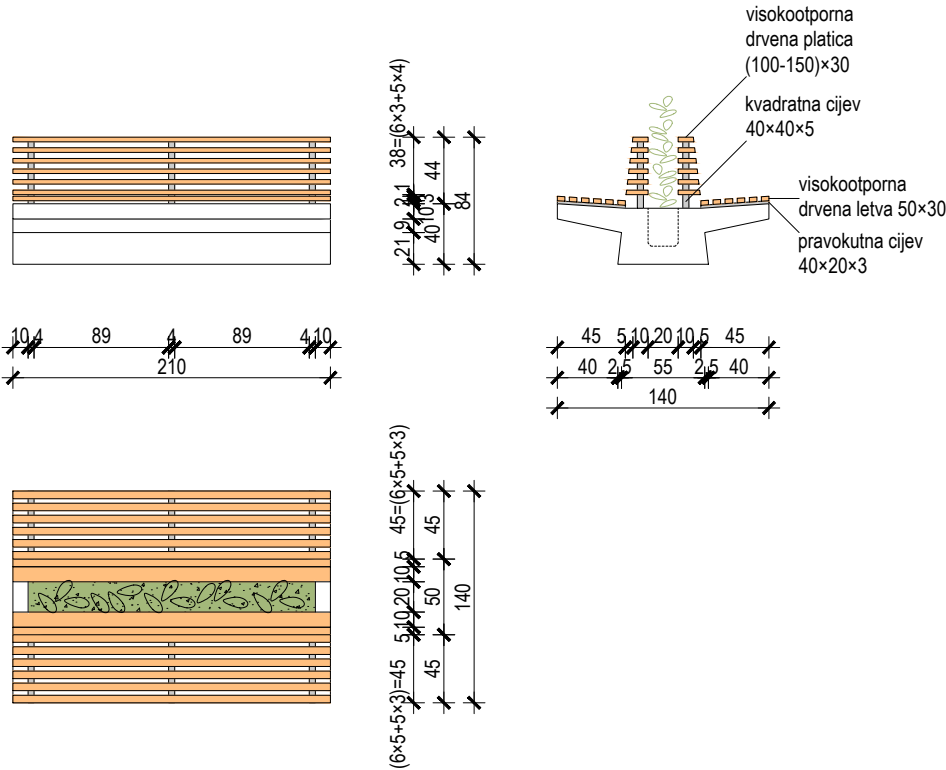


NAPOMENA:
Izdavač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!

arhitektonski biro antekuzmanić d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT		ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	SHEMA OBJEKTA
investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA			1:50	2.1

Vanjska jerula

Vanjska jerula od vodonepropusnog bijelog betona poboljšane ugradivosti (konzistencija slijeganjem 210 ± 20 mm) s bijelim cementom i bijelim agregatom, razreda tlačne čvrstoće C 45/50 te razreda izloženosti XC4, XD1 i XS1, Dmax 16 mm, s dodatkom kvarca i mikrovlakana. Površina jerule mora biti očišćena od svih ostataka betona, oplata, veznih sredstava oplata, bez neravnina, brušeno. Jediničnom cijenom obuhvatiti izradu radioničkog nacрта, sav potreban rad, materijal, pričvrсни i pomoćni materijal. Sve izvesti u skladu sa shemom te dogovorima i odobrenjima projektanta. Obračun po komadu izvedene i postavljene jerule. Mjere 600×150×50 cm.

kom: 1

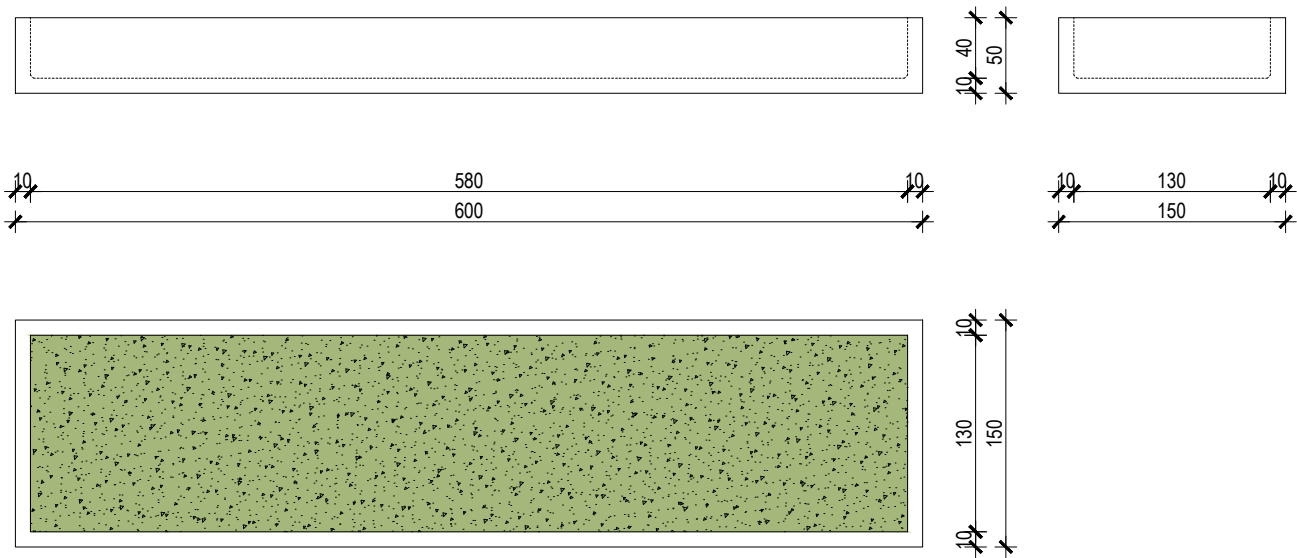

NAPOMENA:
Izdavač je dužan prije izvedbe napraviti radioničke nacрте i zajedno sa svim detaljima ishoditi ovjeru istih od projektanta, a sve mjere je dužan kontrolirati na licu mjesta!

arhitektonskibirooantekuzMANIĆ d.o.o. Split Trg M. Pavlinovića 1, Split T: 021 332 533 F: 021 332 532 ab.ak@inet.hr www.antekuzmanic-arhitekt.hr	projektant: Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.		Mapa 4 ARHITEKTONSKI PROJEKT		Split, travanj 2024.
	razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	ZOP: GSP	TD: 12/23-IZ	SHEMA OBJEKTA	
investitori: Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split	građevina: Rekonstrukcija i dogradnja GATA SV. PETRA			1:50	2.2
